
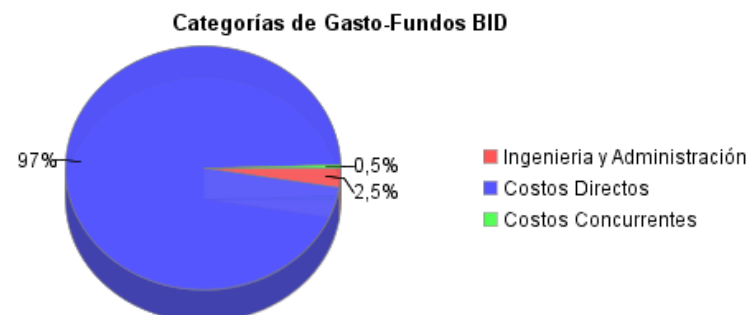
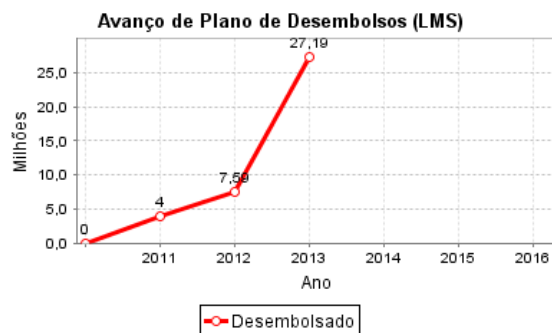



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
Setor:	WATER AND SANITATION				
Número da Operação:	2343/OC-AR	Atual:	200.000.000,00	Original BID:	200.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	27.186.650,41	Corrente BID:	200.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	13,59	Pari-passu:	80,00
Operação Relacionada:	AR-X1017, AR-T1077	Saldo:	172.813.349,59	Cofinanciamento/País:	50.000.000,00
Subtipo de Operação:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimado:	250.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 03-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 25-oct-2013

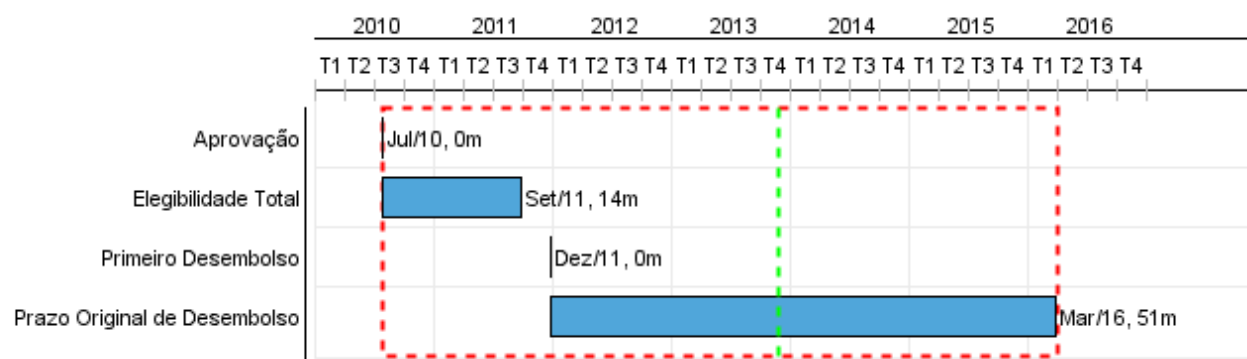

Progresso Acumulado até 2013

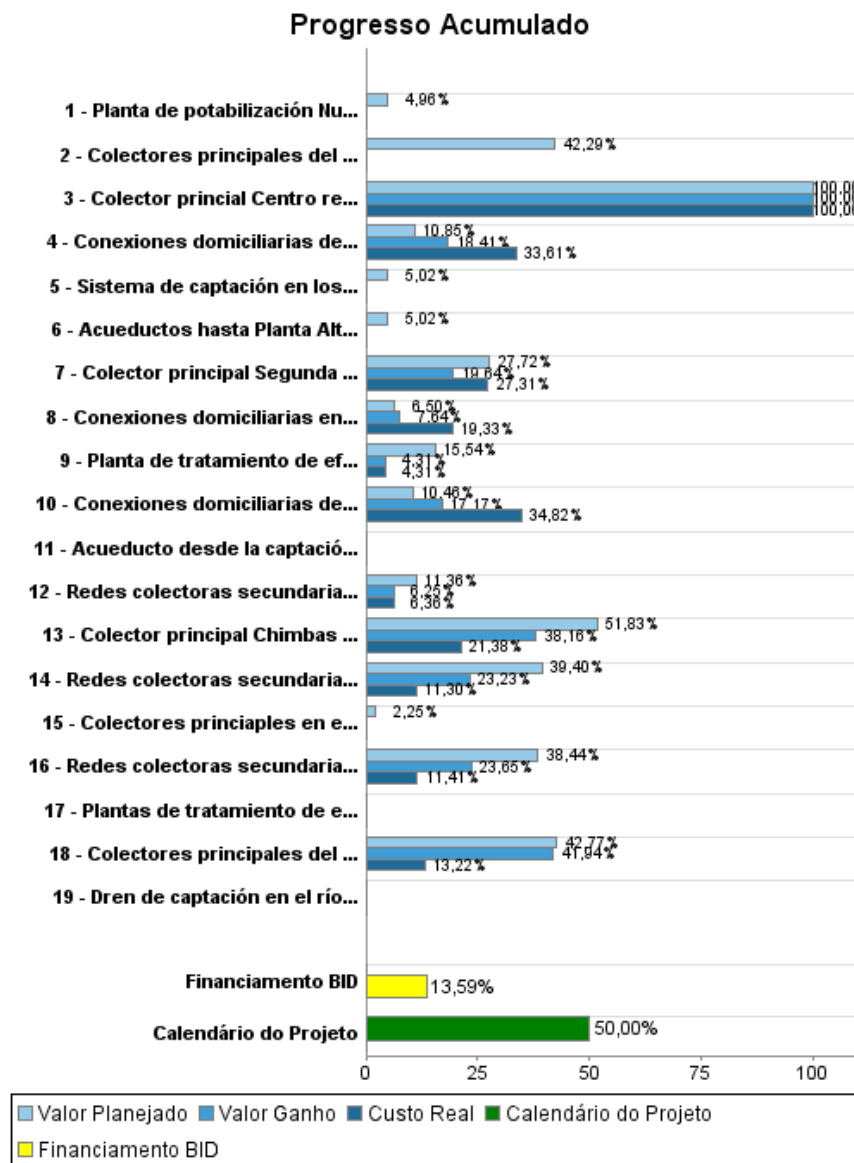

Resultados

Resultado:	Sistema cloacal de la ciudad de San Juan mejorado
Observações:	Los resultados se obtienen a partir del primer año de finalizadas las obras.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado 2021 - 2022	Final do Projeto
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares	54.650,00	2009	P A		22.400,00	10.900,00	9.800,00	4.610,00	9.790,00	112.150,00
Incremento en agua residual tratada en lagunas de estabilización	Caudal (L/seg)		2009	P A	164,00	257,00	350,00	430,00	465,00	515,00	515,00
Agua residual tratada a nivel secundario y cumpliendo con normas	Caudal (L/seg)	100,00	2009	P A	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Biosólidos tratados y dispuestos de forma ambientalmente apropiada	Cantidad (ton/día)		2009	P A	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares	54.650,00	2009	P A		22.400,00	10.900,00	9.800,00	4.610,00	9.790,00	112.150,00

Resultado:	Sistema de agua potable de la ciudad de Salta mejorado
Observações:	Los resultados se materializan una vez finalizadas las obras.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado 2021 - 2022	Final do Projeto
Hogares con sistema de suministro de agua nuevo o mejorado	Hogares		2009	P A							
Cantidad de días del año fuera de norma de turbiedad	Días	90,00	2009	P A							90,00
Cantidad de días del año con producción de agua potable restringida	Días	154,00	2009	P A							154,00
Producción media de agua potable sostenible	Caudal (m3/seg)	243,00	2009	P A							243,00

Resultado:	Sistema cloacal de la ciudad de San Miguel de Tucumán mejorado
Observações:	Los resultados se materializan una vez terminadas las obras.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado 2021 - 2022	Final do Projeto
Habitantes beneficiados directamente por el nuevo sistema de saneamiento por redes	Habitantes	30.516,00	2010	P A		39.117,00	60.554,00	80.334,00	91.494,00	130.000,00	130.000,00
Hogares con conexión al nuevo sistema de saneamiento por redes	Hogares	6.890,00	2010	P A		1.960,00	4.850,00	4.475,00	2.525,00	8.712,00	29.412,00
Cobertura del servicio de saneamiento en el área de intervención (Las Talitas, Va. Carmela y Tafí Viejo)	% Hogares	23,60	2010	P A		25,29	38,15	49,31	54,71	72,67	72,67
Caudal medio de agua residual tratada	Caudal (m3/día)		2010	P		10.582,00	15.181,00	19.378,00	21.723,00	28.000,00	28.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1084 - Water and Sanitation Program for Urban and Suburban Centers (PAYs)
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 02/10/2013

				A							
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares	6.890,00	2010	P		1.960,00	4.850,00	4.475,00	2.525,00	8.712,00	29.412,00
				A							

Resultado:	Sistema de Agua Potable de la ciudad de San Salvador de Jujuy mejorado
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado 2021 - 2022	Final do Projeto
Hogares con acceso al suministro de agua potable por red nuevo o mejorado	Hogares	84.083,00	2011	P		7.025,00	1.402,00	1.422,00	1.444,00	24.729,00	120.105,00
				A							
Cantidad de días del año fuera de norma de turbiedad	Días	90,00	2011	P		25,00	20,00	15,00	15,00	30,00	15,00
				A							
Cantidad de días del año con producción de agua potable restringida	Días	120,00	2011	P		10,00	5,00				
				A							
Producción media de agua sostenible	Caudal (m3/hora)	3.425,00	2011	P		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	11.525,00	6.125,00
				A							

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Ingeniería y Administración									
Administración del programa	N/A					520.000,00	2.762.110,00		4.000.000,00
Inspección y supervisión de obras	N/A					520.000,00	61.750,00		4.000.000,00
Estudios y proyectos	N/A					780.000,00			6.000.000,00
Costos Concurrentes									
Auditoría, evaluación y seguimiento	N/A					285.000,00	54.100,00		1.000.000,00
Costos Financieros									
Intereses	N/A					2.340.000,00	19.570,00		18.000.000,00
Comisiones de crédito	N/A					260.000,00	242.630,00		2.000.000,00
Sistema Integral de Desagües Cloacales del Gran San Juan									
Colector principal Centro rehabilitado	km				4,91				4.000.000,00
Colectores principales del subsistema cloacal Rawson construidos	km	3,90			16,26	607.000,00			2.530.000,00
Colectores principales del subsistema cloacal Chimbas construidos	km	3,85	6,57		15,67	1.074.000,00	577.500,00		4.370.000,00
Colector principal Chimbas construido	km	4,10	4,00		11,81	4.773.000,00	2.350.000,00		13.750.000,00
Colector principal Segunda Cloaca Máxima rehabilitado	km	1,20	0,85		4,33	1.350.000,00	1.330.000,00		4.870.000,00
Redes colectoras secundarias del subsistema cloacal Rawson construidas	km	35,00	30,14		173,85	4.210.000,00	1.065.380,00		20.910.000,00
Redes colectoras secundarias del subsistema cloacal Chimbas construidas	km	31,00	23,00		146,10	3.454.000,00	619.840,00		16.280.000,00
Conexiones domiciliarias del subsistema cloacal Rawson ejecutadas disponibles	Conexiones	1.480,00	2.512,00		13.665,00	179.000,00	554.620,00		1.650.000,00
Conexiones domiciliarias del subsistema cloacal Chimbas ejecutadas disponibles	Conexiones	1.210,00	1.986,00		11.605,00	136.000,00	452.659,00		1.300.000,00
Plantas de tratamiento de efluentes cloacales intervenidas	Plantas				2,00				
Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Salta									
Dren de captación en el río Toro construido	Dren								
Acueducto desde la captación hasta el tanque de reserva construido	km								
Sistema Integral de Saneamiento del Gran San Miguel de Tucumán									
Colectores principales en el Gran San Miguel de Tucumán construidos	km	0,70			31,08	334.000,00			14.840.000,00
Redes colectoras secundarias en el Gran San Miguel de Tucumán construidas	km	19,13	10,53		168,52	1.508.000,00	844.600,00		13.280.000,00
Conexiones domiciliarias en el Gran San Miguel de Tucumán ejecutadas disponibles	Conexiones	900,00	1.057,00		13.800,00	160.000,00	475.400,00		2.460.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1084 - Water and Sanitation Program for Urban and Suburban Centers (PAYs)
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 02/10/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Planta de tratamiento de efluentes cloacales Las Talitas construida	Planta				1,00	2.490.000,00	690.000,00		16.020.000,00
Sistema de Agua Potable de la Ciudad de San Salvador de Jujuy									
Sistema de captación en los Río Yala y Lozano construido	Sistema				1,00	470.000,00			9.370.000,00
Acueductos hasta Planta Alto Reyes y a Reserva en Bajo Reyes construidos	km				12,68	470.000,00			9.370.000,00
Planta de potabilización Nueva Alto Reyes construida	Planta				1,00	590.000,00			11.900.000,00
Recursos sin Asignar en Costos Directos									
Recursos sin asignar a agua potable y saneamiento	N/A								63.100.000,00
Recursos sin asignar a apoyo institucional	N/A								5.000.000,00
TOTAL						26.510.000,00	12.100.159,00		250.000.000,00
