



Operation Number: **BR-L1006**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/20/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/21/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Macambira-Anicuns Urban Environmental Program	Loan Number:	1980/OC-BR
Executing Agency (EA):	PREFECTURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
Team Leader:	Nery,Claudia Regina Borges	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFECTURA MUNICIPAL DE GOIANIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1006	\$56,700,000.00	\$56,700,000.00	\$37,800,000.00		\$94,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1006	\$56,700,000.00	\$48,175,171.93	84.97%	\$8,524,828.07


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

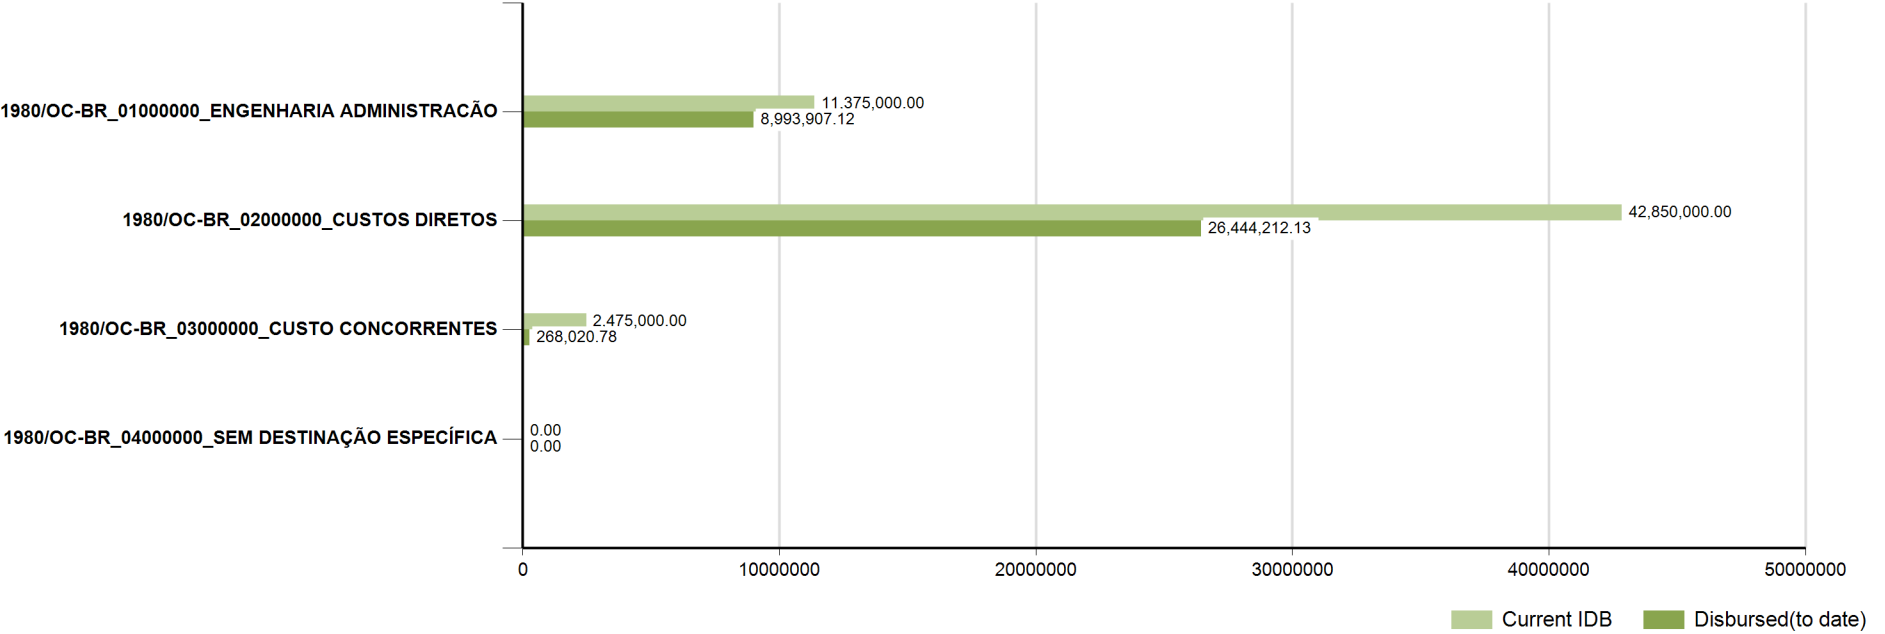

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Situação urbana-ambiental do entorno da bacia dos Ribeirões Macambira e Anicuns solucionada									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	EOP
1.1 Valor médio do aluguel dos imóveis localizados a até 650 m das margens dos córrego Macambira		R\$mes	249.50	2004	Pesquisa junto a empresas imobiliarias locais		P			
							P(a)	0.00	0.00	560.00
							A	0.00		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Problemas socioambientais que afetam a população nas áreas de intervenção do projeto reduzidos.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	EOP
1.1 Contaminação das águas do córrego Macambira		DBO5 (mg/l)	15.00	2005	Relatórios de monitoramento dos parâmetros da qualidade da água por meio de análises de amostras em laboratório especializado.		P			6.00
							P(a)	0.00	0.00	6.00
							A	0.00	0.00	
1.3 Hogares protegidos de riesgo de inundación		Hogares	0.00	2005	Desenvolvimento de projeto do parque linear abrangendo as áreas de risco de inundação com posterior implantação das obras.	Incluindo remoção das edificações no perímetro de risco e reassentamento das famílias afetadas.	P			0.00
							P(a)	0.00	0.00	50.00
							A	0.00	0.00	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Ordenamento Urbano Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Canais / leitos do córrego Macambira reabilitado	km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.55	4.00	P(a)	3,977,503.88	9,633,523.07
		A	0.38	2.21	A	920,424.11	4,871,798.78
Parque Linear nas margens do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns implantado	parque	P		1.00	P		31,620,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Vegetação lindeira do córrego Macambira, ao longo do Parque Linear, recuperada com proteção ambiental.	ha	P		0.00	P		0.00
		P(a)	28.00	55.00	P(a)	3,897,218.51	7,693,975.99
		A	5.25	19.90	A	735,112.27	2,861,633.25
Famílias atualmente vivendo em áreas de risco, reassentadas	famílias	P		251.00	P		7,000,000.00
		P(a)			P(a)		0.00
		A			A		
Ciclovias ou pistas para caminhada implantadas	km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	4.41	8.00	P(a)	3,163,447.12	5,904,243.49
		A	0.76	2.51	A	564,114.30	1,949,147.62
Parques Urbanos Implantados	ha	P		33.00	P		2,380,000.00
		P(a)		10.20	P(a)		0.00
		A		10.20	A		
Galerias de águas pluviais (incluindo dispositivos finais de lançamento) contruídas	km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.61	4.25	P(a)	2,870,429.26	7,394,348.88
		A	0.41	3.85	A	706,484.74	4,000,220.39
Obras de arte (pontes ou bueiros) construídas	m	P		0.00	P		0.00
		P(a)	125.00	260.70	P(a)	7,762,021.12	14,023,433.12
		A	24.91	108.61	A	1,339,853.13	4,274,684.65
Parque Ambiental Macambira, incluindo proteção e recuperação de área natural, implantado	ha	P		0.00	P		0.00
		P(a)	7.30	25.00	P(a)	1,977,180.35	5,914,828.54
		A	2.39	20.09	A	565,125.63	4,502,773.82
Parque Ambiental Urbano Pedreira, incluindo proteção e recuperação de área natural, implantado	ha	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Famílias vivendo em áreas de risco, ou dentro dos limites dos Parques, indenizadas ou reassentadas	Households (#)	P		0.00	P		0.00
		P(a)	25.00	155.00	P(a)	3,654,545.45	9,929,247.10
		A	11.00	124.00	A	236,623.07	3,711,014.36
Negócios / Empresas, situados dentro dos limites do Parque reinstalados	empresas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	22.00	22.00	P(a)	720,000.00	720,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Terrenos privados situados dentro dos limites dos Parques, indenizados	terrenos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	20.00	25.00	P(a)	2,189,454.54	4,454,571.97
		A	0.00	0.00	A	0.00	1,717,753.79
Consolidação da Infraestrutura dos Bairros		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Vias em asfalto, incluindo sistema de drenagem pluvial, pavimentadas	km	P		0.00	P		0.00
		P(a)		10.00	P(a)		3,500,000.00
		A	0.00	35.05	A	0.00	3,592,056.07
Obras para a consolidação da infraestrutura dos bairros construídas e em operação	km	P		24.00	P		4,000,000.00
		P(a)			P(a)		
		A			A		

Sistema de iluminação pública de vias em áreas de abrangência do programa, implantados	km	P		0.00	P		0.00
		P(a)		50.00	P(a)		500,000.00
		A	0.00	52.75	A	0.00	407,562.56
Equipamentos urbanos para consolidação da infraestrutura dos bairros construídos e em operação	unidade	P		14.00	P		15,000,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Escola de tempo integral construída.	escola	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	757,661.66	1,527,561.56
		A	0.00	0.00	A	57,267.75	827,167.65
Escola de ensino infantil construída	escola	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Unidade de Atenção básica de saúde da família construída	unidade de saúde	P		0.00	P		0.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	1,425,527.29	2,398,950.70
		A	1.00	1.00	A	118,766.46	1,092,189.87
Centro de Apoio Psicossocial instalado	centro de apoio	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Pequenas obras urbanísticas de valorização comunitária executadas	obras	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sustentabilidade Social e Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Campanha de monitoramento da qualidade das águas do Córrego Macambira concluída	relatório	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)	4.00	10.00	P(a)	10,000.00	18,696.66
		A	2.00	3.00	A	27,265.66	28,713.78
Planos de Manejo para os Parques Ambientáis Urbanos, implementados	plano	P		2.00	P		1,300,000.00
		P(a)			P(a)		
		A			A		
Campanha de comunicação social e educação ambiental do Programa implementada	campanha	P		3.00	P		1,000,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)		1,070,763.08
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano Diretor de Resíduos Sólidos para os Parques elaborado	plano	P		1.00	P		900,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Linear elaborado	relatório	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	196,926.49	196,926.49
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de melhoria do gerenciamento da gestão viária implantado	sistema	P		1.00	P		1,000,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Ambiental Macambira elaborado	relatório	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	131,284.33	131,284.33
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Relatório do Plano de Manejo para o Parque Urbano da Pedreira elaborado	relatório	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Relatório do Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Programa elaborado	relatório	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Profissionais do corpo técnico da AMMA capacitados	funcionários	P		0.00	P		0.00
		P(a)		70.00	P(a)		20,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
População da área de influência do Programa assistida em educação sanitária e ambiental	pessoas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	500.00	P(a)		52,139.18
		A	0.00	300.00	A	0.00	0.00
Sistema de melhoria do gerenciamento da gestão viária - Equipamentos para a SEMOB adquiridos	sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		650,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimento institucional da AMMA	sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		90,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost			2016	Cost
Outros custos (administração, financeiro, auditoria, etc...)	P			\$0.00
	P(a)		\$5,794,707.55	\$18,675,505.84
	A		\$565,547.84	\$11,337,523.98
Total Cost			2016	Total Cost
	P			\$64,300,000.00
	P(a)		\$38,527,907.55	\$93,759,618.63
	A		\$5,836,584.96	\$45,174,240.57

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
