
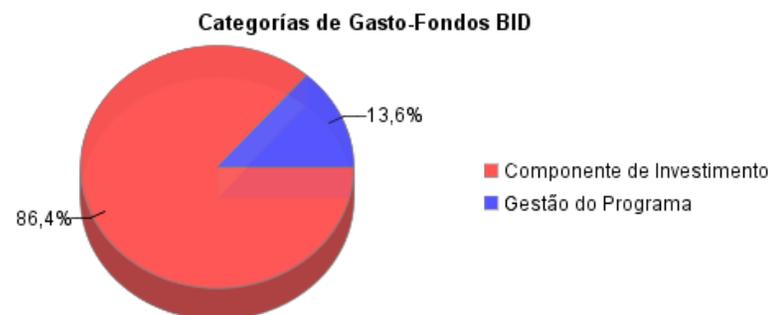


Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO | Monto Aprobado Actual: | 23.910.000,00 | BID Original: | 23.910.000,00 |
| Sector: | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING | Monto Desembolsado a la fecha: | | Actual BID: | 23.910.000,00 |
| Número(s) de Préstamo: | 2752/OC-BR | % Desembolsado: | | Pari-passu: | 50,00 |
| Etapas: | Approved | Saldo: | 23.910.000,00 | Co-financiamiento/País: | 23.910.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | | | Estimado Original: | 47.820.000,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | BR-L1043, BR-T1119, BR-T1225, RG-P1478 | | | Período de Amortización (meses): | 234 |
| Subtipo de Operación: | GCR - Operación Global de Crédito | | | | |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 08-oct-2013 Validado por Representante de País: 09-oct-2013 |

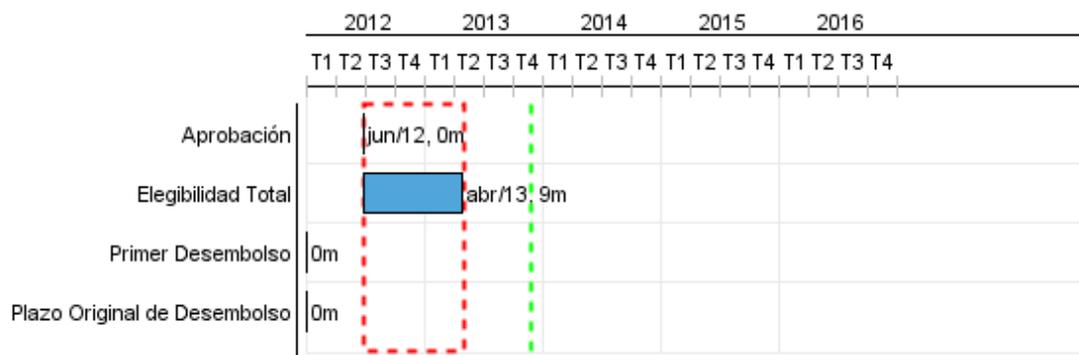

Progreso Acumulado al 2013



Resultados
Resultado: Áreas Urbanas de la Ciudad Revitalizada Urbanística y Ambientalmente

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|-----------|------|-----------------|
| Satisfacción de los usuarios con el Área Central de la ciudad de Novo Hamburgo | % | 68,50 | 2010 | P A | | | | 73,60 | | 73,60 |
| Visitantes en la Fundación Scheffel | Visitantes/Año | 6.229,00 | 2010 | P A | | | | 8.046,00 | | 8.046,00 |
| Visitantes en la Casa Schmitt Presser | Visitantes/Año | 5.220,00 | 2010 | P A | | | | 6.742,00 | | 6.742,00 |
| Visitantes en la Casa Lar das Meninas | Visitantes/Año | | 2010 | P A | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Visitantes del Parcão | Visitantes/Año | 32.500,00 | 2010 | P A | | | | 49.484,00 | | 49.484,00 |

Resultado: Desarrollo Económico Sostenible del Municipio Promovido

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|-------|------|-----------------|
| Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Sectorial (PES) 1 | Empresas | | 2010 | P A | | | | 20,00 | | 20,00 |
| Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Sectorial (PES) 2 | Empresas | | 2010 | P A | | | | 40,00 | | 40,00 |

Resultado: Criminalidad Juvenil en los Barrios Carenciados Controlada

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Fin de Proyecto |
|--|------------------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|-------|------|-----------------|
| Tasa de homicidios en los barrios de Canudos y Santo Afonso. | Homicidios/100mil habitantes | 89,00 | 2010 | P A | | | | 62,00 | | 62,00 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Revitalização Urbana - Requalificação da Sub-Bacia do Arroio Pampa | | | | | | | | | |
| Infraestrutura viária e pavimentação da Avenida Alcântara implantada | Km | | | | 1,90 | | | | |
| Famílias Reassentadas | Famílias | | | | 41,00 | | | | |
| Ciclovias implantadas | Km | | | | 1,90 | | | | |
| Margens do Arroio Pampa restauradas (revegetação e muro de contenção) | Km | | | | 1,90 | | | | |
| Interseção da Avenida Alcântara con a Avenida do Município Implantada | Interceção | | | | 1,00 | | | | |
| Revitalização Urbana - Revitalização da Área Central da Cidade | | | | | | | | | |
| Infraestrutura dos cabos elétricos da iluminação pública enterrada e aérea - instalada | Km | | | | 1,00 | | | | |
| Calçadas (Paseos) Públicas Implantadas | Km | | | | 3,80 | | | | |
| Praças Construídas | Praças | | | | 2,00 | | | | |
| Vias Implantadas | Km | | | | 3,80 | | | | |
| Ciclovias Implantadas | Km | | | | 0,60 | | | | |
| Revitalização Urbana - Revitalização do Centro Histórico Hamburgo Velho | | | | | | | | | |
| Praças Revitalizadas | Praça | | | | 2,00 | | | | |
| Edifício Histórico - Casa Lar das Meninas Restaurado | Edifício | | | | 1,00 | | | | |
| Calçadas (Paseos) Públicas Implantadas | Km | | | | 1,50 | | | | |
| Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz) | Km | | | | 100,00 | | | | |
| Revitalização Urbana - Vinculação entre Centro Histórico Hamburgo Velho e a Área Central | | | | | | | | | |
| Ciclovía Implantada | Km | | | | 2,60 | | | | |
| Praças Revitalizadas | Praças | | | | 1,00 | | | | |
| Calçadas (Paseos) Públicos Implantadas | Km | | | | 2,60 | | | | |
| Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz) | Km | | | | 2,60 | | | | |
| Revitalização Urbana - Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler Parcão | | | | | | | | | |
| Edifício do Centro Educacional Ambiental Construído | Edifício | | | | 1,00 | | | | |
| Área do Parque com Vallas | Hectáres | | | | 54,00 | | | | |

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Ciclovías Construídas (perto do parque e das calçadas públicas) | Km | | | | 1,70 | | | | |
| Equipamentos Públicos Construídos (banheiros , Vestuários e Etc) | Equipamentos | | | | 100,00 | | | | |
| Desenvolvimento Econômico Local | | | | | | | | | |
| Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) - Elaborado | Projeto | | | | 1,00 | | | | |
| Pólo de Inovação Criativa Hamburgtech instalado | Polo | | | | 1,00 | | | | |
| Plano do Distrito Industrial Elaborado (Projetos Básicos, urbanismo e executivo) | Plano | | | | 1,00 | | | | |
| Prevenção da Violência - Ações para o Fortalecimento Institucional para a Prevenção da Violência | | | | | | | | | |
| Jovens Atendidos no Projeto para Jovens nos Bairros Canudos e Santo Afonso | Jovens | | | | 2.400,00 | | | | |
| Plano Municipal de Segurança Pública - Elaborado | Plano | | | | 1,00 | | | | |
| Fórum Municipal de Segurança para a Validação e Seguimento do Plano Constituído | Fórum | | | | 1,00 | | | | |
| Prevenção da Violência - Ações de Prevenção Social da Violência | | | | | | | | | |
| Projeto de Apoio sócio-educativo técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para Jovens Elaborado | Projeto | | | | 1,00 | | | | |
| Projeto de Formação de Mulheres/Mães de Família como Agentes de Mudanças em Relação a Violência Elaborado | Projeto | | | | 1,00 | | | | |
| Projeto de Fortalecimento de Serviços de Solução de Conflitos - Elaborados | Projeto | | | | 1,00 | | | | |
| Prevenção da Violência - Gestão da Informação e Conhecimento para a Prevenção da Violência | | | | | | | | | |
| Observatório de Crime e de Violência - Implataado | Observatório | | | | 1,00 | | | | |
| Informe do Observatório - Elaborado | nº de Informes | | | | 4,00 | | | | |
| Administração do Programa / Estudos e Projetos | | | | | | | | | |
| Administração do Programa / Estudos e Projetos | N/A | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
