
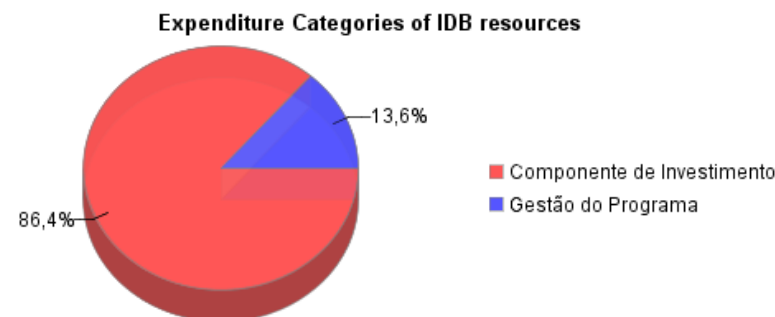
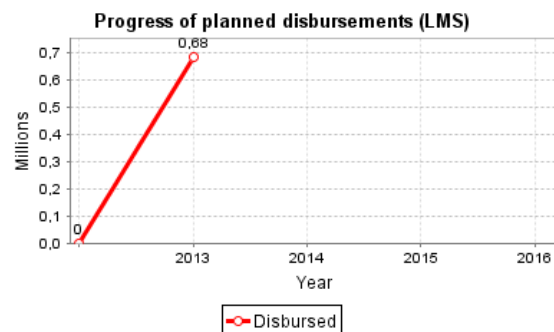


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Loan Number(s):	2752/OC-BR	Current Approved Amount:	23.910.000,00	Original IDB:	23.910.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	23.910.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	50,00
Related Operation(s):	BR-L1043, BR-T1119, BR-T1225, RG-P1478	Balance:	23.910.000,00	Co-Financing/Country:	23.910.000,00
Operation Subtype:	GCR - Global Credit Operation			Original Estimate:	47.820.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 08-oct-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013

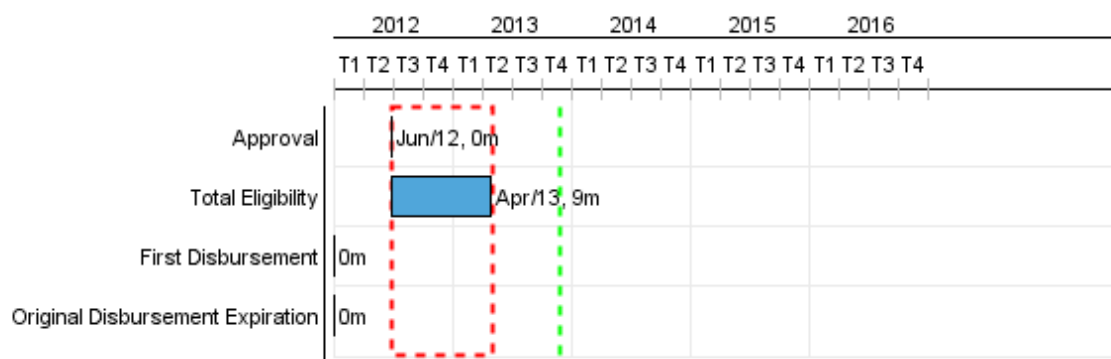

Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome: Áreas Urbanas de la Ciudad Revitalizada Urbanística y Ambientalmente

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Satisfacción de los usuarios con el Área Central de la ciudad de Novo Hamburgo	%	68,50	2010	P A				73,60		73,60
Visitantes en la Fundación Scheffel	Visitantes/Año	6.229,00	2010	P A				8.046,00		8.046,00
Visitantes en la Casa Schmitt Presser	Visitantes/Año	5.220,00	2010	P A				6.742,00		6.742,00
Visitantes en la Casa Lar das Meninas	Visitantes/Año		2010	P A				6.000,00		6.000,00
Visitantes del Parcão	Visitantes/Año	32.500,00	2010	P A				49.484,00		49.484,00

Outcome: Dessarrollo Económico Sostenible del Municipio Promovido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Sectorial (PES) 1	Empresas		2010	P A				20,00		20,00
Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Setorial (PES) 2	Empresas		2010	P A				40,00		40,00

Outcome: Criminalidad Juvenil en los Barrios Carenciados Controlada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Tasa de homicidios en los barrios de Canudos y Santo Afonso.	Homicidios/100mil habitantes	89,00	2010	P A				62,00		62,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Revitalização Urbana - Requalificação da Sub-Bacia do Arroio Pampa									
Infraestrutura viária e pavimentação da Avenida Alcântara implantada	Km				1,90				
Famílias Reassentadas	Famílias				41,00				
Ciclovias implantadas	Km				1,90				
Margens do Arroio Pampa restauradas (revegetação e muro de contenção)	Km				1,90				
Interseção da Avenida Alcântara com a Avenida do Município Implantada	Interceção				1,00				
Revitalização Urbana - Revitalização da Área Central da Cidade									
Infraestrutura dos cabos elétricos da iluminação pública enterrada e aérea - instalada	Km				1,00				
Calçadas (Paseos) Públicas Implantadas	Km				3,80				
Praças Construídas	Praças				2,00				
Vias Implantadas	Km				3,80				
Ciclovias Implantadas	Km				0,60				
Revitalização Urbana - Revitalização do Centro Histórico Hamburgo Velho									
Praças Revitalizadas	Praça				2,00				
Edifício Histórico - Casa Lar das Meninas Restaurado	Edifício				1,00				
Calçadas (Paseos) Públicas Implantadas	Km				1,50				
Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Km				100,00				
Revitalização Urbana - Vinculação entre Centro Histórico Hamburgo Velho e a Área Central									
Ciclovias Implantadas	Km				2,60				
Praças Revitalizadas	Praças				1,00				
Calçadas (Paseos) Públicas Implantadas	Km				2,60				
Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Km				2,60				
Revitalização Urbana - Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler - Parcão									
Edifício do Centro Educacional Ambiental Construído	Edifício				1,00				
Área do Parque com Vallas	Hectáres				54,00				

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Ciclovias Construídas (perto do parque e das calçadas públicas)	Km				1,70				
Equipamentos Públicos Construídos (banheiros , Vestuários e Etc)	Equipamentos				100,00				
Desenvolvimento Econômico Local									
Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) - Elaborado	Projeto				1,00				
Pólo de Inovação Criativa Hamburgtech instalado	Polo				1,00				
Plano do Distrito Industrial Elaborado (Projetos Básicos, urbanismo e executivo)	Plano				1,00				
Prevenção da Violência - Ações para o Fortalecimento Institucional para a Prevenção da Violência									
Jovens Atendidos no Projeto para Jovens nos Bairros Canudos e Santo Afonso	Jovens				2.400,00				
Plano Municipal de Segurança Pública - Elaborado	Plano				1,00				
Fórum Municipal de Segurança para a Validação e Seguimento do Plano Constituído	Fórum				1,00				
Prevenção da Violência - Ações de Prevenção Social da Violência									
Projeto de Apoio sócio-educativo técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para Jovens Elaborado	Projeto				1,00				
Projeto de Formação de Mulheres/Mães de Família como Agentes de Mudanças em Relação a Violência Elaborado	Projeto				1,00				
Projeto de Fortalecimento de Serviços de Solução de Conflitos - Elaborados	Projeto				1,00				
Prevenção da Violência - Gestão da Informação e Conhecimento para a Prevenção da Violência									
Observatório de Crime e de Violência - Implataado	Observatório				1,00				
Informe do Observatório - Elaborado	nº de Informes				4,00				
Administração do Programa / Estudos e Projetos									
Administração do Programa / Estudos e Projetos	N/A								
TOTAL									
