
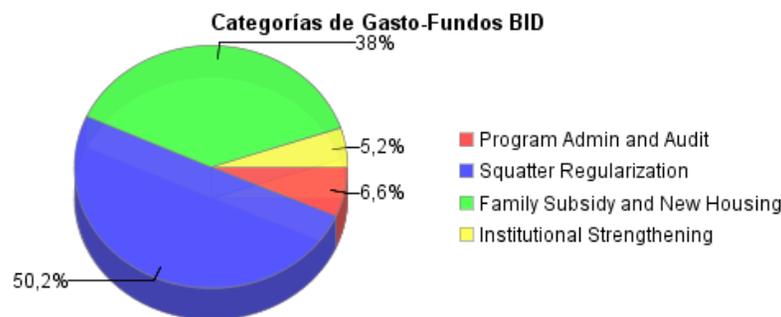
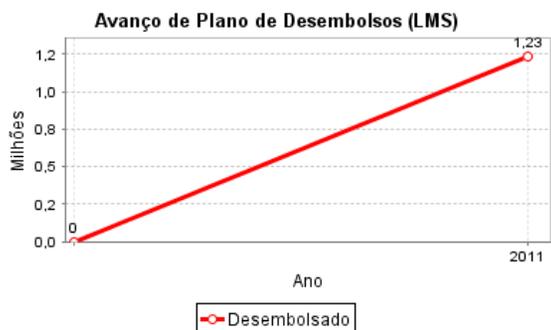



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTRY OF HOUSING AND SETTLEMENTS		
Setor:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING		
Número da Operação:	2469/OC-TT	Atual:	40.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	40.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	80,00
Operação Relacionada:	RG-P1400	Saldo:	40.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	40.000.000,00
		Corrente BID:	40.000.000,00
		Pari-passu:	80,00
		Cofinanciamento/País:	10.000.000,00
		Original Estimado:	50.000.000,00
		Período de Amortização (meses):	222

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011

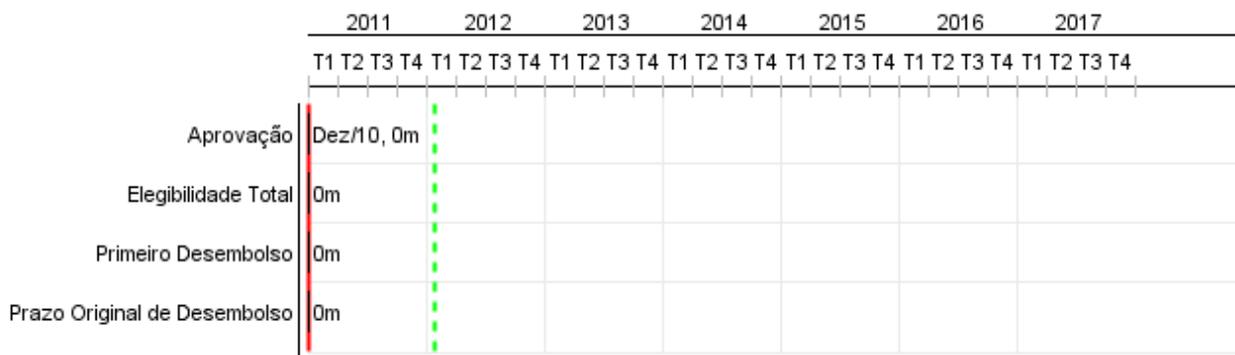

Progresso Acumulado até 2011

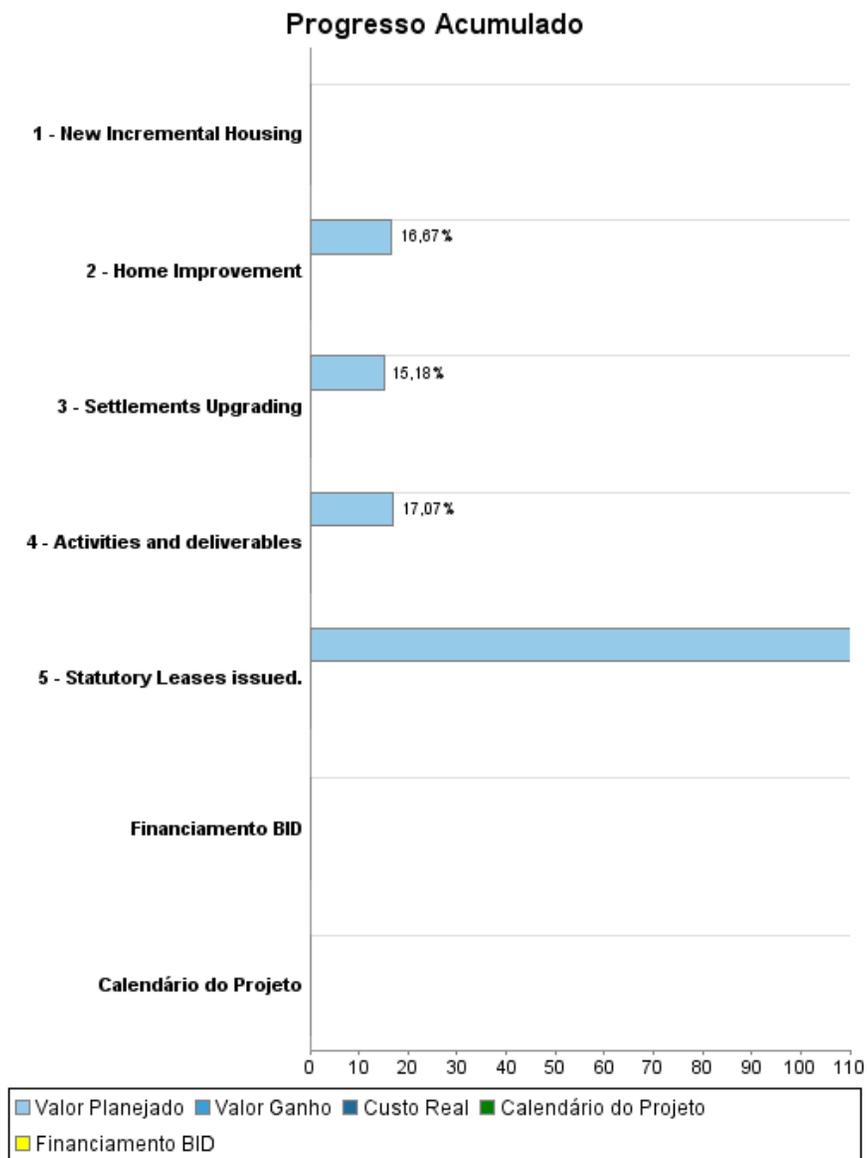

Resultados

Resultado: Tenure and conditions in squatter settlements regularized

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Number of squatting families with applications in LSA unattended.	Percent	22.700,00	2011	P A	8.477,00

Resultado: Housing conditions of low- and middle income families improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
% of low income families living in adequate housing (with inadequate meaning missing at least one of three attributes: appropriate roof, closing structure, or floor).	Percent	75,00	2011	P A	80,00
% of middle income families living in adequate housing (with inadequate meaning missing at least one of three attributes: appropriate roof, closing structure, or floor).	Percent	85,00	2011	P A	90,00

Resultado: Institutional capacity of the MEH strengthened

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Value of disbursement/month.	disbursement/month	1.200.000,00	2011	P A	3.000.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Squatter Regularization									
Statutory Leases issued.	Leases	935,00			8.477,00	2.735.953,00			640.000,00
Relocation	Families								1.456.000,00
Settlements Upgrading	Families	810,00			5.360,00	2.733.000,00			18.000.000,00
Home Improvements and New Housing									
Home Improvement	Subsidies	333,00			2.000,00	1.067.000,00			6.400.000,00
New Incremental Housing	Subsidies				1.530,00				8.800.000,00
Sector and Institutional Strengthening									
Activities and deliverables	Number of	7,00			41,00	409.756,00			2.400.000,00
Others									
TOTAL						6.945.709,00			37.696.000,00
