

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1243	Chief of Operations Validation Date	10/16/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	DEVELOPMENT PROGRAM FOR METROPOLITAN AREAS OUTSIDE THE CAPITAL II	Loan Number	3780/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	DU-SUS - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES
Team Leader	SOULIER FAURE, MARTIN NICOLAS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1243	80,000,000	80,000,000	20,000,000	0	100,000,000	80,000,000	1,700,000	2.12%	78,300,000
Aggregated	80,000,000	80,000,000	20,000,000	0	100,000,000	80,000,000	1,700,000	2.12%	78,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

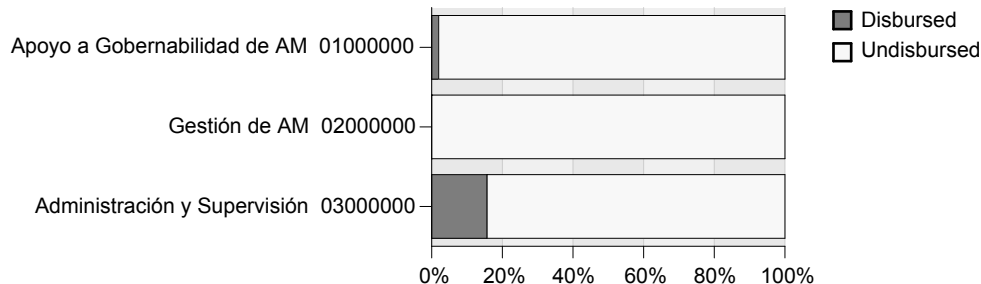

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Generar un entendimiento de los problemas que enfrentan las metrópolis y fomentar acuerdos de priorización de intervenciones que requieren coordinación entre autoridades municipales y provinciales de un área metropolitana

Observation: Las agendas capturan el acuerdo político y líneas prioritarias de trabajo coordinado entre las autoridades que componen las AM. Las 21 AM de Argentina tienen 135 municipios

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Proporción de intendentes en AM del país que suscriben una Agenda Metropolitana de prioridades de intervención en infraestructura y servicios públicos en el AM que involucra al municipio bajo su jurisdicción	total de intendentes en AM que suscriben una agenda	18.00	2016	P		40.00
					P(a)		40.00
					A		

Details

Means of verification: Aprobación y publicación de agendas metropolitanas de las AM verificado a través de informes semestral y evaluación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Proporción de funcionarios de organismos territoriales y sectoriales con responsabilidad sobre los problemas metropolitanos capacitados en mejores prácticas de gestión metropolitana.	Nro de funcionarios capacitados / Nro de funcionarios totales	232.00	2016	P		465.00
					P(a)		465.00
					A		

Details

Means of verification: Informe semestral basado en registros de asistencia a talleres de capacitación

Observations: Línea de base es proporción de funcionarios capacitados con DAMI-I. El denominador calcula en promedio diez funcionarios por los 135 municipios y las 20 provincias de las 21 AM en Argentina

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.2	Promedio de sesiones por mes en el Portal web del programa DAMI sobre temas de gestión metropolitana	Nro de sesiones por mes	0.00	2017	P		4,000.00
					P(a)		4,000.00
					A		

Details

Means of verification: Registro a través de sistema analítico del portal web reportado en informe semestral.

Observations: Actualmente, el portal web no tiene funcionalidad para contar visitas de usuarios. La meta proviene de información del Portal del Gobierno Local que es similar en naturaleza

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Contribuir a la creación de las instituciones necesarias para la provisión de servicios e infraestructuras en áreas metropolitanas que incluyen dos o más jurisdicciones

Observation: Fortalecimiento institucional de las AM

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Número total de entidades metropolitanas que proveen servicios e infraestructuras metropolitanas involucrando dos o más jurisdicciones	Entidades metropolitanas	13.00	2016	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe semestral basado en registros de la UEC							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Sistema de Semáforos Inteligentes Implementado en el Area Metropolitana de Mendoza

Observation: Proyecto Sistema de Semaforización Inteligente- AM MENDOZA

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Siniestros simples	sinistros ocurridos	35.00	2017	P		
					P(a)	17.00	17.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes UEP							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Red Ciclovía en el Area Metropolitana de Mendoza ampliada

Observation: Reparto modal de la bicicleta en los viajes dentro del Area Metropolitana de Mendoza

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.0	Reparto modal de la bicicleta en los viajes dentro del Area Metropolitana de Mendoza	%	2.00	2010	P		
					P(a)	7.00	7.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes UEP							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 4: Recuperación y refuncionalización del Arbolado Público Urbano en el Area metropolitana de Mendoza

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
4.0	Acequias permeabilizadas	km	0.00	2018	P		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.0	Acequias permeabilizadas	km	0.00	2018	P(a)	72.00	72.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes UEP							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 5: Plan de apoyo a la reestructuración vial y ferroviaria en el Area metropolitana de Confluencia

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
5.0	Reducción de accidentes	nro de accidentes	2,632.00	2017	P	
					P(a)	2,370.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes UEP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 6: Plan de apoyo al desarrollo de la movilidad y el transporte metropolitano - Area Metropolitana de Confluencia

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
6.0	Incremento de participación del Transporte Público en la movilidad general	cantidad de pasajeros	120,000.00	2018	P	
					P(a)	192,000.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes UEP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la Gobernabilidad de Áreas Metropolitanas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Diagnósticos de identificación de problemas metropolitanos realizados.	Documen tos de diagnóstico	P	2	4	1,300,000	3,360,000
			P(a)		4	0	3,360,000
			A	1	2	8,000	168,000
1.2	Talleres sobre temas metropolitanos para funcionarios técnicos y actores de la sociedad civil realizados.	talleres	P	10	33	1,200,000	3,990,000
			P(a)	16	33	200,000	3,990,000
			A	0	7	0	200,000
1.3	Seminarios internacionales sobre temas metropolitanos realizados.	seminarios	P	1	2	200,000	300,000
			P(a)		2	0	300,000
			A		1	0	83,000
1.4	Actualizaciones al portal WEB del programa DAMI sobre temas metropolitanos realizadas.	portal	P	1	4	200,000	600,000
			P(a)	1	4	23,000	600,000
			A	1	2	0	100,000

Component Nbr. 2 Gestión de Áreas Metropolitanas - Fortalecimiento Institucional de las AM

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Proyectos de desarrollo institucional formulados.	proyectos	P	2	7	300,000	1,207,000
			P(a)		7	250,000	3,818,000
			A		0	8,800	58,800
2.2	Lineamientos estratégicos metropolitanos integrales formulados.	estudios	P	3	6	1,100,000	4,200,000
			P(a)		1		1,589,000
			A		0		0
2.3	Planes metropolitanos sectoriales formulados.	planes	P	4	11	1,500,000	5,100,000
			P(a)		11	60,000	5,100,000
			A		0	121,000	321,000
2.4	Estudios de preinversión para inversiones metropolitanas no financiadas con DAMI-II.	estudios	P	2	3	1,700,000	2,793,000
			P(a)		3	0	2,793,000
			A		0	0	126,000

Component Nbr. 3 Gestión de Áreas Metropolitanas - Inversiones en áreas metropolitanas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	AM Mendoza – Centro de Gestión de semaforización	Centro en funcionamiento	P	1	1		800,000
			P(a)		1	0	3,152,000
			A	0	0	0	13,000
3.2	AM Rosario: Etapa 1: Obras Iniciales, refuncionalización Predio Paganini	Centro paganiani reformado	P		0		0
			P(a)		1	0	18,398,000
			A		0	0	0
3.3	AM Mendoza: Ciclovías en el área metropolitana de Mendoza construidos	km	P		0		0
			P(a)		85	0	5,740,000
			A		0	0	0

Other Cost

	Proyectos de inversión Componente Gestión de Areas Metropolitanas (cartera por definir)	P			35,000,000	71,400,000
		P(a)			11,010,000	47,410,000
		A			0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administración y gestión	P			967,500	3,750,000
		P(a)			1,000,000	3,750,000
		A			278,000	854,000

Total Cost

	Total Cost	P			45,717,500	100,000,000
		P(a)			12,543,000	100,000,000
		A			415,800	1,923,800

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
