
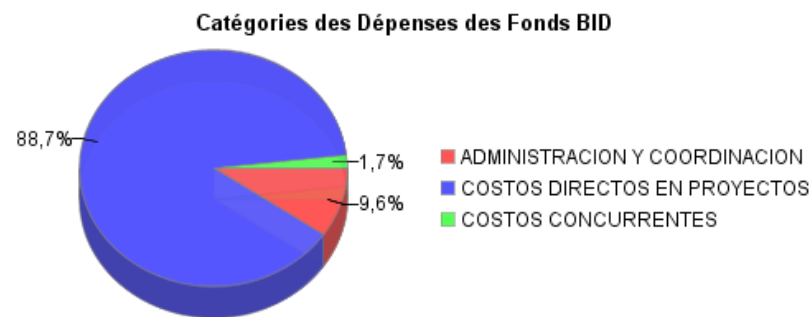
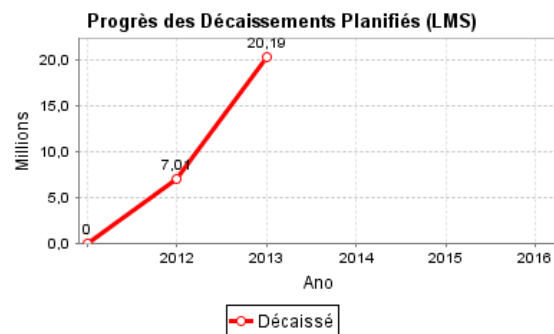



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca				
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2573/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	230.000.000,00	Initial BID:	230.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	20.194.780,73	Courant BID:	230.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	8,78	Pari Passu:	80,00
Opération(s) Connexe(s):	AR-T1090, RG-P1442	Solde:	209.805.219,27	Cofinancement/Pays:	57.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Estimation Initiale:	287.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2013
		Validé par le Représentant: 25-oct-2013

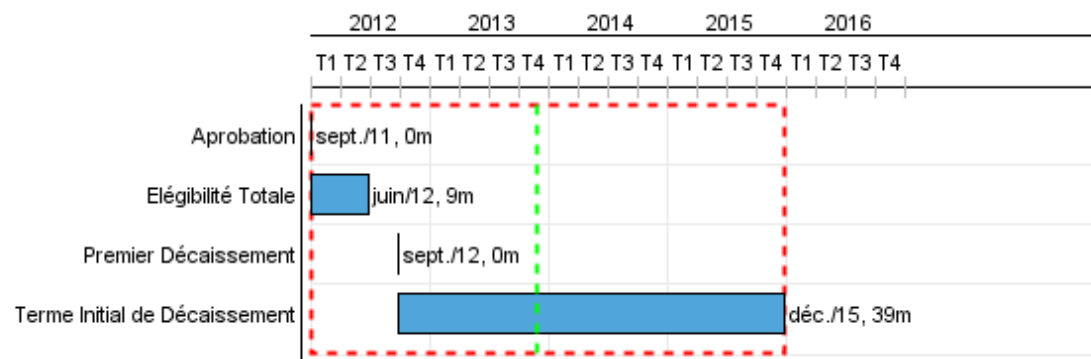

Progrès Cumulé à 2013

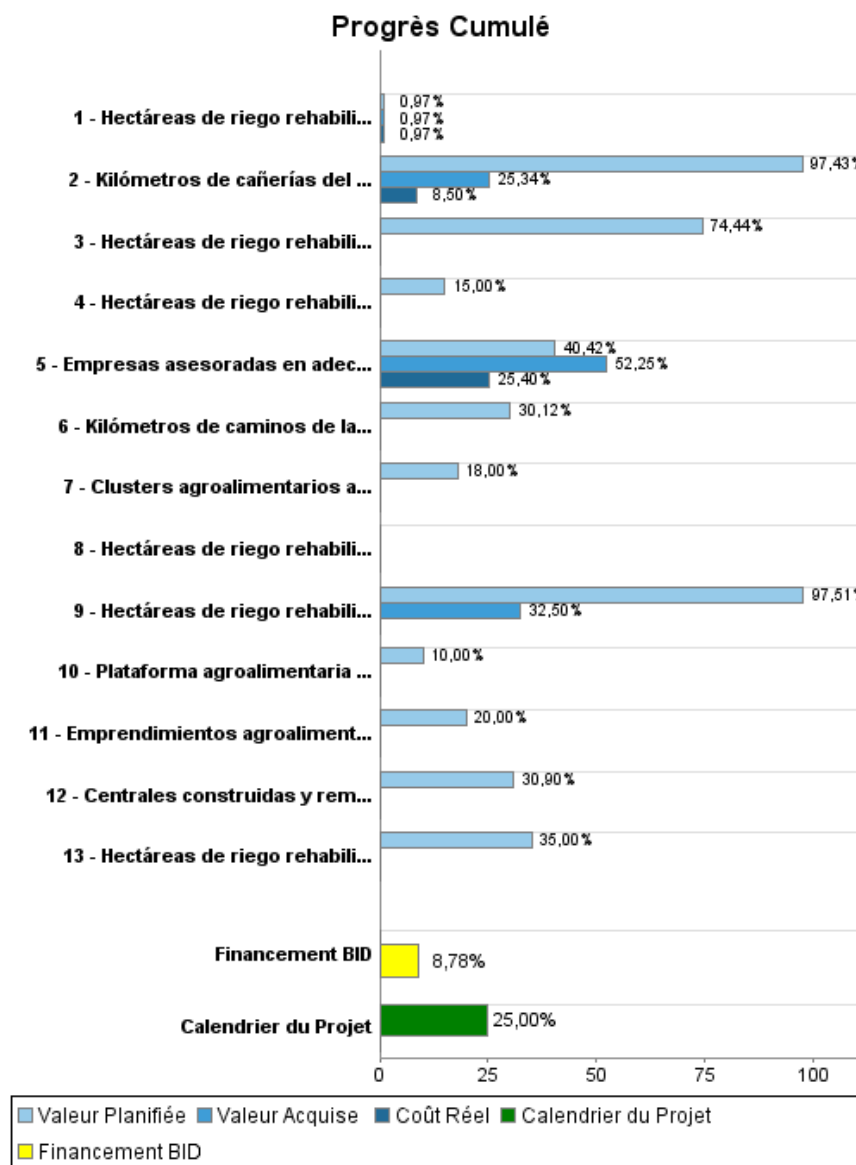

Résultats

Résultat:	Déficits de capacités institutionnelles de entidades provinciales del Programa reducidos.
Suposições:	Diagnóstico inicial: Evaluación de la capacidad institucional de entidades provinciales del PROSAP. Repetición del estudio al final del Proyecto.
Observações:	Se utiliza Matriz de Entidad/Déficit. Las filas corresponden a las 52 entidades de las 18 provincias relevadas. Las columnas corresponden a cada uno de los déficit posibles seleccionados para el análisis de que se trate. Cuando una casilla, correspondiente a la intersección de la fila de una entidad con la columna de un déficit, se presenta en color oscuro (el escaque se halla ¿ocupado¿), significa que ese déficit se presenta en esa entidad.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Déficit relacionados con las reglas de juego.	%	15,00	2011	P					12,00	12,00
				A						
Déficits debido a relaciones interinstitucionales disfuncionales.	%	16,00	2011	P					14,00	14,00
				A						
Déficits vinculados con debilidades de los esquemas organizativos.	%	15,00	2011	P					9,00	9,00
				A						
Déficits ocasionados por la insuficiencia o inexistencia de recursos humanos y materiales.	%	43,00	2011	P					15,00	15,00
				A						
Déficits relativos a falencias en materia de conocimientos o destrezas del personal.	%	16,00	2011	P					9,00	9,00
				A						

Résultat:	Entidades de enlace fortalecidas en sus capacidades técnicas y operativas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Entidades que completaron más del 90% de las actividades de sus planes de fortalecimiento.	Entidades		2011	P	3,00	3,00	6,00	6,00		18,00
				A						

Résultat:	Rendimiento por hectarea incrementado. Mendoza - Red Terciaria de Riego.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Productividad Vid tintas A	Kg/Ha	10.000,00	2011	P				12.000,00		12.000,00
				A						
Productividad Vid Tintas B	Kg/ha	18.000,00	2011	P				20.000,00		20.000,00
				A						
Productividad Vid Blancas A	Kg/ha	11.000,00	2011	P				13.000,00		13.000,00
				A						
Productividad Vid Blancas B	Kg/ha	23.000,00	2011	P				26.000,00		26.000,00
				A						
Productividad Vid Común	Kg/ha	23.000,00	2011	P				26.000,00		26.000,00
				A						
Productividad Frutales de Carozo	Kg/ha	20.000,00	2011	P				25.000,00		25.000,00

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1120 - Provincial Agricultural Services Program - PROSAP III
2013 1° período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 24/09/2013

				A						
Productividad Olivo	Kg/ha	8.000,00	2011	P				9.000,00		9.000,00
				A						
Productividad Zapallo	Kg/ha	5.000,00	2011	P				30.000,00		30.000,00
				A						
Productividad Melón-Sandía	Kg/ha	25.000,00	2011	P				32.000,00		32.000,00
				A						
Productividad Cebolla	Kg/ha	40.000,00	2011	P				50.000,00		50.000,00
				A						
Productividad Ajo	Kg/ha	10.000,00	2011	P				11.000,00		11.000,00
				A						
Productividad Tomate Industria	Kg/ha	60.000,00	2011	P				70.000,00		70.000,00
				A						

Résultat: Area con infraestructura de riego mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Eficiencia global del sistema mejorada.	%	35,00	2011	P				57,00		57,00
				A						

Résultat: Rendimiento por hectarea incrementado. San Juan - Canal del Norte.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Productividad Uva Mosto	Kg/ha	28.000,00	2011	P				29.279,00		29.279,00
				A						
Productividad Uva Mesa	Kg/ha	21.900,00	2011	P				22.900,00		22.900,00
				A						
Productividad Uva Fina Vinificar	Kg/ha	18.000,00	2011	P				18.822,00		18.822,00
				A						
Productividad Hortalizas Verano Melón	Kg/ha	16.000,00	2011	P				16.731,00		16.731,00
				A						
Productividad Hortalizas Verano Tomate	Kg/ha	59.000,00	2011	P				61.695,00		61.695,00
				A						
Productividad Hortalizas Invierno Ajo	Kg/ha	10.000,00	2011	P				10.457,00		10.457,00
				A						
Productividad Olivo para Aceite	Kg/ha	10.500,00	2011	P				10.980,00		10.980,00
				A						
Productividad Pasturas	Kg/ha	780,00	2011	P				816,00		816,00
				A						
Productividad Frutales Durazno	Kg/ha	20.000,00	2011	P				20.914,00		20.914,00
				A						

Résultat:	Area con infraestructura de riego mejorada.
-----------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Hectareas afectadas de riego	Has		2011	P						25.177,00
				A						
Eficiencia global del sistema mejorada.	%	30,00	2011	P						58,00
				A						

Résultat:	Coste de operación vehicular reducido en Caminos zona VII C - Entre Ríos
Observações:	Ahorro en US\$

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Coste de operación vehicular de granos.	US\$/tn	16,78	2011	P			11,98			11,98
				A						
Coste de operación vehicular de ganadería.	US\$/tn	163,00	2011	P			93,00			93,00
				A						

Résultat:	Transito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado.
Observações:	Valores totales sobre vehículos livianos, camiones livianos y pesados.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos	Vehículos	217,00	2011	P	226,00	235,00	252,00	271,00	291,00	291,00
				A						
TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos	Vehículos	68,00	2011	P	71,00	74,00	79,00	85,00	91,00	91,00
				A						

Résultat:	Competitividad comercial de la cadena de carne ovina provincial incrementada. Río Negro.
-----------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Producción para la venta.	Animales		2011	P		10.000,00				20.000,00
				A						
Diferencia entre valor bruto de producción con y sin proyecto	Millones de US\$		2011	P				177,14		270,00
				A						

Résultat:	Productividad de la producción pecuaria provincial aumentada.
-----------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Destete en bovinos.	%	61,00	2011	P A				63,00		63,00
Tasa de extracción de ovinos incrementada.	%	10,00	2011	P A				11,00		11,00

Résultat:	Pérdidas por incendios evitadas.
Suposições:	Situación maroeconómica, jurídica y política de la provincia y del país se mantiene estable o mejora. No se presentan situaciones climáticas adversas extraordinarias de manera persistente.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Pérdidas por incendios promedio. Chubut.	Pesos/Año	13.026.373,00	2011	P A		6.514.727,00				3.514.727,00
Pérdidas por incendios promedio. Río Negro.	Pesos/Año	39.182.333,00	2011	P A		27.427.633,00				27.427.633,00

Résultat:	Tiempos reducidos
------------------	-------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Chubut - Tiempo de llegada al incendio.	Minutos promedio	27,00	2011	P A		16,00				16,00
Río Negro - Bariloche. Tiempo de respuesta.	Minutos promedio	30,00	2011	P A		15,00				15,00
Río Negro - El Bolsón. Tiempo de respuesta.	Minutos promedio	30,00	2011	P A		15,00				15,00
Chubut - Tiempo de detección de focos de incendio y despacho de medios.	Minutos promedio	18,00	2011	P A		9,00				9,00

Résultat:	Rendimientos en las cadenas beneficiarias por Ha. mejorados.
Suposições:	Linea de base conformada con datos de planes de negocios de las convocatorias.
Observações:	Fuente: Informes sectoriales del INTA e Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Rendimiento de la Cadena Apícola.	kg/col/año	15,00	2011	P A					18,00	18,00
Rendimiento de la Cadena Frutícola.	tn/ha	5,50	2011	P A					6,32	6,32

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1120 - Provincial Agricultural Services Program - PROSAP III
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 24/09/2013

Rendimiento de la Cadena Láctea.	L/ha/VT/año	2.500,00	2011	P					2.900,00	2.900,00
				A						
Rendimiento de la Cadena Ganadera.	kg carne/ha/año	70,00	2011	P					80,00	80,00
				A						
Rendimiento de la Cadena Vitivinícola.	tn/ha	6,00	2011	P					7,00	7,00
				A						

Résultat:	Inversiones realizadas
Observações:	Informe de Area de Gestión de Proyectos del Sector Privado. Informes Semestrales de Progreso.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Inversiones en mejorar la finca del productor realizadas	US\$		2011	P		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
				A						
Inversiones en la consolidación de clusters agroalimentarios realizadas.	US\$		2011	P		1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00
				A						

Résultat:	Competitividad de zonas rurales en economías regionales mejorada
-----------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Agricultores a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas	Agricultores		2012	P					17.000,00	17.000,00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Administración del Programa									
Unidad Ejecutora Central	N/A					3.900.000,00	3.559.781,00		13.000.000,00
Fortalecimiento Institucional	N/A					1.200.000,00	608.272,00		4.000.000,00
Preparación de Proyectos	N/A					3.000.000,00	2.034.179,00		8.500.000,00
Infraestructura Hídrica									
Hectáreas de riego rehabilitadas en el Valle Bonaerense del Río Colorado - CORFO	Hectáreas	45.500,00			130.000,00	4.010.038,00			11.457.251,00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Rincón Catamarca.	Hectáreas	135,00	45,00		450,00	3.348.985,00			3.434.487,00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Andaluca Cerro Negro (2da etapa), Catamarca.	Hectáreas				1.146,00				6.724.094,00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Belén y Pomán, Catamarca.	Hectáreas				1.570,00		117.274,00		12.074.133,00
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza 5ta zona.	Hectáreas	4.298,00			28.650,00	5.409.205,00			36.061.368,00
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Secundaria, Canal del Norte, San Juan.	Héctareas	3.934,00			19.671,00	4.748.862,00			6.379.823,00
Infraestructura Transporte									
Kilómetros de caminos de las redes secundarias y terciarias mejorados de la Zona VII C de Entre Ríos.	Kms	9,87			49,37	12.055.338,00			40.027.617,00
Servicios Agropecuarios. Desarrollo Productivo Integral. Río Negro.									
Servicios Agropecuarios. Manejo de Recursos Naturales.									
Centrales construidas y remodeladas. Río Negro.	Centrales				3,00	1.629.256,00			5.272.330,00
Desarrollo y Competitividad. Aportes No Reembolsables y Clusters.									
Emprendimientos agroalimentarios insertados en clusters o cadenas de valor	Planes de Negocios	40,00			200,00	3.600.000,00			18.000.000,00
Clusters agroalimentarios asistidos y consolidados	Clusters	2,00			12,00	1.800.000,00			10.000.000,00
Costos Concurrentes.									
Auditorías	N/A					650.000,00	10.640,00		2.000.000,00
Seguimiento y evaluación.	N/A					300.000,00	63.650,00		2.000.000,00
Proyectos sin asignar									
Proyectos de Infraestructura a Asignar	N/A					5.000.000,00			48.536.775,00
Proyectos de Emergencia									
Proyectos de Emergencia	N/A					6.000.000,00			30.000.000,00

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1120 - Provincial Agricultural Services Program - PROSAP III
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 24/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Zonas Rurales con Acceso a Sistemas de Energía									
Kilómetros de cañerías del Gasoducto desarrollado en Areas Productivas de Entre Ríos instalados	Kilómetros de cañerías	27,90			31,00	4.667.756,00	5.792,00		5.507.025,00
Servicios Agropecuarios. Desarrollo Comercial.									
Empresas asesoradas en adecuación de productos y posicionamiento en mercados.	Empresas	90,00	125,00		300,00	3.600.000,00	2.163.461,00		11.834.300,00
Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola. Chubut.									
Plataforma agroalimentaria construida.	Plataforma				1,00	1.269.080,00			12.690.797,00
TOTAL						66.188.520,00	8.563.049,00		287.500.000,00
