




## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement		
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO	Montant Courant Approuvé:	115.700.000,00	Initial BID:	115.700.000,00
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	115.700.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	2500/OC-BR	% Décaissé:		Pari Passu:	
Étape:	Approved	Solde:	115.700.000,00	Cofinancement/Pays:	84.080.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement			Estimation Initiale:	199.780.000,00
Opération(s) Connexe(s):				Période d'Amortissement (mois):	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation				


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 24, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 24, 2011

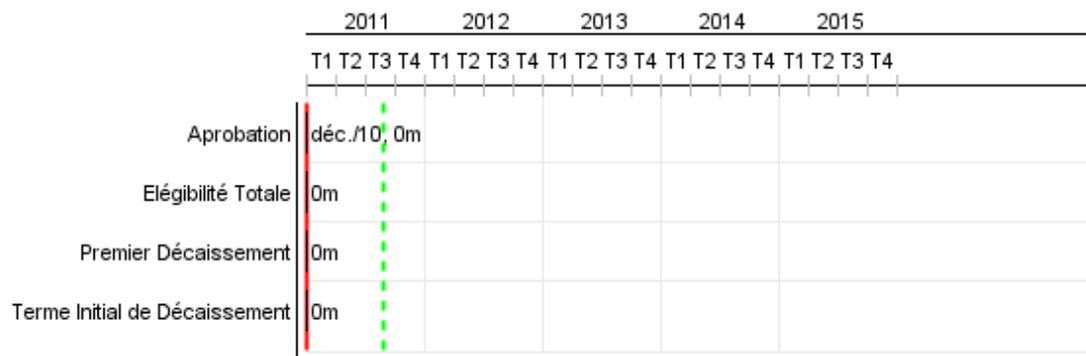

**Progrès Cumulé à 2010**

## Progrès Cumulé

**Financement BID**  
**Calendrier du Projet**



## Résultats

**Résultat:** Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12,00	2011	P	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00
				A						
Aumento volumétrico na capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê (10)6	m3		2011	P		0,80	1,30	1,80	2,80	2,80
				A						
Famílias retiradas das áreas de inundação, no trecho superior da bacia do rio Tietê	familias		2011	P	440,00	2.240,00	4.040,00	5.140,00	5.500,00	5.500,00
				A						

**Résultat:** Opções de recreação beneficiam población na área do projeto

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
População beneficiada com opções de recreação.	Miles de familias	50,00	2011	P	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
				A						

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>OBRAS</b>									
Sistemas de Macro e Micro drenagem instalados	sistemas				2,00				15.736.000,00
Aterros nas áreas de várzeas dispostos adequadamente	Miles de m3				1.150,00				19.279.000,00
Nucleos implantados	nucleos				3,00				38.550.000,00
Vias parque implantadas	km				41,00				17.620.000,00
Ciclovias implantadas	km				41,00				4.405.000,00
<b>REASSENTAMENTO</b>									
FAMILIAS REASSENTADAS	familias				500,00				56.599.000,00
<b>SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL</b>									
Matas Ciliares recompostas	km2				125,00				16.363.000,00
Plano de Gestao do Parque implantado	plano				1,00				1.498.000,00
Plan de gestión del PVT elaborado e implementado	plano				1,00				1.380.000,00
Educação ambiental realizada.	plano				15,00				2.368.000,00
<b>OUTROS</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>173.798.000,00</b>
