
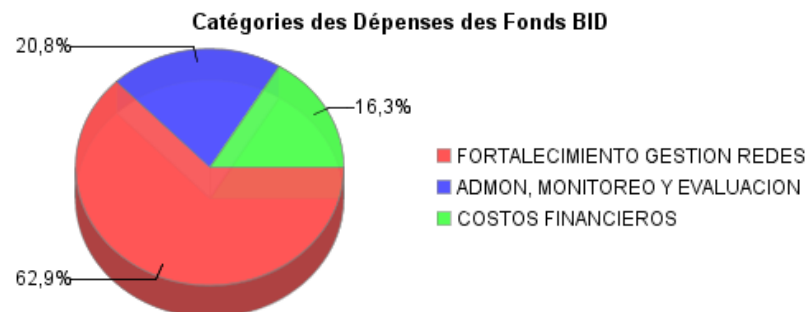
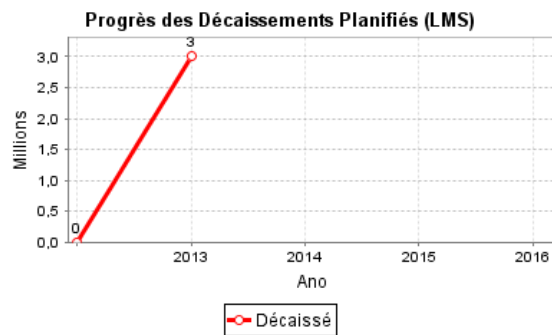



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE SALUD				
Secteur:	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2789/BL-NI	Montant Courant Approuvé:	56.200.000,00	Initial BID:	56.200.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.000.000,00	Courant BID:	56.200.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	5,34	Pari Passu:	94,00
Opération(s) Connexe(s):	NI-L1014, RG-P1478	Solde:	53.200.000,00	Cofinancement/Pays:	3.554.220,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	59.754.220,00
				Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 01-oct-2013 Validé par le Représentant: 04-oct-2013

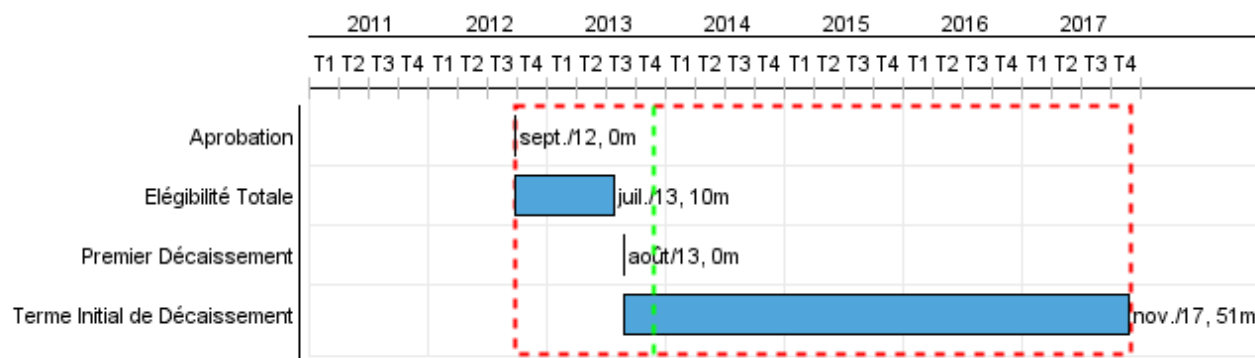

Progrès Cumulé à 2013

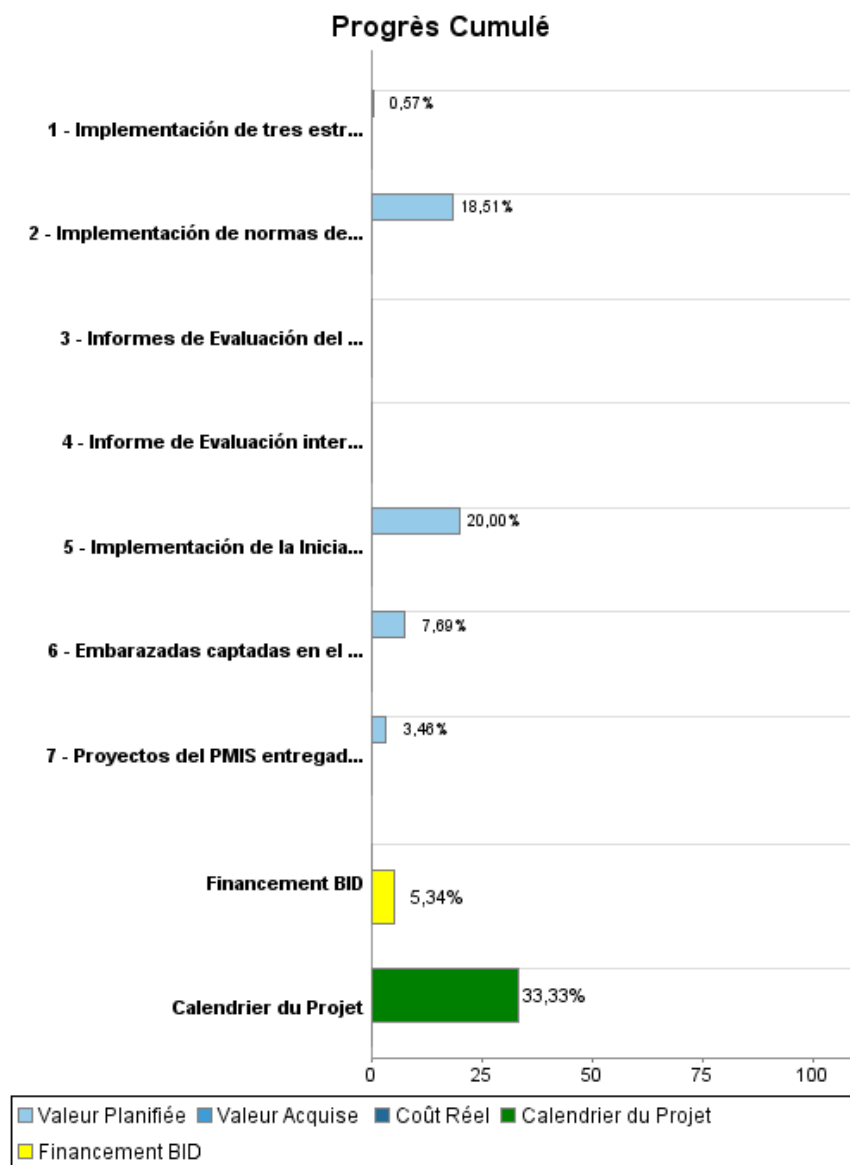

Résultats

Résultat: Acceso a servicios de salud y capacidad resolutive mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de nacimientos en Centros de Salud con cama o establecimientos de mayor resolución entre madres* de los SILAIS priorizados	%	55,00	2011	P A	75,00
Porcentaje de mujeres embarazadas del área rural en los SILAIS priorizados que egresan de la casa materna	%	20,00	2010	P A	60,00
% de Desabastecimiento (0 mes de Disponibilidad en la Red) de insumos trazadores	%	5,00	2011	P A	1,00

Résultat: Calidad de la atención mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de los expedientes auditados que reflejan la aplicación satisfactoria del protocolos correspondiente en las Unidades de los SILAIS priorizados	%	45,00	2011	P A	68,00
Incidencia de infecciones post-quirúrgicas en los tres hospitales de mayor complejidad beneficiados.	Casos por 100 egresos	15,00	2012	P A	12,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión de Redes Integradas, en SILAIS priorizados									
Implementación de tres estrategias de longitudinalidad de la atención en los sesenta y cinco municipios priorizados. (% de avance)	%				90,00	13.000,00			2.298.500,00
Implementación de normas de gestión de redes integradas en los sesenta y cinco priorizados (% de avance)	%				90,00	101.000,00			545.660,00
Implementación de la Iniciativa de Salud Intercultural en cuarenta y dos municipios priorizados.	# Municipios				42,00	50.000,00			250.000,00
Embarazadas captadas en el Programa de Maternidad Segura en los cuatro municipios rurales priorizados	# embarazadas				12.000,00	150.000,00			1.950.543,00
Componente 2. Implementación del Plan Maestro de Inversiones en SILAIS priorizados									
Proyectos del PMIS entregados en los SILAIS priorizados	# Proyectos	4,00			74,00	1.563.000,00			45.174.250,00
Componente 3. Gestión, supervisión y evaluación									
Informe de Evaluación intermedia y final.	# Informes				2,00				75.000,00
Informes de Evaluación del Programa de Maternidad Segura	# Informes				2,00				300.000,00
Costos de operación, supervisión y auditoría	N/A					100.000,00			1.295.035,00
Costos Financieros									
Costos Financieros	N/A					21.000,00			1.311.012,00
Contingencias									
Contingencias	N/A								3.000.000,00
TOTAL						1.998.000,00			56.200.000,00
