
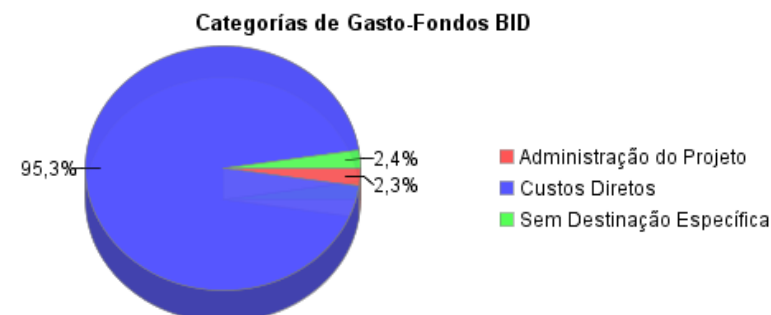
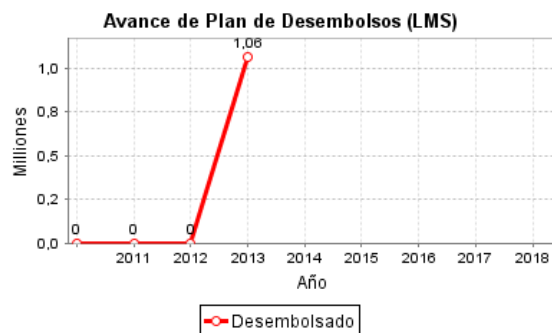



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Número(s) de Préstamo:	2370/OC-BR	Monto Aprobado Actual: 6.231.000,00	BID Original: 6.231.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 6.231.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 90,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400	Saldo: 6.231.000,00	Co-financiamiento/País: 692.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 6.923.000,00
			Período de Amortización (meses): 174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-sep-2013 Validado por Representante de País: 27-sep-2013

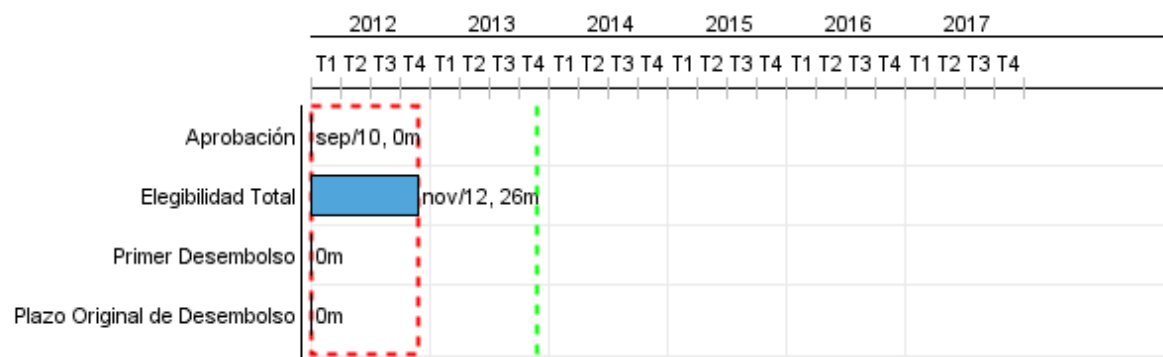

Progreso Acumulado al 2013

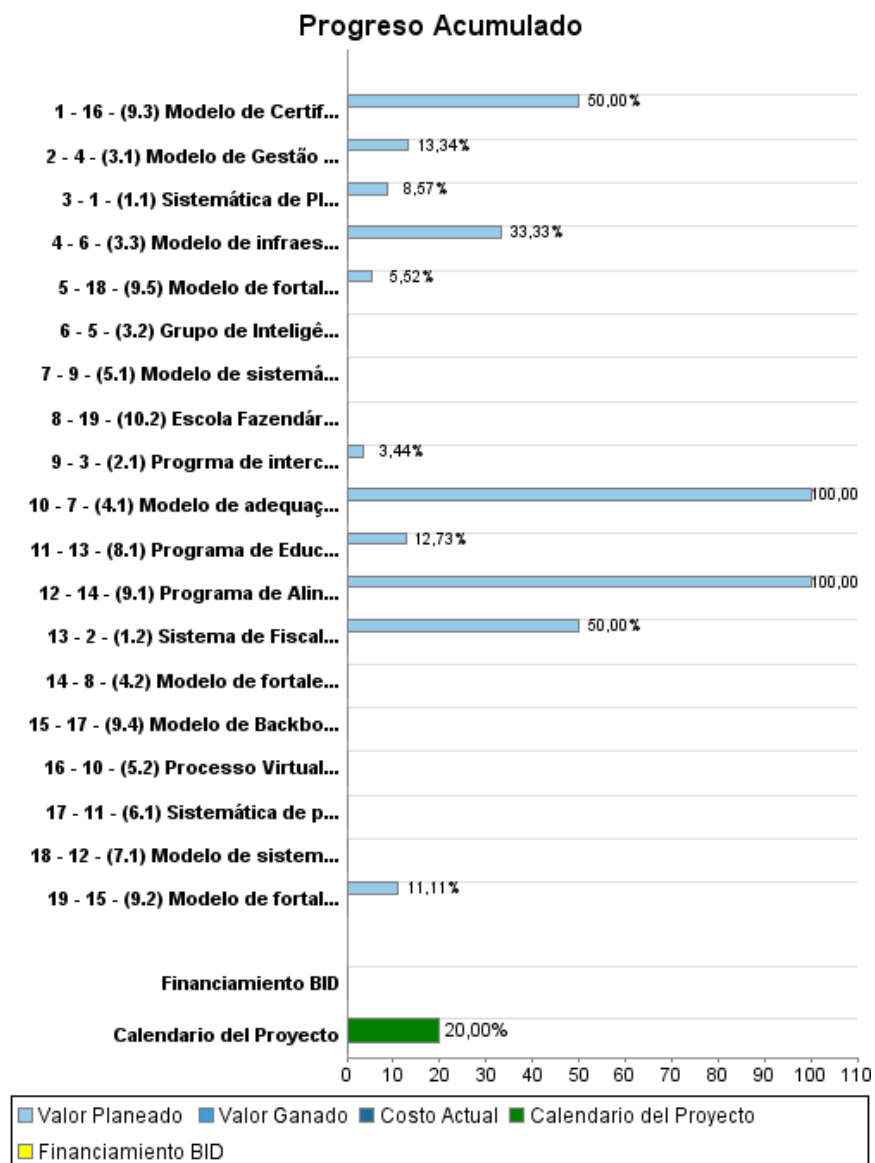

Resultados

Resultado: 1. Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Percentual de redução de custos da administração fazendária em relação à arrecadação própria.	%	5,75	2008	P A					5,11	5,11	5,11

Resultado: 2. Disseminação de conhecimentos e boas prática

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Número de boas práticas incorporadas	Número de boas práticas		2008	P A		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Resultado: 3. Aumento do número de veículos fiscalizados nos Postos Fiscais de Candeias, Extrema e Vilhena

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Percentual de veículos fiscalizados nos postos fiscais por dia	%		2008	P A				3,00	6,00		1,00

Resultado: 4. Incremento do nível de arrecadação do ICMS

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Percentual de incremento real de arrecadação ao ano	%	0,70	2008	P A				0,50	0,75	1,00	3,00

Resultado: 5. Redução do tempo médio de concessão de inscrições especiais

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Registro de empresas especiais	Dias	60,00	2008	P A		30,00				3,00	3,00

Resultado: 6. Redução do tempo médio de auditoria nas empresas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Auditoria nas empresas	Meses	8,00	2008	P A		4,00		4,00			4,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernización de la Administración Tributaria
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2013

Resultado: 7. Aumento percentual do volume de recuperação de créditos da dívida ativa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Percentual de recuperação de crédito da dívida ativa em relação ao estoque	%	0,83	2008	P A		1,23			1,00	1,20	1,20

Resultado: 8. Contratos da dívida pública do Estado controlados pela nova sistemática de programação financeira orçamentária, contábil e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Percentual de contratos da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado	%		2008	P A					40,00	60,00	60,00

Resultado: 9. Redução da taxa de crescimento de reclamações registradas em pedidos de serviço de TI

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Taxa de crescimento de reclamações (Ano vigente/Ano anterior)	%	112,00	2008	P A		4,00					

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA									
1 - (1.1) Sistemática de Planejamento, Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação implantado em todas as unidades da SEFIN - Modelo (Secretaria de Estado de Finanças)	Modelo				1,00	62.048,00			724.095,00
2 - (1.2) Sistema de Fiscalização planejado com base em Estudos Econômicos Fiscais implementado.	Modelo				1,00	19.078,00			38.155,00
3 - (2.1) Progrma de intercâmbio de troca de experiências e inovação estadual implantado	Gobiernos				1,00	11.187,00			324.750,00
Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
4 - (3.1) Modelo de Gestão Fiscal de Combate à Fraude e à Sonegação fiscal implantado (diagnóstico da gestão fiscal, metodologia, processo de trabalhos, sistemas integrados e informatizados, treinamento e indicadores)	Sistemas				1,00	66.743,00			500.228,00
5 - (3.2) Grupo de Inteligência Fiscal para o combate ao crime tributário estruturado funcionando	Grupo				1,00				92.308,00
6 - (3.3) Modelo de infraestrutura dos Postos Fiscais de Vilhena, Extrema e Candeias modernizado	Postos	1,00			2,00	402.667,00			1.208.000,00
7 - (4.1) Modelo de adequação à metodologia do Cadastro Nacional Sincronizado/REDESIM implementado com o aperfeiçoamento da infraestrutura da Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER)	Modelo	1,00			1,00	165.000,00			165.000,00
8 - (4.2) Modelo de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital implantado	Modelo				1,00				11.400,00
9 - (5.1) Modelo de sistemática de recuperação de crédito modernizado (metodologia, processos de trabalhos e sistemas informatizados)	modelo				1,00				79.864,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernización de la Administración Tributaria
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
10 - (5.2) Processo Virtual de Execução da Dívida Ativa integrado com a Secretaria de Finanças do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado implantado na Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado e .	Processo				1,00				134.200,00
Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO									
11 - (6.1) Sistemática de programação financeira, orçamentária e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO implantada.	Sistemas				1,00				108.577,00
12 - (7.1) Modelo de sistemática de monitoramento e controle interno da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) implementado (metodologia, normatização, processos de trabalho, instrumentos, equipamentos e capacitação)	Modelo				1,00				13.423,00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS									
13 - (8.1) Programa de Educação Fiscal consolidado	Programa				1,00	18.750,00			147.241,00
14 - (9.1) Programa de Alinhamento Tecnológico da SEFIN	Unidade	1,00			1,00	97.600,00			97.600,00
15 - (9.2) Modelo de fortalecimento da gestão de banco de dados e sistemas implementado (migração para a Plataforma Java/Oracle e adoção da Metodologia de Desenvolvimento em nível equivalente a CMMI)	Modelo				1,00	75.000,00			675.000,00
16 - (9.3) Modelo de Certificação Digital para servidores internos e para contribuintes implantado	Modelo				1,00	149.000,00			298.000,00
17 - (9.4) Modelo de Backbone da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) estruturado para tecnologia de fibra óptica.	Modelo				1,00				
18 - (9.5) Modelo de fortalecimento do ambiente de segurança da base de dados e dos equipamentos SEFIN implantado (sala cofre implantada)	Modelo				1,00	101.000,00			1.830.775,00
19 - (10.2) Escola Fazendária implantada	Escola				1,00				180.384,00
Outros									
Administração	N/A					28.600,00			143.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernización de la Administración Tributaria
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Imprevistos	N/A								151.000,00
TOTAL						1.196.673,00			6.923.000,00
