



Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de mejoramiento de la calidad y expansión de cobertura de la educación	Loan Number:	2933/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaria de Estadual de Educação do Pa ra		
Team Leader:	Perez Alfaro,Marcelo A.	Sector/Subsector:	PRIMARY EDUCATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO PARA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1327	\$200,810,000.00	\$200,810,000.00	\$150,650,000.00	\$0.00	\$351,460,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1327	\$200,810,000.00	\$22,920,000.00	11.41%	\$177,890,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

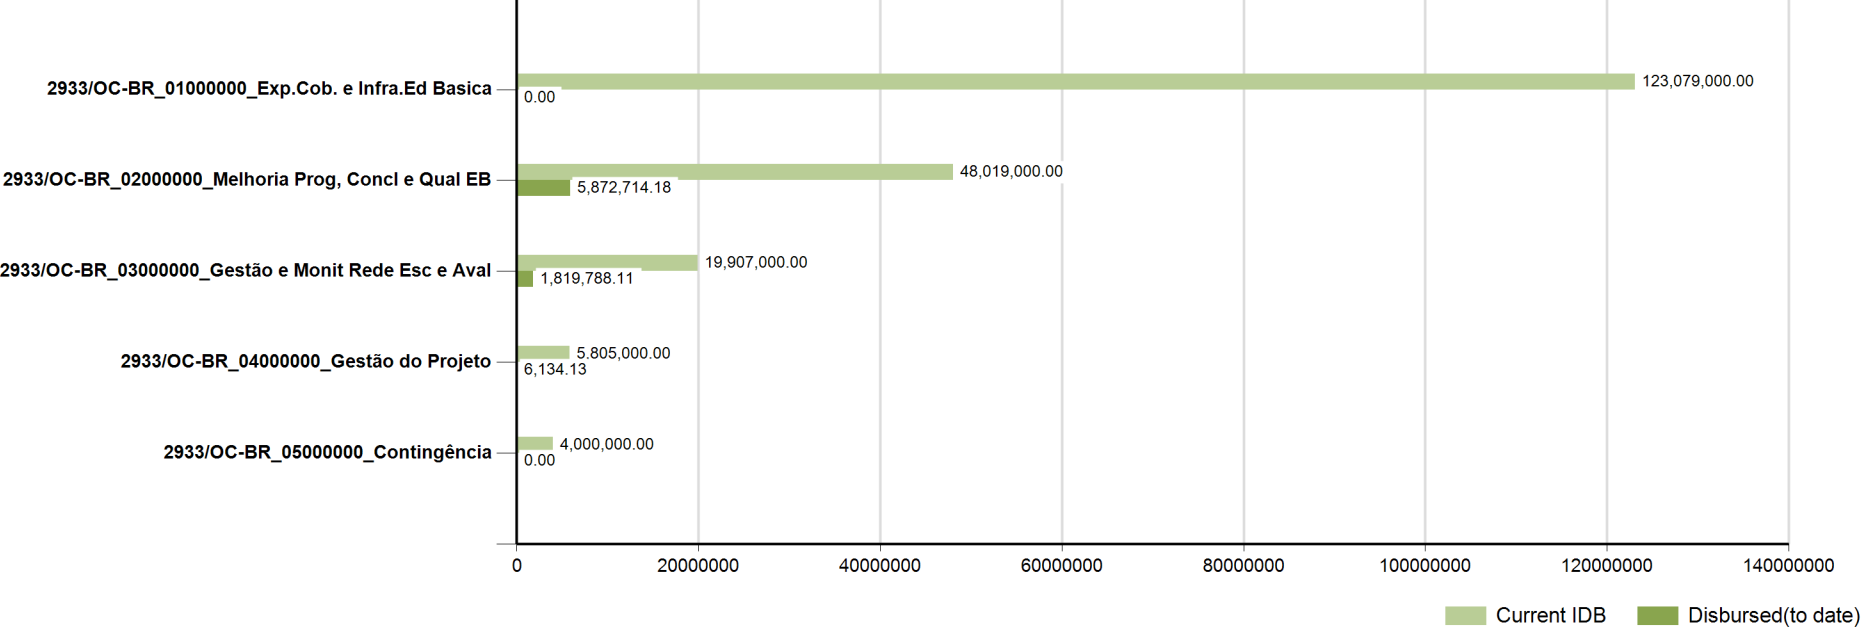

1.3 C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - matéria português		%	13.00	2013	Prova Brasil (MEC/INEP)		P	0.00	19.00		23.00		23.00
							P(a)	0.00	19.00		23.00		23.00
							A	0.00					
1.4 C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - matéria português		%	13.00	2013	Prova Brasil (MEC/INEP).		P	0.00	19.00	0.00	23.00		23.00
							P(a)	0.00	19.00	0.00	23.00		23.00
							A	0.00					
1.6 C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do ensino fundamental - matéria matemática.		%	6.00	2013	Prova Brasil (MEC/INEP)		P	0.00	8.00	0.00	10.00		10.00
							P(a)	0.00	8.00	0.00	10.00		10.00
							A	0.00					
1.7 C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do ensino médio - matéria matemática.		%	3.00	2013	Prova Brasil (MEC/INEP)		P	0.00	6.00	0.00	8.00		8.00
							P(a)	0.00	6.00	0.00	8.00		8.00
							A	0.00					
1.8 C2: Taxa de distorção idade-grau para os anos finais do Ensino Fundamental		%	45.20	2013	MEC/INEP	Soment e Rede Estadual	P	40.00	38.00	36.00	34.00	34.00	34.00
							P(a)	40.00	43.20	41.20	39.20	39.20	39.20
							A	45.20					
1.9 C2: Taxa de distorção idade-grau para os anos finais do Ensino médio		%	58.00	2013	MEC/INEP		P	56.00	53.00	51.00	49.00	49.00	49.00
							P(a)	56.00	53.00	51.00	49.00	49.00	49.00
							A	58.00					
1.10 C2: Taxa de finalização do Ensino Fundamental e Ensino Médio para estudantes com pelo menos 2 anos de distorção idade-grau.		%	0.00	2013	Registros administrativos da SEDUC e do Programa de aceleração		P						0.00
							P(a)						0.00
							A						
1.11 C2: Taxa de aprovação dos alunos do primeiro ano do ensino médio participantes do programa de reforço escolar.		%	0.00	2013	Registros administrativos da SEDUC e do Programa de reforço		P						0.00
							P(a)						0.00
							A						

1.12 C2: Jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio		%	33.40	2013	INEP/base entrevistas IBGE		P	32.00	34.00	35.00	36.00	36.00	36.00
							P(a)	32.00	34.00	35.00	36.00	36.00	36.00
							A	33.40					
1.14 C2: IDEB (Índice de Educação Brasileira) para Ensino Médio		Índice	2.70	2013	INEP		P	0.00	3.50	0.00	4.00	0.00	4.00
							P(a)	0.00	3.50	0.00	4.00	0.00	4.00
							A	0.00					
1.15 C3: Escolas promovidas de nível no Sistema de gestão escolar certificadas		%	0.00	2013	Registros administrativos da SEDUC.		P						20.00
							P(a)						20.00
							A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1: Expansão da Cobertura e Melhoria da infraestrutura da educação básica e profissional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 1: Novas Unidades de Ensino Médio e EP em funcionamento	Unidades novas EM e EP	P	12.00	32.00	P	15,846,000.00	101,210,000.00
		P(a)	12.00	32.00	P(a)	15,846,000.00	101,210,000.00
		A	9.00	9.00	A	23,963,547.50	23,963,547.50
Produto 2: Unidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio ampliadas e reformadas em funcionamento.	Unidades reformadas EF e EM	P	70.00	358.00	P		99,149,000.00
		P(a)	70.00	358.00	P(a)		99,149,000.00
		A	21.00	21.00	A	42,050,915.33	42,050,915.33
Produto 3: Sistema Estadual de ensino médio por tecnologia em funcionamento	Sistema	P		1.00	P		18,384,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		18,384,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
C2: Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 4: Estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes do Programa de aceleração de aprendizagem.	Estudantes	P	6,000.00	110,000.00	P	9,476,000.00	41,828,000.00
		P(a)	6,000.00	110,000.00	P(a)	9,476,000.00	41,828,000.00
		A	2,330.00	2,330.00	A	5,877,890.00	5,877,890.00
Produto 5: Estudantes do Ensino Médio participantes das atividades de reforço escolar.	Estudantes	P		90,000.00	P		4,882,000.00
		P(a)		90,000.00	P(a)		4,882,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 6: Escolas de Ensino Médio participantes do programa de melhoramento de desempenho educativo (Jovens do Futuro).	Escolas	P	469.00	557.00	P	2,297,000.00	20,738,000.00
		P(a)	469.00	557.00	P(a)	2,297,000.00	20,738,000.00
		A	456.00		A	2,746,860.00	2,746,860.00
Produto 7: Municípios participantes do programa nacional de alfabetização inicial e matemáticas básicas.	Municípios	P	120.00	144.00	P	357,000.00	2,231,000.00
		P(a)	120.00	144.00	P(a)	357,000.00	2,231,000.00
		A	142.00	142.00	A	9,679.00	9,679.00
Produto 8: Alunos beneficiários do programa de formação em habilidades socioemocionais no Ensino Médio e EP.	Estudantes	P		38,000.00	P		7,993,000.00
		P(a)		38,000.00	P(a)		7,993,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 9: Professores contratados pelo estado através do novo processo de concurso participantes da capacitação inicial e do sistema coaching durante o período probatório.	Professores	P		2,000.00	P		3,918,000.00
		P(a)		2,000.00	P(a)		3,918,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 10: Professores efetivos do Ensino Fundamental e Ensino Médio capacitados por meio do Centro de Formação	Professores	P		21,000.00	P		3,677,000.00
		P(a)		21,000.00	P(a)		3,677,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
C3: Gestão e monitoramento da rede escolar e avaliação		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 11: Escolas que utilizam o sistema de gestão integrada da SEDUC	Escolas	P		760.00	P		350,000.00
		P(a)		760.00	P(a)		350,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 12: Unidades Regionais da SEDUC que utilizam o sistema de gestão integrada da SEDUC	Unidades Regionais	P		32.00	P		8,511,000.00
		P(a)		32.00	P(a)		8,511,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Produto 13: Escolas da rede estadual que possuem pelo menos 20 alunos participantes da prova SISPAE.	Escolas	P	827.00	873.00	P	1,314,000.00	8,061,000.00
		P(a)	827.00	873.00	P(a)	1,314,000.00	8,061,000.00
		A	827.00	827.00	A	880,050.00	880,050.00
Produto 14: Municípios conveniados com a SEDUC para a prova SISPAE registrados	Municípios	P	54.00	144.00	P	2,669,000.00	16,366,000.00
		P(a)	54.00	144.00	P(a)	2,669,000.00	16,366,000.00
		A	142.00	142.00	A	1,786,770.00	1,786,770.00
Produto 15: Desenho de novo processo de seleccao de diretores e vice-diretores e disponivel para sua aplicacao	Escolas	P		750.00	P		25,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		25,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 16: Gestores escolares e de UREs e USEs registrados no Nucleo de Gestao e da Escola do Governo capacitados.	Gestores	P		5,000.00	P		772,000.00
		P(a)		5,000.00	P(a)		772,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
C3A: Desenho e implementação das avaliações dos processos e impactos							
C4: Gestão do Projeto e Avaliação do Projeto							
C5: Imprevistos							

Other Cost		2014	Cost
Gestão do Projeto/ Avaliação do Projeto e Desenho e implementação das avaliações dos processos e impactos.	P	\$471,000.00	\$6,965,000.00
	P(a)	\$471,000.00	\$6,965,000.00
	A	\$300,166.58	\$300,166.58
Contingência	P		\$6,400,000.00
	P(a)		\$6,400,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$32,430,000.00	\$351,460,000.00
	P(a)	\$32,430,000.00	\$286,618,070.48
	A	\$77,615,878.41	\$77,615,878.41

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	Produto 10: Professores efetivos do Ensino Fundamental e Ensino Médio capacitados por meio do Centro de Formação	Modify Output name	Dar clareza ao texto.	4/1/2015	4/1/2015
Resultado	C2: Taxa de distorção idade-grau para os anos finais do Ensino Fundamental	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Baseline atualizada para 2013, substituindo 2011, para estar mais próximo da data de assinatura do Contrato de Empréstimo: dezembro de 2013	4/1/2015	4/1/2015
Resultado	Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados Relacionados aos componentes 1, 2 e 3	Modify Statement	Não houve mudança alguma - trata-se de um erro do sistema a exigência de incluir a presente nota.	4/1/2015	4/1/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
