



Operation Number: **NI-L1068**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/8/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/09/2015**
Division Chief validation date: **04/10/2015**
Country Representative validation date: **04/13/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Integrated Health Care Networks	Loan Number:	2789/BL-NI,2789/BL-NI-1,2789/BL-NI-2
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD ,MINISTERIO DE SALUD ,MINISTERIO DE SALUD		
Team Leader:	Sanchez-Monin,Emmanuelle	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	NICARAGUA
Borrower:	REPUBLICA DE NICARAGUA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
NI-L1068	\$56,200,000.00	\$56,200,000.00	\$3,554,220.00	\$0.00	\$59,754,220.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
NI-L1068	\$56,200,000.00	\$22,650,000.00	40.30%	\$33,550,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	All conditions established in Action Plan have been met.

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

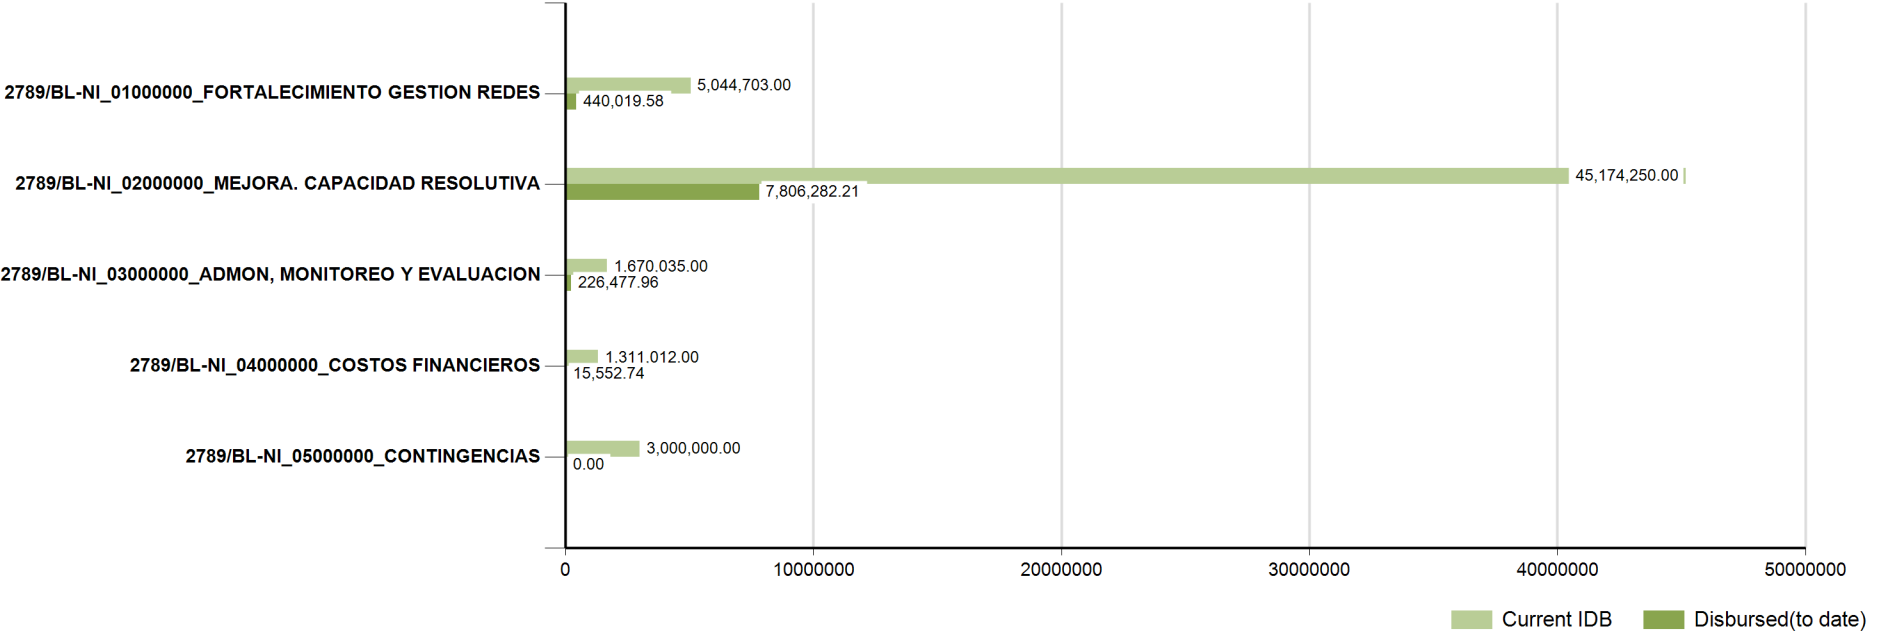

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejorar el acceso a servicios de calidad y por ende el estado de salud, haciendo más efectivo el derecho a la salud.							
Observation:	Los indicadores capturan cambios producto de una mayor prevención y atención primaria, de un mayor uso de servicios en especial de promoción, prevención y en el primer nivel de atención. Esos cambios corresponden a la disminución de situaciones de riesgo							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Tasa de nacimientos en adolescentes en los SILAIS priorizados		%	28.50	2013		La meta se ha estimado a partir de proyectar cambios de amplitud del 1,5 la tasa de reducción histórica que ha observado el indicador de nacimientos entre adolescentes en los últimos 10 años (con datos disponibles, 1.483%).	P	22.00
							P(a)	22.00
							A	0.00
1.2 Tasa de hospitalización por diarrea en menores* de cinco años en los SILAIS priorizados (por 1,000 menores de 5 años y medida según residencia habitual del niño egresado).		tasa de hospitalización	7.80	2011		La tasa promedio de los años 2008-2011 ha sido de 7,8 por 1,000 menores de cinco años (residentes del respectivo municipio). Se propone una reducción en los cuatro años de 18 por ciento, llegando a 6,4 por 1,000	P	6.40
							P(a)	6.40
							A	0.00

1.3 Tasa de egresos hospitalarios en pacientes hipertensos en los SILAIS priorizados.		tasa de egresos	10.00	2011	9 por 10,000 habitantes	El indicador debe presentar al cabo de cinco años una disminución al mejorar el manejo de pacientes crónicos en sus comunidades y la red primaria, aunque en los primeros uno a dos años, la captación de pacientes no diagnosticados en las comunidades podría	P	9.00
							P(a)	9.00
							A	0.00
1.4 Tasa de egresos hospitalarios en pacientes diabéticos en los SILAIS priorizados.		tasa de egresos	11.00	2011	10 por 10,000 habitantes	El indicador debe presentar al cabo de cinco años una disminución al mejorar el manejo de pacientes crónicos en sus comunidades y la red primaria, aunque en los primeros uno a dos años, la captación de pacientes no diagnosticados en las comunidades podría	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	0.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Acceso a servicios de salud y capacidad resolutiva mejorada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Porcentaje de nacimientos en Centros de Salud con cama o establecimientos de mayor resolución entre madres* de los SILAIS priorizados		%	55.00	2011	Indicador rutinario del MINSA.	Indicador de uso que supone mejoría en acceso (y demanda). El indicador reportado es para los SILAIS únicamente y fue reportado por el MINSA	P	75.00
							P(a)	75.00
							A	0.00
1.2 Porcentaje de mujeres embarazadas del área rural en los SILAIS priorizados que egresan de la casa materna		%	20.00	2010	Reporte del MINSA	Este indicador NO es de recopilación sistemática, pero el MINSA impulsa una estrategia de extensión de las casas maternas para mejorar el acceso al parto institucional en zonas dispersas por lo que se compromete a proveer la información necesaria para el	P	60.00
							P(a)	60.00
							A	0.00

1.3 % de Desabastecimiento (0 mes de Disponibilidad en la Red) de insumos trazadores		%	5.00	2011	SIGLIM	En Centros de Salud y unidades de mayor resolución de los SILAIS priorizados. Fórmula: (Códigos con Cobertura=0 x 100)/(Códigos Seleccionados). Insumos Trazadores COE: anticonvulsivos, antibióticos, oxitócicos: Hidralazina amp 5 mg, Sulfato de Magnesio, O	P	1.00
							P(a)	1.00
							A	0.00

Outcome:

2 Calidad de la atención mejorada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Porcentaje de los expedientes auditados que reflejan la aplicación satisfactoria del protocolos correspondiente en las Unidades de los SILAIS priorizados		%	45.00	2011	Informes de auditoría del MINSA	La línea de base proviene de la auditoría de desempeño del 2011, dato de los SILAIS priorizados.	P	68.00
							P(a)	68.00
							A	0.00

2.2 Incidencia de infecciones post-quirúrgicas en los tres hospitales de mayor complejidad beneficiados.						Este indicado	P	12.00
						r NO	P(a)	12.00
						está	A	0.00
						siendo analizado sistemáticamente en la actualidad. Se indica una línea de base por exigirla el sistema, pero la misma será construida en 2013 con los datos de 2012 y se espera reducción de 10% sobre la línea de base a los 2.5 años		
		Casos por 100 egresos	15.00	2012	Análisis secundario de datos del MINSA			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión de Redes Integradas, en SILAIS priorizados		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Implementación de tres estrategias de longitudinalidad de la atención en los sesenta y cinco municipios priorizados. (% de avance)	%	P	20.00	235.00	P	580,000.00	2,298,500.00
		P(a)	20.00	204.50	P(a)	95,000.00	2,868,840.00
		A	19.50	19.50	A	665,340.00	665,340.00
Implementación de normas de gestión de redes integradas en los sesenta y cinco priorizados (% de avance)	%	P	25.00	240.00	P	120,000.00	545,660.00
		P(a)	20.00	213.00	P(a)	290,000.00	722,788.00
		A	38.00	38.00	A	467,128.00	481,391.00
Implementación de la Iniciativa de Salud Intercultural en cuarenta y dos municipios priorizados.	# Municipios	P	15.00	129.00	P	75,000.00	250,000.00
		P(a)	10.00	110.00	P(a)	50,000.00	200,493.00
		A	13.00	13.00	A	493.00	493.00
Embarazadas captadas en el Programa de Maternidad Segura en los cuatro municipios rurales priorizados	# embarazadas	P	3,000.00	12,000.00	P	450,000.00	1,950,543.00
		P(a)	2,000.00	8,340.00	P(a)	345,000.00	3,456,469.00
		A	1,840.00	1,840.00	A	1,650,926.00	1,650,926.00
Componente 2. Implementación del Plan Maestro de Inversiones en SILAIS priorizados		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Unidades Primer nivel construidas y equipadas.	# Unidades	P	16.00	42.00	P	6,059,152.45	11,242,038.25
		P(a)	12.00	42.00	P(a)	5,259,152.45	9,377,243.80
		A	16.00	19.00	A	2,749,975.00	3,418,739.00
Unidades primer nivel rehabilitadas y equipadas.	# Unidades	P	4.00	23.00	P	439,900.78	2,761,528.57
		P(a)	4.00	23.00	P(a)	439,900.78	3,348,484.79
		A	7.00	7.00	A	726,857.00	726,857.00
Hospitales Primarios construidos y equipados.	# Unidades	P	0.00	10.00	P	1,613,067.20	17,662,507.20
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	1,613,067.20	17,537,383.00
		A	0.00	0.00	A	273,078.00	273,078.00
Unidades Segundo Nivel rehabilitadas y equipadas.	# Unidades	P	0.00	4.00	P	5,658,639.70	13,008,175.98
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	4,383,701.57	15,003,391.41
		A	1.00	1.00	A	4,878,917.00	4,878,917.00
Plan anual de mantenimiento ejecutado	# plan	P	1.00	4.00	P	37,959.66	3,554,220.01
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	37,959.66	3,554,220.01
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Planes Ambientales gestionados en unidades de salud	# plan	P	3.00	74.00	P	150,000.00	500,000.00
		P(a)	3.00	59.00	P(a)	150,000.00	622,612.00
		A	3.00	3.00	A	272,612.00	272,612.00
Componente 3. Gestión, supervisión y evaluación							
Other Cost						2014	Cost
Costos Financieros					P	\$250,000.00	\$1,311,012.00
					P(a)	\$250,000.00	\$741,012.00
					A	\$0.00	\$5,164.00
Contingencias					P	\$0.00	\$3,000,000.00
					P(a)	\$0.00	\$0.00
					A	\$0.00	\$0.00
Costos de operación, supervisión y auditoría					P	\$250,000.00	\$1,295,035.00
					P(a)	\$200,000.00	\$1,946,283.00
					A	\$325,283.00	\$346,283.00

Informe de Evaluación intermedia y final.	P	\$15,000.00	\$75,000.00
	P(a)		\$75,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Informes de Evaluación del Programa de Maternidad Segura	P		\$300,000.00
	P(a)		\$300,000.00
	A	\$0.00	\$27,451.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$15,698,719.79	\$59,754,220.01
	P(a)	\$13,113,781.66	\$44,670,860.78
	A	\$12,010,609.00	\$12,747,251.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
