



Operation Number: **EC-L1076**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/24/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/24/2015**
Division Chief validation date: **04/24/2015**
Country Representative validation date: **04/24/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support the Extension of Social Protection and Comprehensive Health Care	Loan Number:	2431/OC-EC
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		
Team Leader:	O'Connell,Lesley Deanne	Sector/Subsector:	SA
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1076	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$102,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1076	\$100,000,000.00	\$30,467,178.31	30.47%	\$69,532,821.69


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

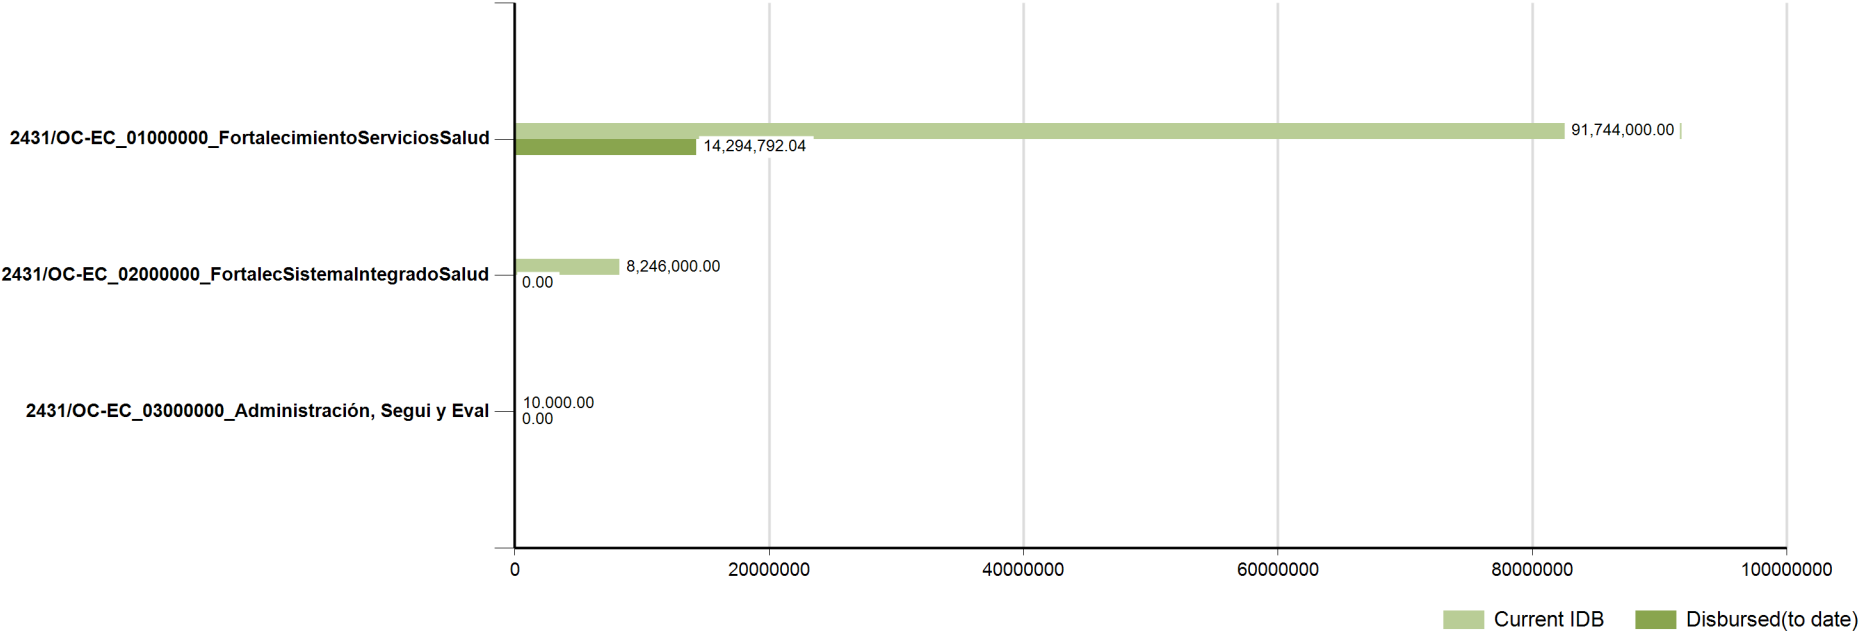

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mortalidad infantil (menos de 1 año) por 1000 nacidos vivos reducida.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Reducción del índice de mortalidad infantil.		Indice de Mortalidad Infantil	21.00	2009	Estimado de OMS basado en registros de nacionales.		P	18.00
							P(a)	18.00
							A	0.00
Impact:	2 Hospitalizaciones por condiciones respiratorias agudas, reducidas.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Reducción de hospitalizaciones por condiciones respiratorias agudas.		% de hospitalizaciones	20.40	2009	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Registros de egresos hospitalarios.		P	17.30
							P(a)	17.30
							A	0.00
Impact:	3 Prevalencia de desnutrición entre niños de 1 y 5 años reducida.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Reducción en la prevalencia de desnutrición de niños entre 1 y 5 años.		prevalencia de desnutrición	31.00	2009	Encuesta de Condiciones de Vida.		P	28.00
							P(a)	28.00
							A	0.00

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Oferta, cobertura y calidad de los servicios de salud mejoradas mediante fortalecimiento de la capacidad resolutive y articulación de las unidades operativas.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Establecimientos (Unidades Operativas) de Salud Construidas y Equipadas de acuerdo a los nuevos Modelos Arquitectonicos y Plan Medico Funcional.		Unidades Operativas	0.00	2009	Informes de Licenciamiento del Ministerio de Salud Pública (MSP)	Refiere al número absoluto de las Unidades Operativas de Salud licenciadas.	P	343.00
							P(a)	50.00
							A	0.00

1.2 Cobertura (atenciones de prevención) de niños menores a 1 año aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		%	0.00	1999	Sistema de Común de Informació n.		P	
							P(a)	
							A	
1.3 Cobertura (controles) de mujeres embarazadas aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		% de embarazadas	61.00	2009	Sistema Común de Informació n.	Se actualizará el indicador de la línea de base con el arranque del préstamo. El % refiere al % de mujeres embarazadas que realicen sus controles prenatales.	P	80.00
							P(a)	80.00
							A	0.00
1.4 Cobertura (atenciones de prevención) niños entre 1 a 5 años aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		% niños 1 a 5 años	34.00	2009	Sistema Común de Informació n.	Se actualizará el indicador de la línea de base con el arranque del préstamo. El % refiere al % de niños entre 1 a 5 años que realicen sus controles de niño sano.	P	60.00
							P(a)	60.00
							A	0.00
1.5 Establecimientos (Unidades Operativas) de Salud con cartera de servicio ampliada en base al Plan Médico Funcional.		Unidades Operativas	0.00	2009	Sistema Común de Informació n.	El Número refiere al número de Unidades operativas con oferta de servicios ampliados.	P	90.00
							P(a)	53.00
							A	0.00

1.6 Cobertura de parto institucional público aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		% de partos	52.00	2009	Instituto Nacional de Estadística y Censos.	El % refiere al % de partos que se realicen en instituciones públicos.	P	62.00
							P(a)	62.00
							A	0.00
1.7 Cobertura de vacunas (tercera dosis pentavalente en el primer año de vida) aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		Número de dosis	53,985.00	2009	Sistema Integrado de Salud.		P	60,942.00
							P(a)	60,942.00
							A	0.00
1.8 Parroquias de "alto riesgo" intervenidas por el Programa.		Número de parroquias	0.00	2009	Sistema de Monitoreo y Seguimiento al Plan de Inversiones .	El Número refiere al número de de parroquias de alto riesgo que se intervino el Programa.	P	124.00
							P(a)	82.00
							A	0.00

1.9 Personas (todas, indígenas, afrodescendientes) que se benefician de un paquete básico de servicios de salud, en los territorios a ser intervenidas por el programa.	 RF	Personas	0.00	2011	Sistema de monitoreo y evaluación del programa.	El Programa beneficiará a más de 900571 personas. Se calcula el número de beneficiarios de un paquete básico de servicios de salud basada en la estimación de población asignada a las unidades operativas prioritizadas para las intervenciones del programa.	P	900,571.00
							P(a)	1,795,104.00
							A	0.00

Outcome:

2 Sistema Integrado de Salud que comprende un sistema de información médica y de gestión del MSP fortalecido.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
2.1 Población con atenciones registradas con la Historia Clínica sistematizada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		Número de personas	0.00	2009	Sistema Integrado de Salud.	El Número refiere al número de personas que están registradas en la Historia Clínica sistematizada.	P(a)	451,758.00
							A	0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Fortalecimiento de los Servicios de Salud del MSP.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Unidades Operativas del segundo nivel de atención repotenciadas y equipadas.	Unidades Operativas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	2,464,000.00	5,784,240.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Establecimientos (Unidades Operativas), Puestos de Salud y Centros de Salud del primer nivel de atención construidas, rehabilitadas y equipadas.	Unidades Operativas	P	31.00	76.00	P	39,648,000.00	82,399,222.22
		P(a)	4.00	93.00	P(a)	7,786,000.00	69,188,320.81
		A	4.00	4.00	A	4,005,447.84	6,418,647.84
Espacios de estancia temporal culturalmente adecuados repotenciados y equipados.	Espacios	P	3.00	3.00	P	1,000,000.00	1,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Herramientas de Gestión Estratégica de Infraestructura Sanitaria desarrolladas e implementadas.	Herramientas de gestión	P	1.00	3.00	P	865,143.00	1,079,819.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	143,000.00	219,315.73
		A	3.00	3.00	A	53,289.00	57,889.00
Distritos (MAIS-Gestion Red) implementados y operando. (EOP no es acumulativo)	Numero de pilotos	P	4.00	10.00	P	491,000.00	1,068,000.00
		P(a)	4.00	8.00	P(a)	532,000.00	2,265,982.65
		A	4.00	4.00	A	139,315.25	251,315.25
Salud Intercultural Fortalecida.	Gestion	P	1.00	3.00	P	305,000.00	1,305,000.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	15,000.00	286,200.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Talento Humano en Salud Formados en Atención Primaria en Salud (TAPS con aporte local y MFC) y Auditores Médicos Capacitados. (EOP no es acumulativo)	Personal Capacitado/formado	P	693.00	1,633.00	P	1,927,166.00	4,887,498.00
		P(a)	0.00	2,650.00	P(a)	0.00	15,529,472.39
		A	822.00	822.00	A	6,841,767.65	7,829,933.65
Medios de transporte y de emergencia médica definidos, entregados y operando.	Vehículos	P	25.00	93.00	P	3,359,000.00	4,877,000.00
		P(a)	25.00	83.00	P(a)	2,464,000.00	2,483,085.00
		A	4.00	4.00	A	0.00	0.00
Equipamiento para la estrategia de nutrición entregados.	Equipos	P		530.00	P		243,050.00
		P(a)	0.00	530.00	P(a)	0.00	243,050.00
		A	0.00	530.00	A	0.00	243,050.00
Talento Humano en Salud Capacitado en APS, MAIS, Modelo de Gestión.	Personal Capacitado	P	10,000.00	25,050.00	P	420,000.00	727,202.00
		P(a)	0.00	1,743.00	P(a)	14,280.00	26,607.00
		A	743.00	743.00	A	14,280.00	26,607.00
Componente 2. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Sistema de Informacion REDACAA diseñado.	Sistema	P	1.00	3.00	P	4,051,000.00	7,188,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	530,000.00	2,199,667.41
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Distritos con sistema de referencia y contrareferencia desarrollado e implementado.	Distritos	P	0.00	4.00	P	0.00	100,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración y Evaluación.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Seguimiento y Evaluaciones realizadas.	Evaluación	P		2.00	P	450,000.00	760,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	350,000.00	460,000.00
		A	0.00	0.00	A	50,000.00	60,000.00

Other Cost		2014	Cost
Administración (incluyendo auditoría)	P	\$328,685.00	\$1,546,547.00
	P(a)	\$670,000.00	\$2,329,906.61
	A	\$492,699.00	\$1,477,191.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$52,844,994.00	\$107,181,338.22
	P(a)	\$14,968,280.00	\$75,781,731.74
	A	\$11,596,798.74	\$16,364,633.74

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
