



Operation Number: **CO-L1094**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **4/7/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/07/2016**
Division Chief validation date: **04/08/2016**
Country Representative validation date: **04/08/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to Promote Outsourced Services	Loan Number:	2886/OC-CO
Executing Agency (EA):	Ministerio de Comercio, Industria y Turi smo		
Team Leader:	Mejia Rivas,Isabel	Sector/Subsector:	EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1094	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1094	\$554,380.05	\$554,380.05	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

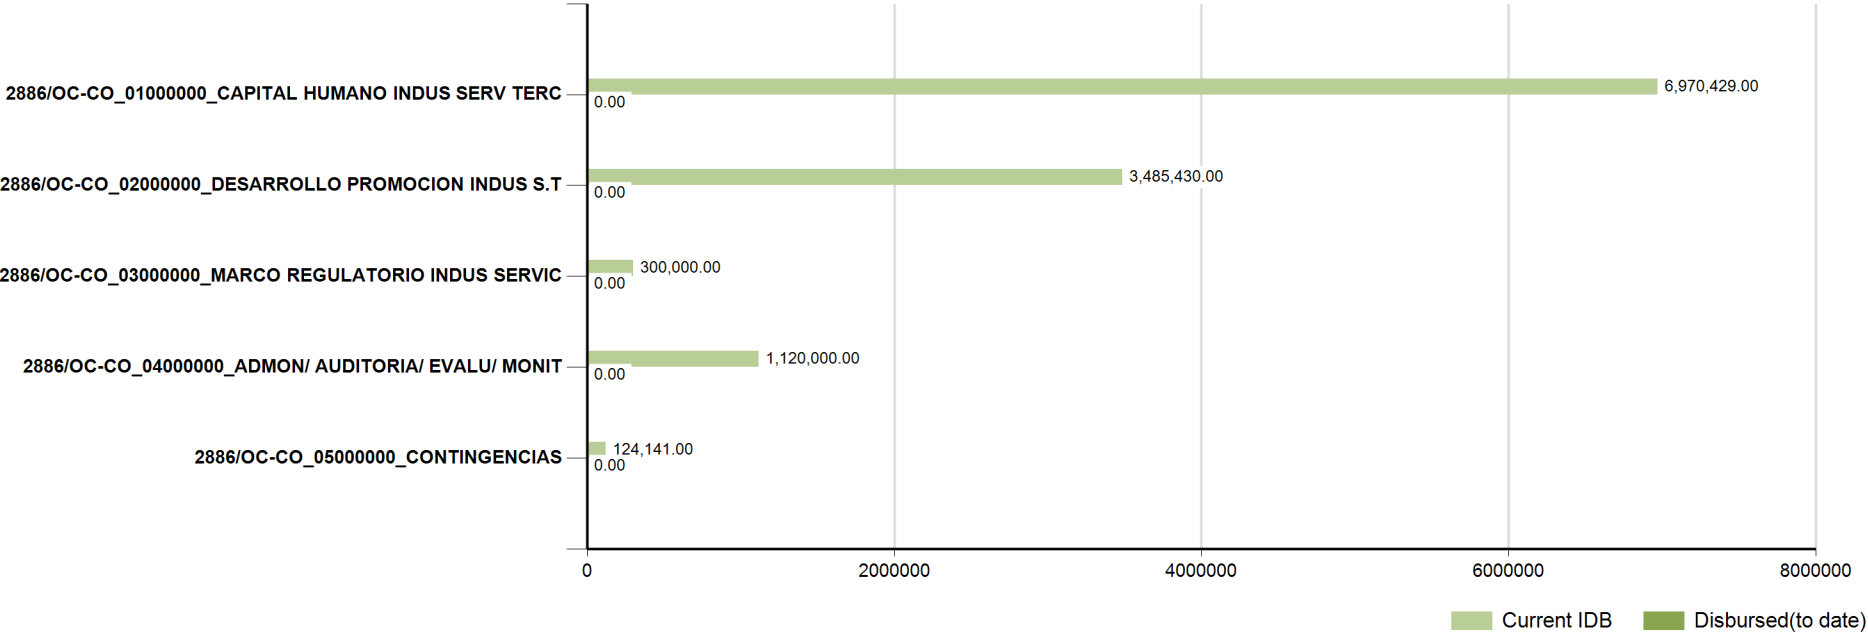

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Generación de capacidades necesarias para participación en el sector de servicios tercerizados																														
Observation:	Durante la etapa de monitoreo y evaluación del programa, se llevará a cabo un seguimiento de la distribución de los participantes atendiendo al género. El monitoreo de este componente lo realizará el PTP.																														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013					2014					2015					2016					EOP				
							P	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	P(a)	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	A	0.00	0.00	0.00							
1.1 Porcentaje de personas que asistieron a programas de Finishing Schools que consiguen empleo en el sector.		%	0.00	2012	Informe semestral elaborado por las empresas participantes tras la graduación de los estudiantes en el momento de incorporación laboral.		P	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	P(a)	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	A	0.00	0.00	0.00							
1.2 Porcentaje de avance sobre la predicción de necesidades de recurso humano identificadas previas al programa.		%	0.00	2012	Encuesta sobre necesidades actuales y futuras de recurso humano de cada empresa y posteriormente evaluar si esas necesidades fueron atendidas.		P	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	P(a)	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	A	0.00	0.00	0.00							
Outcome:	2 Internacionalización de Mipymes de Servicios Tercerizados																														
Observation:	La línea de base para el indicador 2.1 y 2.2 no está disponible																														

Outcome:	2 Internacionalización de Mipymes de Servicios Tercerizados
Observation:	La línea de base para el indicador 2.1 y 2.2 no está disponible

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
							2013	2014	2015	2016	EOP	
2.1 Incremento adicional en el periodo 2013-2015, al crecimiento promedio de las exportaciones del sector.		%	0.00	2012	Informes del PTP	La línea base estará disponible por parte del DANE a finales de 2013. Se harán mediciones intermedias de carácter anual para analizar el comportamiento del indicador.	P	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
							A	0.00	0.00	0.00		
2.2 Incremento del valor de exportaciones de las MiPymes atendidas por el programa.		%	0.00	2012	Informe de PTP como resultado del monitoreo y medición anual a las empresas beneficiarias del proyecto.	El conjunto de las empresas monitoreadas deberá exportar en el año 2015 un monto superior en 10% al monto registrado en la línea de base. La línea de base se calculará cuando las propuestas de las empresas sean presentadas para este componente.	P	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
							A	0.00	0.00	0.00		

2.3 Porcentaje de empresas atendidas por el Programa que se han certificado.		%	0.00	2012	Estadísticas propias realizadas por PTP	No existe compromiso por parte de las empresas a obtener la certificación, por lo tanto el PTP no tiene control sobre la misma.	P	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
							P(a)	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
							A	0.00	0.00	0.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Capital Humano para la Industria de Servicios Tercerizados		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Número de estudiantes graduados de programas de Finishing Schools.	Estudiantes	P	2,000.00	4,000.00	P	1,801,340.00	3,282,813.00
		P(a)	2,000.00	4,000.00	P(a)	400,000.00	3,485,216.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Número de programas curriculares finalizados.	Programas	P	50.00	103.00	P	1,801,340.00	3,282,813.00
		P(a)	53.00	103.00	P(a)	0.00	3,485,213.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Desarrollo y Promoción de Industria de Servicios Tercerizados		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Número de empresas financiadas en iniciativas relacionadas con las líneas de productividad y calidad del programa.	Empresas	P	18.00	41.00	P	2,041,635.00	3,306,175.00
		P(a)	23.00	41.00	P(a)	500,000.00	3,485,430.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	160,218.00
Número de alianzas establecidas con miembros de la diáspora.	Alianzas	P	50.00	60.00	P	424,632.00	626,703.00
		P(a)	50.00	60.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Marco normativo y clima de negocios para la industria de servicios globales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Estudios de optimización del marco normativo del sector de servicios realizados.	Estudios	P	0.00	2.00	P	0.00	300,000.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gerencia, administración y monitoreo del programa							

Other Cost		2015	Cost
Administración del programa (incluye auditorías, evaluación y monitoreo)	P	\$335,736.00	\$1,120,000.00
	P(a)	\$90,000.00	\$1,038,000.00
	A	\$42,396.00	\$194,748.00
Viajes (incluye imprevistos)	P	\$26,059.00	\$81,496.00
	P(a)	\$10,000.00	\$206,141.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$6,430,742.00	\$12,000,000.00
	P(a)	\$1,000,000.00	\$11,042,396.00
	A	\$42,396.00	\$354,966.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
