



Operation Number: **BR-L1319**  
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
 Last Update: **3/28/2016**  
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**  
 Division Chief validation date: **04/06/2016**  
 Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	PROFISCO Bahia State Fiscal Modernization and Strengthening Program	Loan Number:	2914/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE FAZENDA DE BAHIA		
Team Leader:	Bakaj,Patricia Goes	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DA BAHIA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1319	\$45,270,000.00	\$45,270,000.00	\$5,030,000.00	\$0.00	\$50,300,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1319	\$45,270,000.00	\$11,216,936.38	24.78%	\$34,053,063.62


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

### Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

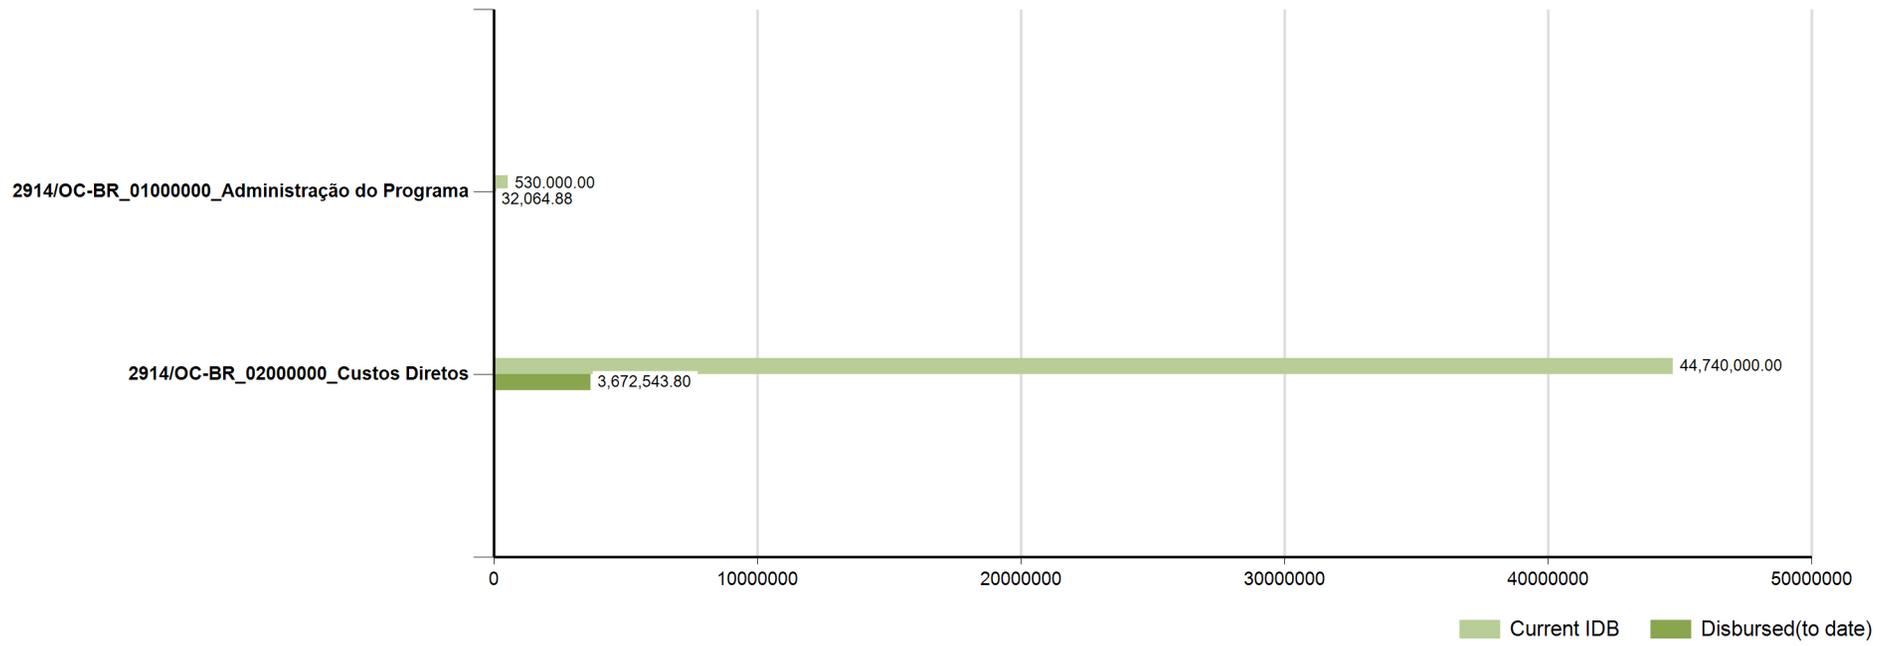

## Results Matrix

### Impacts

Impact:	1 Manter os indicadores fiscais dentro do estado dentro dos limites acordados com o Governo Federal em relação ao Programa de Ajuste Fiscal (PAF) e à Lei de Responsabilidade Fiscal (RLF).											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Relación gastos con personal / Ingresos Corrientes Netos (RCL)		%	54.00	2011	Informe de evaluación del Programa de Ajuste Fiscal del Estado de Bahía (PAF) emitido por la Secretaría del Tesoro Nacional (STN)	Fue acordado que los estados cumplirán, a lo largo de la ejecución de los proyectos PROFISCO, las metas fiscales establecidas con la Secretaría del Tesoro Nacional (STN) en el ámbito del Programa de Ajuste Fiscal de los Estados (PAF), dentro de los límite	P				54.20	54.20
	P(a)								60.00	60.00		54.20
	A							55.23	57.00			
1.2 Resultado primário		R\$ Milhões	360.00	2011	Informe de evaluación del Programa de Ajuste Fiscal del Estado de Bahía (PAF) emitido por la Secretaría del Tesoro Nacional (STN)	Fue acordado que los estados cumplirán, a lo largo de la ejecución de los proyectos PROFISCO, las metas fiscales establecidas con la Secretaría del Tesoro Nacional (STN) en el ámbito del Programa de Ajuste Fiscal de los Estados (PAF), dentro de los límite	P				720.00	720.00
	P(a)									-1,989.00		720.00
	A							1,128.00	-570.00			

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

### Outcomes

<b>Outcome:</b>	1 R1 - Aumento da arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços)
<b>Observation:</b>	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
1.1 Valor da Arrecadação do ICMS		R\$ bilhões	14.00	2012	Informe quarto trimestre LRF		P			16.20		19.60	19.60
							P(a)			20.00		19.60	19.60
							A		18.63				
<b>Outcome:</b>	2 R2 - Aumento da arrecadação do ITCD (Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação)												
<b>Observation:</b>													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
2.1 Valor da Arrecadação do ITCD		R\$ milhões	27.00	2011	Informe quarto trimestre LRF		P				35.10		35.10
							P(a)					35.10	35.10
							A			112.10			
<b>Outcome:</b>	3 R3 - Redução do tempo para obter informação da arrecadação												
<b>Observation:</b>													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
3.1 Tempo transcorrido entre o pagamento do imposto e o registro da informação no sistema de arrecadação da SEFAZ		Horas	24.00	2012	Informe gerencial sistema recaudación		P					0.50	0.50
							P(a)			15.00		30.00	0.50
							A		15.00				
<b>Outcome:</b>	4 R4 - Redução do tempo para os prazos dos processos de revisão fiscal												
<b>Observation:</b>													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
4.1 Tempo transcorrido no prazo dos processos de revisão fiscal e das inspeções		dias	45.00	2012	Informe de la Dirección de Administración Fiscal		P			30.00			30.00
							P(a)			30.00			30.00
							A						
<b>Outcome:</b>	6 R5 - Redução do custo de capacitação em temas de gestão fiscal												
<b>Observation:</b>													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
6.1 Custo médio anual de capacitação por funcionário		R\$	450.00	2012	Informe de la Universidad Corporativa del Servicio Público (UCS)	Reducción de costos en función de la ampliación del uso de la enseñanza a distancia (EAD).	P			225.00			225.00
							P(a)			225.00			225.00
							A			189.02			

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE I - Integração da Gestão Fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP		2015	EOP	
1. Projetos estratégicos incorporados ao sistema de monitoramento	Projetos estratégicos	P	2.00	6.00	P	86,411.00	259,234.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	0.00	224,649.00
		A	5.00	5.00	A	0.00	0.00
2. Processos estratégicos da SEFAZ com procedimentos mapeados e monitorados	Processos	P	0.00	8.00	P	68,352.00	256,320.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)	0.00	308,081.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3. Manual de modelagem, monitoramento e avaliação para projetos sob modalidade PPP confeccionado.	Manual de procedimento	P	0.00	1.00	P	75,356.00	263,746.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	459,218.00
		A	0.00	0.00	A	16,181.00	53,981.00
4. Contrato de gestão assinados pelas Superintendências	Contrato de gestão	P	4.00	4.00	P	233,978.00	467,957.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	233,978.00	351,351.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
5. Eventos de intercambio de experiências com as secretarias de fazenda de outros estados realizados	eventos	P	2.00	8.00	P	59,811.00	254,743.00
		P(a)	1.00	8.00	P(a)	19,811.00	158,701.00
		A	4.00	5.00	A	107,159.00	135,295.00
<b>COMPONENTE II - Administração Tributária e do Contencioso Fiscal</b>		<b>Physical Progress</b>			<b>Financial Progress</b>		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP		2015	EOP	
6. DAE (Documento de Arrecadação Estadual) único implantado	Módulo	P	0.00	1.00	P	89,340.00	335,022.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	243,216.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
7. Unidade de estudos tributários criada	Unidade de estudo	P	0.00	1.00	P	109,509.00	328,528.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	219,043.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
8. Novo modelo de fiscalização de estabelecimentos a partir das informações do SPED	Modelo	P	0.00	1.00	P	485,062.00	1,455,186.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	166,062.00	1,583,112.00
		A	0.00	0.00	A	346,896.00	608,427.00
9. Novo modelo de fiscalização do trânsito de mercadorias implantado	Modelo	P	0.00	1.00	P	2,495,943.00	4,991,885.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,113,738.00
		A	0.00	0.00	A	77,931.00	77,931.00
10. Unidade Móvel para a área de inteligência fiscal equipada	Unidade Móvel	P	0.00	1.00	P	239,844.00	479,688.00
		P(a)	0.00	479,689.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
11. Informação sobre o índice de valor agregado (IVA) para cada município disponibilizada via web	Municípios com acesso à informação	P	0.00	417.00	P	34,351.00	103,052.00
		P(a)	0.00	417.00	P(a)	20,000.00	130,565.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
12. Novo modelo de gestão do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) implantado	Modelo IPVA	P	0.00	1.00	P	175,905.00	351,810.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	60,281.00	349,795.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
13. Novo modelo de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) implantado	Modelo de ITCD	P	0.00	1.00	P	83,314.00	333,255.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	128,503.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
14. Sistema de gestão dos benefícios fiscais implantado	Systems	P	0.00	1.00	P	50,286.00	201,143.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	218,092.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

15. Sistema de cadastro de contribuintes com visão unificada do cadastro atualizado	Systems	P	0.00	1.00	P	101,564.00	304,693.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	484,486.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
16. Contribuintes beneficiados pela implantação do DT-e (Domicílio tributário eletrônico)	Contribuintes	P	3,000.00	3,000.00	P	141,688.00	283,448.00
		P(a)	1,000.00	3,000.00	P(a)	0.00	108,422.00
		A	3,000.00	3,000.00	A	52,898.00	52,898.00
17. Sistema de controle de omissos implantado	Systems	P	0.00	1.00	P	381,877.00	1,145,632.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	72,816.00	650,900.00
		A	0.00	0.00	A	71,226.00	71,226.00
18. Novo processo de cobrança administrativa implantado	Processo de Cobrança administrativa	P	0.00	1.00	P	380,219.00	1,140,657.00
		P(a)	0.00	1,060,439.00	P(a)	180,219.00	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	100,000.00	100,000.00
19. Processo administrativo tributário (PAF-e) implantado	Processo administrativo tributário (PAF-e)	P	0.00	1.00	P	436,667.00	1,310,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,524,503.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
20. Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor - NFC-e implantada	Contribuintes	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1,000.00	P(a)		344,205.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Requalificação da Infraestrutura da Administração Tributária	Unidades	P		0.00	P		0.00
		P(a)		14.00	P(a)		4,567,838.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de avaliação de risco de escritórios de contabilidade implantado	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		698,198.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Novo modelo de Gestão de Contribuintes do Simples Nacional baseado em verificações censitárias implantado	Modelo	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		299,384.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

<b>COMPONENTE III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno da Gestão Fiscal</b>		<b>Physical Progress</b>		<b>Financial Progress</b>			
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>	2015	EOP	2015	EOP		
20. Unidades financeiras da administração pública estatal e da Superintendência de Administração Financeira (SAF) operando os processos de execução financeira e orçamentária de acordo com os novos procedimentos	Unidades financeiras	P	0.00	31.00	P	417,490.00	1,113,307.00
		P(a)	0.00	695,847.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
21. Sistema integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças - FIPLAN implantado	Systems	P	0.00	1.00	P	577,576.00	2,310,481.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	2,100,395.00	2,459,935.00
		A	0.00	0.00	A	433,686.00	583,686.00
22. Prontuários de funcionários digitalizados	Prontuários de Funcionários	P	0.00	4,000.00	P	442,163.00	1,326,490.00
		P(a)	0.00	4,000.00	P(a)	0.00	432,188.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
23. Novo modelo de gestão de processos da Direção Geral implantado	Modelo de Gestão	P	0.00	1.00	P	65,014.00	195,042.00
		P(a)	0.00	195,043.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
24. Modelo de gestão da Corregedoria implantado	Modelo de Gestão	P	0.00	1.00	P	0.00	255,108.00
		P(a)	0.00	255,109.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
25. Novo modelo de auditoria governamental baseado em riscos implantado	Modelo de auditoria	P	0.00	1.00	P	0.00	283,572.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	403,255.00
		A	1.00	1.00	A	12,373.00	12,373.00

23. Requalificação da Infraestrutura da Sede SEFAZ	Unidades	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,188,622.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
<b>COMPONENTE IV - Gestão de Recursos Corporativos</b>		<b>Physical Progress</b>			<b>Financial Progress</b>		
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>	2015		EOP	2015		EOP
26. Ferramentas de comunicação implantadas, mediante a melhora da qualidade do atendimento aos contribuintes	Ferramentas	P	0.00	1.00	P	226,700.00	906,801.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	80,050.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	110,000.00
27. Ações de comunicação implementadas, a partir da melhora na relação da SEFAZ com seus recursos humanos	ações de comunicação	P	0.00	2.00	P	24,740.00	98,961.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	20,525.00	142,946.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	6,586.00
28. Sala cofre instalada	Sala cofre	P	1.00	1.00	P	3,243,723.00	6,486,121.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	2,243,723.00	4,554,465.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	1,969,682.00
29. Solução de prevenção à intrusão à rede lógica e, ferramenta de análise de vulnerabilidade	Logins aos sistemas	P	0.00	1.00	P	673,009.00	2,019,026.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	83,009.00	1,732,765.00
		A	1.00	1.00	A	122,910.00	222,910.00
30. Espaço para armazenagem da NF-e e SPED ampliado	Terabyte	P	370.00	370.00	P	4,007,955.00	10,687,879.00
		P(a)	170.00	370.00	P(a)	3,336,675.00	10,278,726.00
		A	370.00	370.00	A	1,649,998.00	1,649,998.00
31. Equipamentos para usuário finais renovados	Equipamentos usuários finais	P	0.00	1,500.00	P	425,685.00	2,554,113.00
		P(a)	0.00	1,500.00	P(a)	447,863.00	2,124,871.00
		A	0.00	0.00	A	447,863.00	447,863.00
32. Plano Estratégico de TI implantado	Plano Estratégico de TI	P	1.00	1.00	P	609,683.00	1,829,048.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	340,412.00	7,040,973.00
		A	0.00	0.00	A	379,283.00	379,283.00
33. Vagas de capacitação ofertadas	Vagas	P	0.00	700.00	P	827,349.00	3,516,234.00
		P(a)	0.00	700.00	P(a)	32,881.00	2,552,568.00
		A	0.00	0.00	A	67,211.00	262,192.00
34. Tutores e monitores acreditados, para a prática de capacitação (Educação à Distância).	Tutores e monitores	P	0.00	20.00	P	112,102.00	448,407.00
		P(a)	0.00	20.00	P(a)	32,102.00	955,178.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
35. Novos instrumentos de regulamentação dos recursos humanos da SEFAZ implementados	Instrumento Legal	P	0.00	1.00	P	316,014.00	948,043.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	58,049.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	50,000.00
36. Política de gestão do conhecimento implantada	Instrumento Legal	P	0.00	1.00	P	243,067.00	425,367.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	33,834.00	179,459.00
		A	0.00	0.00	A	43,251.00	83,251.00
<b>ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO</b>							

Other Cost		2015	Cost
Gestão do Projeto	P	\$195,671.00	\$391,000.00
	P(a)	\$55,671.00	\$391,000.00
	A	\$45,771.00	\$45,771.00
Monitoramento, avaliação e auditorias	P	\$119,405.00	\$239,000.00
	P(a)	\$49,405.00	\$239,000.00
	A	\$0.00	\$29,478.00

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$18,256,823.00	\$50,299,999.00
	P(a)	\$9,609,712.00	\$50,300,000.00
	A	\$3,974,637.00	\$6,952,831.00

## Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	36. Política de gestão do conhecimento implantada	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	35. Novos instrumentos de regulamentação dos recursos humanos da SEFAZ implementados	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	34. Tutores e monitores acreditados, para a prática de capacitação (Educação à Distância).	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	33. Vagas de capacitação ofertadas	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	32. Plano Estratégico de TI implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	31. Equipamentos para usuário finais renovados	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	30. Espaço para armazenagem da NF-e e SPED ampliado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	29. Solução de prevenção à intrusão à rede lógica e, ferramenta de análise de vulnerabilidade	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016

Output	28. Sala cofre instalada	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	27. Ações de comunicação implementadas, a partir da melhora na relação da SEFAZ com seus recursos humanos	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	26. Ferramentas de comunicação implantadas, mediante a melhora da qualidade do atendimento aos contribuintes	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	25. Novo modelo de auditoria governamental baseado em riscos implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	22. Prontuários de funcionários digitalizados	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	21. Sistema integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças - FIPLAN implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	9. Novo modelo de fiscalização do trânsito de mercadorias implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	19. Processo administrativo tributário (PAF-e) implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	17. Sistema de controle de omissos implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	16. Contribuintes beneficiados pela implantação do DT-e (Domicílio tributário eletrônico)	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016

Output	15. Sistema de cadastro de contribuintes com visão unificada do cadastro atualizado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	14. Sistema de gestão dos benefícios fiscais implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	13. Novo modelo de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	12. Novo modelo de gestão do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	11. Informação sobre o índice de valor agregado (IVA) para cada município disponibilizada via web	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	8. Novo modelo de fiscalização de estabelecimentos a partir das informações do SPED	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	7. Unidade de estudos tributários criada	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	6. DAE (Documento de Arrecadação Estadual) único implantado	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	5. Eventos de intercambio de experiências com as secretarias de fazenda de outros estados realizados	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	3. Manual de modelagem, monitoramento e avaliação para projetos sob modalidade PPP confeccionado.	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016

Output	2. Processos estratégicos da SEFAZ com procedimentos mapeados e monitorados	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1. Projetos estratégicos incorporados ao sistema de monitoramento	Modify Financial P(a) value	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). A metas foram reprogramadas internamente para refletir de forma mais adequada a evolução do programa. Essa modificação ocorreu internamente no componente e não compromete o conjunto das intervenções conforme acordado no Contrato de Empréstimo.	3/11/2016	3/11/2016
Output	23. Requalificação da Infraestrutura da Sede SEFAZ	Create Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). Proposta de novo produto que abrangerá as seguintes atividades (i) adequação, reforma e modernização das instalações físicas do prédio sede.; (ii) confecção e instalação de gradil de segurança do prédio sede; (iii) implantação das unidades de geração fotovoltaicas nas unidades fazendárias; (iv) instalação de CFTV e segurança perimetral.	3/11/2016	2/24/2016
Output	Novo modelo de Gestão de Contribuintes do Simples Nacional baseado em verificações censitárias implantado	Create Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). Integrante da Agenda Estratégica da SEFAZ, o produto prevê: (i) o desenvolvimento do modelo de gestão e controle do Simples Nacional, a partir do uso massivo de informações e processos que possibilite a auto regularização dos contribuintes: e, (ii) desenvolvimento do sistema para integrar as informações obtidas na Malha Fiscal com o módulo que permita a interação com os escritórios de contabilidade e contribuintes do Simples Nacional.	3/11/2016	2/24/2016
Output	Sistema de avaliação de risco de escritórios de contabilidade implantado	Create Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). Novo produto que objetiva monitorar os contribuintes por meio das práticas dos escritórios de contabilidade e prever a aquisição de ferramenta e serviços para visualização de dados. A partir da incidência dos erros detectados, os escritórios serão melhor orientados e poderão prestar melhor serviço aos seus clientes.	3/11/2016	2/24/2016
Output	Requalificação da Infraestrutura da Administração Tributária	Create Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). Proposta de novo produto que abrangerá as seguintes atividades (i) requalificação de infraestrutura física da Diretoria Tributária e Inspetorias Fazendárias e Postos Fiscais; (ii) aquisição de 113 veículos e de mobiliários	3/11/2016	2/24/2016
Output	20. Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor - NFC-e implantada	Create Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120). Proposta de novo produto que abrangerá as seguintes atividades: (i) desenvolvimento e implantação de sistema da NFC-e, com controle de omissos; (ii) desenvolvimento do Sistema de Programa de Cidadania e Recepção de Denúncias NFC-e; e (iii) revisão dos processos de fiscalização do varejo.	3/11/2016	2/24/2016
Output	24. Modelo de gestão da Corregedoria implantado	Inactivate Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120).	3/11/2016	2/24/2016
Output	23. Novo modelo de gestão de processos da Direção Geral implantado	Inactivate Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120).	3/11/2016	2/24/2016
Output	20. Unidades financeiras da administração pública estatal e da Superintendência de Administração Financeira (SAF) operando os processos de execução financeira e orçamentária de acordo com os novos procedimentos	Inactivate Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120).	3/11/2016	2/24/2016

Output	18. Novo processo de cobrança administrativa implantado	Inactivate Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120).	3/11/2016	2/24/2016
Output	10. Unidade Móvel para a área de inteligência fiscal equipada	Inactivate Output	PMR atualizado de acordo com o Relatório de Progresso 2º semestre 2015 do PROFISCO BA, disponível em IDBDOCS, refletindo as modificações constante na ata da visita técnica ao Projeto (IDBDOCS 40175120).	3/11/2016	2/24/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
