



Operation Number: **GU-L1014**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/4/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/14/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Establishing Cadastral Registry & Strengthening Legal Certainty Protected Areas	Loan Number:	2149/BL-GU
Executing Agency (EA):	Registro de Información Catastral		
Team Leader:	Milewski,Joseph Christofer	Sector/Subsector:	BIODIVERSITY AND PROTECTED AREAS CONSERVATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
GU-L1014	\$22,000,000.00	\$22,000,000.00	\$0.00		\$22,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
GU-L1014	\$22,000,000.00	\$19,790,500.00	89.96%	\$2,209,500.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

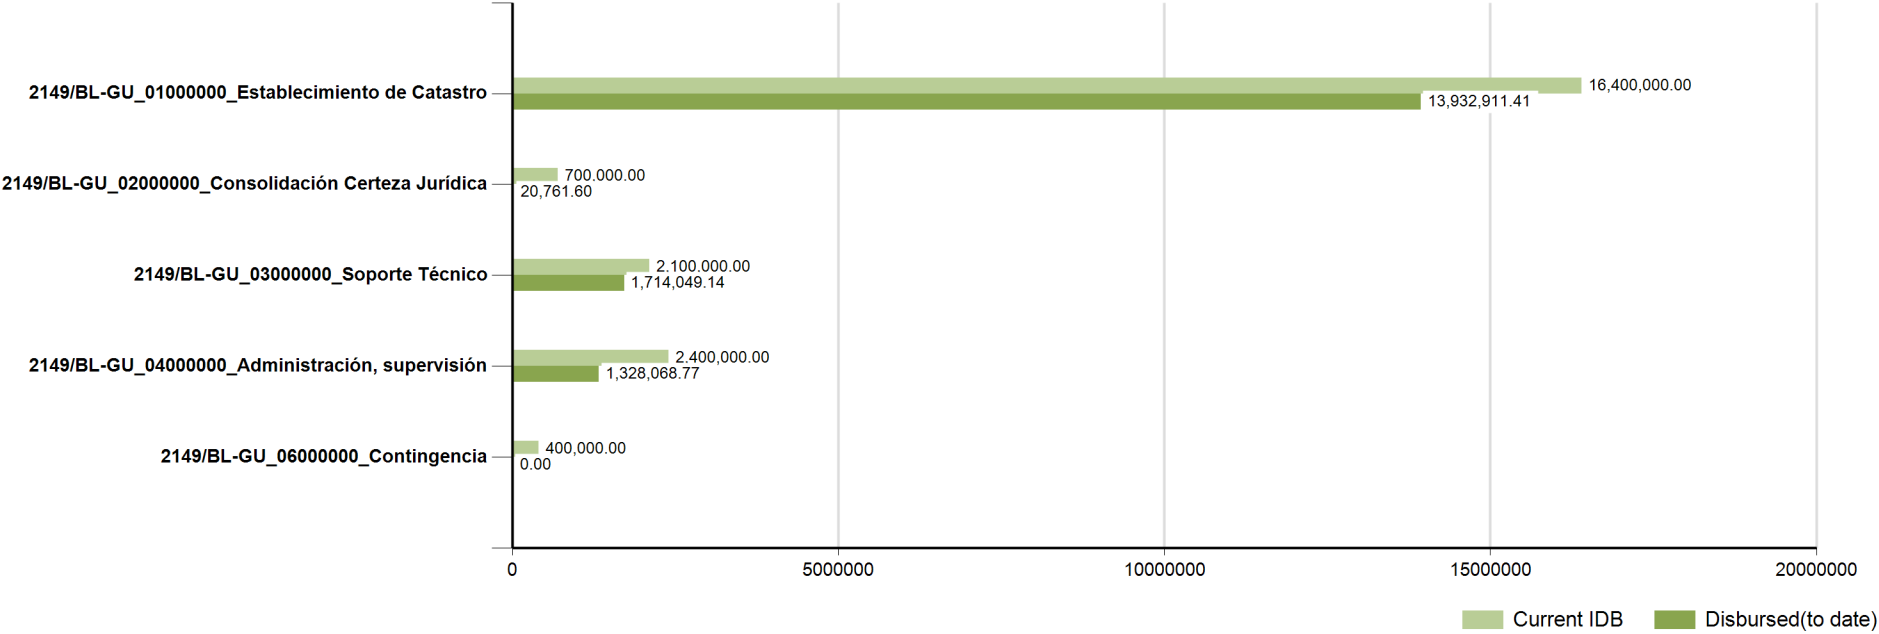

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Las áreas protegidas que conforman el SIGAP cuentan con certeza espacial y jurídica							
Observation:	SIGAP: Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Áreas protegidas con certeza espacial y jurídica		Área protegida	0.00	2009	Documentos de adscripción en el RGP		P	92.00
							P(a)	76.00
							A	

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Áreas protegidas de gestión nacional cuentan con establecimiento catastral									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP	
1.1 Áreas protegidas del SIGAP cuentan con catastro		Área Protegida	0.00	2008	Reportes semestrales del RIC.		P		92.00	
							P(a)		76.00	
							A			
Outcome:	2 Conflictividad social resultado de la implementación del proceso catastral se reduce									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP	
2.1 Número de conflictos registrados		Conflictos	0.00	2008	Reportes semestrales del RIC		P		0.00	
							P(a)		0.00	
							A			
Outcome:	3 Se consolida la certeza jurídica de las áreas protegidas del SIGAP									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP	
3.1 Áreas protegidas registradas en el RGP		Porcentaje	1.00	2008	Reportes semestrales del RIC. Registros del RGP.		P		92.00	
							P(a)		76.00	
							A			

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Catastro en áreas protegidas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Base de datos de monitoreo de conflictos	Base de datos	P	0.00	1.00	P	80,000.00	640,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	66,300.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	66,300.00
Areas protegidas catastradas	Km cuadrado	P	3,166.05	32,522.39	P	142,000.00	1,638,000.00
		P(a)	9,233.45	33,261.44	P(a)	1,236,899.00	13,069,026.98
		A	1,004.96	17,938.78	A	266,862.05	11,372,219.03
Areas protegidas con procuracion legal	Area protegida	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	19,528.00	19,528.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Areas protegidas delimitadas	Area protegida	P	27.00	92.00	P		737,000.00
		P(a)	23.00	122.00	P(a)	56,131.00	1,221,459.24
		A	2.00	92.00	A	21,681.66	1,111,889.90
Areas protegidas demarcadas	Km	P	1,190.83	5,675.80	P	2,427,000.00	12,941,000.00
		P(a)	1,204.00	5,777.53	P(a)	633,126.00	3,406,364.78
		A	541.54	1,990.20	A	115,286.51	1,786,333.29
Consolidación de la certeza jurídica de las áreas protegidas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Áreas protegidas cuentan con proceso de procuración legal para el registro, adscripción y anotaciones al final del proyecto	Área Protegida	P	9.00	92.00	P	180,000.00	828,000.00
		P(a)	1.00	77.00	P(a)	19,528.00	59,640.00
		A	0.00	5.00	A	0.00	20,762.00
Apoyo técnico, coordinación interinstitucional y uso de la información catastral y registral		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Instancia de coordinación interinstitucional organizada y operando con capacidad para el manejo de conflictos asociados al catastro y registro de tierras dentro de las áreas protegidas	Instancia	P	0.00	1.00	P	30,000.00	132,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,825.00
		A		1.00	A		3,825.00
Convenios interinstitucionales suscritos en el marco del proyecto	Convenio	P	0.00	8.00	P	60,000.00	316,000.00
		P(a)	0.00	9.00	P(a)	0.00	61,029.47
		A	0.00	9.00	A	0.00	61,029.47
Unidades de apoyo implementadas y con apoyo técnico en instituciones socias del proyecto a partir del segundo año	Unidades	P	0.00	7.00	P	400,000.00	1,597,000.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)	0.00	1,105,223.53
		A	0.00	8.00	A	0.00	989,075.53
Diseñar y Construir las bases de datos georeferenciada en materia de catastro y registro, tenencia y uso de la tierra en áreas protegidas.	base de datos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	81,366.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	53,466.00
Desarrollo de aplicativos tecnologicos	aplicativos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	12.00	48.00	P(a)	43,313.00	387,780.86
		A	0.00	36.00	A	10,738.15	355,206.01
Sitios arqueologicos y lugares ceremoniales idigenas verificados (IDAEH)	Sitios	P		0.00	P		0.00
		P(a)	50.00	451.00	P(a)	16,500.00	109,646.55
		A	35.00	436.00	A	7,809.56	100,956.11

Sistema de seguimiento e información de catastro y registro, tenencia y uso de la tierra en áreas protegidas interconectanto RIC / RGP / CONAP en operación	Sistema	P	0.00	1.00	P	126,000.00	1,375,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	2,500.00
		A		0.00	A		2,500.00
Delimitacion de reservas territoriales del estado	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	50.00	337.00	P(a)	15,000.00	49,488.15
		A	35.00	322.00	A	5,206.21	39,694.36
Tierras regularizadas a favor de comunidades (FONTIERRAS)	Comunidades	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	0.00	34,557.07
		A	0.00	5.00	A	0.00	34,557.07
Dictámenes tecnico-juridicos sobre proceso catastral (CONAP)	Dictámenes	P		0.00	P		0.00
		P(a)	23.00	77.00	P(a)	63,391.00	167,209.37
		A	2.00	44.00	A	29,058.22	132,876.59
Administración y seguimiento							

Other Cost			2016	Cost
Administración y seguimiento		P	\$630,000.00	\$2,800,000.00
		P(a)	\$411,500.00	\$2,044,032.73
		A	\$42,696.37	\$1,370,765.10
Total Cost			2016	Total Cost
		P	\$4,075,000.00	\$23,004,000.00
		P(a)	\$2,514,916.00	\$21,888,977.73
		A	\$499,338.73	\$17,501,455.46

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Areas protegidas con procuracion legal	Modify Physical P(a) value	Ajuste de valores en funcion del PEP octubre 2016	10/4/2016	10/3/2016
Output	Dictámenes tecnico-juridicos sobre proceso catastral (CONAP)	Modify Financial P(a) value	Ajuste del valor en funcion del PEP del 3 de octubre del 2016.	10/4/2016	10/3/2016
Output	Diseñar y Construir las bases de datos georeferenciada en materia de catastro y registro, tenencia y uso de la tierra en áreas protegidas.	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2013, en base a los EFAS.	10/4/2016	10/3/2016
Output	Unidades de apoyo implementadas y con apoyo técnico en instituciones socias del proyecto a partir del segundo año	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2013, en base a los EFAS	10/4/2016	10/3/2016
Output	Áreas protegidas cuentan con proceso de procuración legal para el registro, adscripción y anotaciones al final del proyecto	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2015, en base a los EFAS	10/4/2016	10/3/2016
Output	Areas protegidas demarcadas	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2012, en base a los EFAS.	10/4/2016	10/3/2016
Output	Areas protegidas delimitadas	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2012, en base a los EFAS	10/4/2016	10/3/2016
Output	Areas protegidas catastradas	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2014, en base a los EFAS	10/4/2016	10/3/2016
Output	Areas protegidas con procuracion legal	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2015, en base a los EFAS	10/3/2016	10/3/2016

Impact	Áreas protegidas con certeza espacial y jurídica	Modify EOP P(a)	Ajuste de 92 a 76 APs en funcion del analisis juridico, consignado en el anexo de la Ayuda Memoria de mision de Administracion, Agosto 2015.	10/3/2016	9/29/2016
Outcome	Áreas protegidas registradas en el RGP	Modify EOP P(a)	Ajuste de 92 a 76 APs en funcion del analisis juridico, consignado en el anexo de la Ayuda Memoria de mision de Administracion, Agosto 2015.	10/3/2016	9/29/2016
Outcome	Áreas protegidas del SIGAP cuentan con catastro	Modify EOP P(a)	Ajuste de 92 a 76 APs en funcion del analisis juridico, consignado en el anexo de la Ayuda Memoria de mision de Administracion, Agosto 2015.	10/3/2016	10/3/2016
Outcome	Áreas protegidas de gestión nacional cuentan con establecimiento catastral	Modify Statement	Correccion ortografica.	10/3/2016	10/3/2016
Output	Convenios interinstitucionales suscritos en el marco del proyecto	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos de 2013, en base a los EFAS.	9/26/2016	9/26/2016
Output	Base de datos de monitoreo de conflictos	Modify Financial P(a) value	Ajuste a los valores historicos del 2012 y 2013, en base a los EFAS.	9/26/2016	9/26/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
