



Operation Number: **EC-L1076**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/4/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/18/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support the Extension of Social Protection and Comprehensive Health Care	Loan Number:	2431/OC-EC
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		
Team Leader:	Aleman,Xiomara Margarita	Sector/Subsector:	SA
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1076	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$2,500,000.00		\$102,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1076	\$100,000,000.00	\$82,547,120.46	82.55%	\$17,452,879.54


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

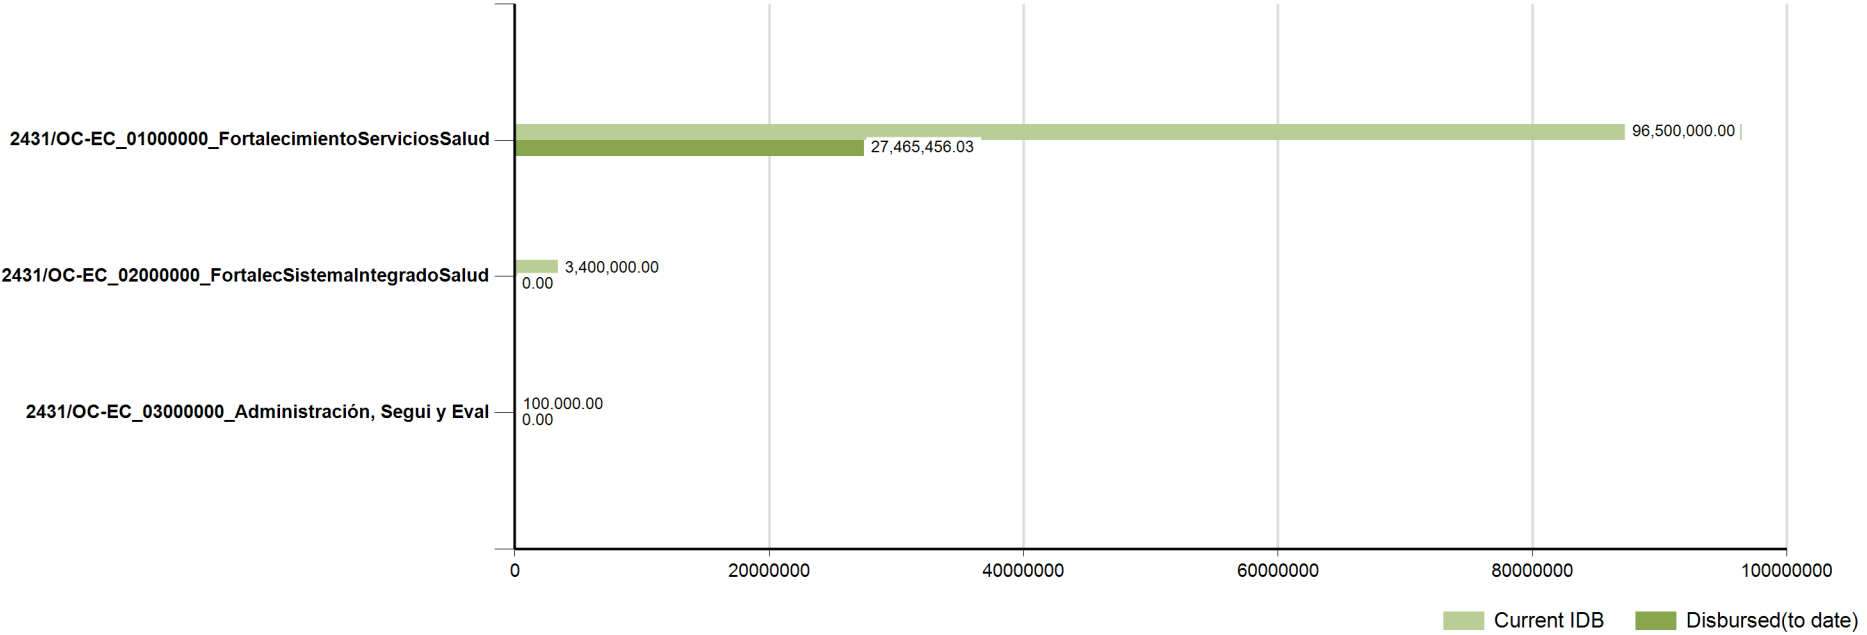

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mortalidad infantil (menos de 1 año) por 1000 nacidos vivos reducida.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Reducción del índice de mortalidad infantil.		Indice de Mortalidad Infantil	21.00	2009	Estimado de OMS basado en registros de nacionales.		P	18.00
							P(a)	18.00
							A	0.00
Impact:	2 Hospitalizaciones por condiciones respiratorias agudas, reducidas.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Reducción de hospitalizaciones por condiciones respiratorias agudas.		% de hospitalizaciones	20.40	2009	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Registros de egresos hospitalarios.		P	17.30
							P(a)	17.30
							A	0.00
Impact:	3 Prevalencia de desnutrición entre niños de 1 y 5 años reducida.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Reducción en la prevalencia de desnutrición de niños entre 1 y 5 años.		prevalencia de desnutrición	31.00	2009	Encuesta de Condiciones de Vida.		P	28.00
							P(a)	28.00
							A	0.00

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Oferta, cobertura y calidad de los servicios de salud mejoradas mediante fortalecimiento de la capacidad resolutive y articulación de las unidades operativas.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		2018	EOP
1.1 Establecimientos (Unidades Operativas) de Salud Construidas y Equipadas de acuerdo a los nuevos Modelos Arquitectonicos y Plan Medico Funcional.		Unidades Operativas	0.00	2009	Informes de Licenciamiento del Ministerio de Salud Pública (MSP)	Refiere al número absoluto de las Unidades Operativas de Salud licenciadas.	P			343.00
							P(a)			50.00
							A			0.00
1.2 Cobertura (atenciones de prevención) de niños menores a 1 año aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		%	0.00	1999	Sistema de Común de Información.		P			
							P(a)			
							A			
1.3 Cobertura (controles) de mujeres embarazadas aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		% de embarazadas	61.00	2009	Sistema Común de Información.	Se actualizará el indicador de la línea de base con el arranque del préstamo. El % refiere al % de mujeres embarazadas que realicen sus controles prenatales.	P			80.00
							P(a)			80.00
							A			0.00

1.4 Cobertura (atenciones de prevención) niños entre 1 a 5 años aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		% niños 1 a 5 años	34.00	2009	Sistema Común de Información.	Se actualizará el indicador de la línea de base con el arranque del préstamo. El % refiere al % de niños entre 1 a 5 años que realicen sus controles de niño sano.	P			60.00
							P(a)			60.00
							A			0.00
1.5 Establecimientos (Unidades Operativas) de Salud con cartera de servicio ampliada en base al Plan Médico Funcional.		Unidades Operativas	0.00	2009	Sistema Común de Información.	El Número refiere al número de Unidades operativas con oferta de servicios ampliadas.	P			90.00
							P(a)			53.00
							A			0.00
1.6 Cobertura de parto institucional público aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		% de partos	52.00	2009	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.	El % refiere al % de partos que se realicen en instituciones públicas.	P			62.00
							P(a)			62.00
							A			0.00
1.7 Cobertura de vacunas (tercera dosis pentavalente en el primer año de vida) aumentada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		Número de dosis	53,985.00	2009	Sistema Integrado de Salud.		P			60,942.00
							P(a)			60,942.00
							A			0.00

1.8 Parroquias de "alto riesgo" intervenidas por el Programa.		Número de parroquias	0.00	2009	Sistema de Monitoreo y Seguimiento al Plan de Inversiones .	El Número refiere al número de de parroquias de alto riesgo que se intervino el Programa.	P			124.00
							P(a)			82.00
							A			0.00
1.9 Personas (todas, indígenas, afrodescendientes) que se benefician de un paquete básico de servicios de salud, en los territorios a ser intervenidas por el programa.	 RF-C					El Programa beneficiará a más de 900571 personas. Se calcula el número de beneficiarios de un paquete básica de servicios de salud basada en la estimación de población asignada a las unidades operativas prioritizadas para las intervenciones del programa.	P			900,571.00
							P(a)			1,795,104.00
							A			0.00
		Beneficiarios (#)	0.00	2011	Sistema de monitoreo y evaluación del programa.					
Outcome:	2 Sistema Integrado de Salud que comprende un sistema de información médica y de gestión del MSP fortalecido.									
Observation:										

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017	2018	EOP
2.1 Población con atenciones registradas con la Historia Clínica sistematizada, en los territorios a ser intervenidas por el programa.		Número de personas	0.00	2009	Sistema Integrado de Salud.	El Número refiere al número de personas que están registradas en la Historia Clínica sistematizada.	P		451,758.00
							P(a)		451,758.00
							A		0.00



RF - Contribution



RF - Alignment



RF - Strategic Alignment



RF - Strategic Alignment during Execution



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Fortalecimiento de los Servicios de Salud del MSP.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
1.1 Hospitales basicos repotenciados y/o equipados.	Hospitales	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	7,872,634.81	20,608,944.80
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2 Establecimientos de Salud del primer nivel de atención construidos y/o amoblados.	Establecimientos	P		20.00	P		82,399,222.22
		P(a)	1.00	14.00	P(a)	6,317,892.14	22,091,941.07
		A	0.00	7.00	A	967,553.25	9,726,847.17
Salud Intercultural Fortalecida.	Gestion	P		3.00	P		1,305,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	67,200.00
		A		1.00	A		0.00
1.3 Establecimientos de Salud del primer nivel de atención repotenciados y/o amoblados.	Establecimientos	P		56.00	P		0.00
		P(a)	6.00	39.00	P(a)	3,812,288.66	7,357,617.92
		A	0.00	0.00	A	0.00	184,509.00
Espacios de estancia temporal culturalmente adecuados repotenciados y equipados.	Espacios	P		3.00	P		1,000,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
1.4 Estudios de implantación y/o diagnóstico situacional de centros de salud realizados	Estudios	P		0.00	P		0.00
		P(a)	17.00	68.00	P(a)	872,966.87	957,000.98
		A	0.00	51.00	A	30,054.80	114,088.91
1.5 Herramientas de Gestión Estratégica Sanitaria desarrolladas e implementadas.	Herramientas de gestión	P		3.00	P		1,079,819.00
		P(a)	3.00	11.00	P(a)	604,389.89	1,268,967.02
		A	0.00	4.00	A	0.00	122,620.00
1.6 Distritos (MAIS-Gestion Red) implementados y operando.	Distritos	P		4.00	P		1,068,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	236,156.00
		A	0.00	4.00	A	0.00	236,156.00
1.7 Establecimientos de Salud equipados	Establecimientos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	192.00	P(a)	6,502,236.92	17,038,895.51
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.8 Egresados de los programas de formacion (incluyendo manutencion del personal en formacion)	Personas	P		684.00	P		4,887,498.00
		P(a)	450.00	1,914.00	P(a)	5,056,800.34	23,930,478.62
		A	0.00	1,464.00	A	273,053.17	19,146,731.45
1.9 Medios de transporte y de emergencia médica entregados y operando.	Vehículos	P		93.00	P		4,877,000.00
		P(a)	0.00	37.00	P(a)	3,667,925.10	9,739,925.10
		A	0.00	4.00	A	0.00	0.00
1.10. Equipos y/o material educativo de salud y desarrollo materno infantil entregado en territorio.	Equipos/materiales	P		530.00	P		243,050.00
		P(a)	243,413.00	686,866.00	P(a)	2,053,604.24	2,986,969.57
		A	0.00	530.00	A	0.00	243,050.00
1.11 Personal médico y de apoyo capacitado	Personas	P		1,448.00	P		727,202.00
		P(a)	905.00	2,085.00	P(a)	3,750,318.17	6,579,281.51
		A	0.00	772.00	A	0.00	62,607.00
Componente 2. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
2.1 Establecimientos de Salud con equipos de informática y/o de telecomunicaciones instalados	Establecimientos	P		3.00	P		7,188,000.00
		P(a)	0.00	57.00	P(a)	1,566,678.83	3,435,154.17
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Distritos con sistema de referencia y contrareferencia desarrollado e implementado.	Distritos	P		4.00	P		100,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00

Other Cost		2016	Cost
Administración (incluyendo auditoría)	P		\$1,546,547.00
	P(a)	\$683,988.44	\$2,860,065.95
	A	\$211,182.98	\$2,068,627.28
Imprevistos (posible cancelacion)	P		\$0.00
	P(a)		\$4,650,754.70
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P		\$106,421,338.22
	P(a)	\$42,761,724.41	\$123,742,152.92
	A	\$1,481,844.20	\$31,905,236.81

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
