



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2010 - JUNIO 2010

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo territorial y generación de empleo en la Cuenca del Río Lurín, Lima

Nro. Proyecto: PE-M1057

Nro. Operación: ATN/ME-11652-PE

Propósito: Desarrollo de capacidades locales para la gestión y promoción de la actividad productiva, particularmente a través de la innovación tecnológica y la agregación de valor, facilitando así la generación de empleo.

País Administrador:
PERÚ

País Beneficiario:
PERÚ

Grupo:
SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa


Subgrupo:
PLED - Competitividad local

Agencia Ejecutora: Centro Global para el Desarrollo y la Democracia


Líder equipo de diseño: Laguyas, Natalia

Líder equipo de supervisión: Giesecke, Jaime Arturo


CRONOLOGÍA DE EVENTOS

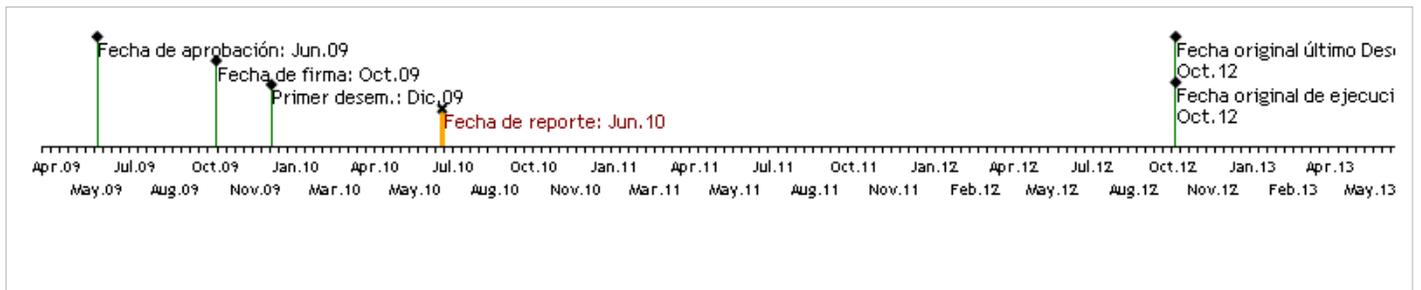


RECURSOS

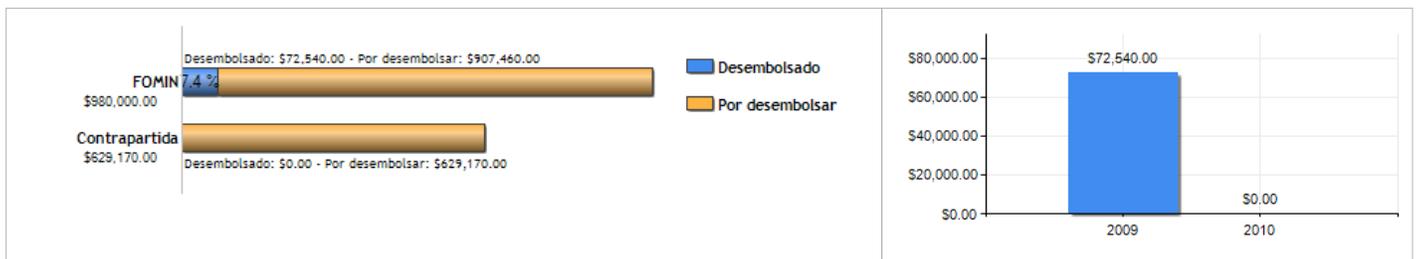

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

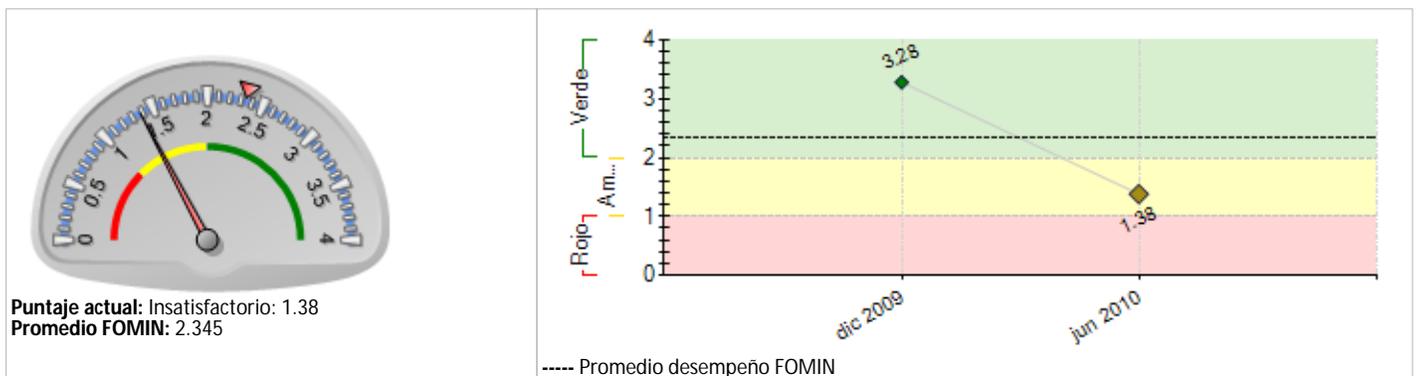

RIESGOS EXTERNOS

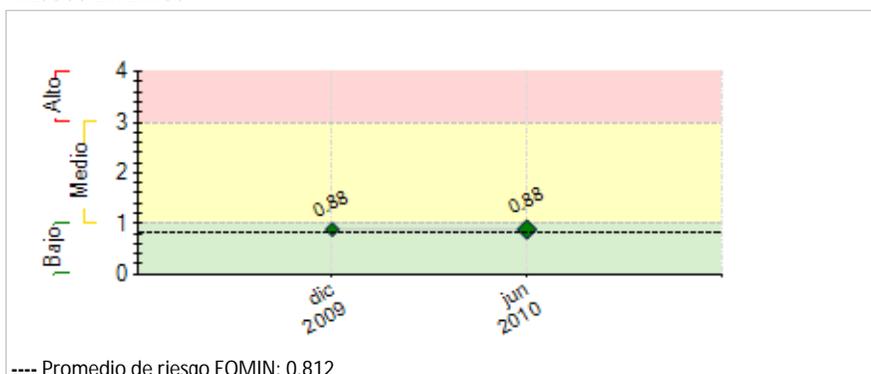

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

- Administración Financiera: Alto
- Adquisiciones: Alto
- Capacidad Técnica: Medio

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Logros:

2. Limitaciones y riesgos:

- Presentación del proyecto a principales actores políticos y sociales de la cuenca, despertando interés y compromiso. Interés de la ANPE para firmar convenios de cooperación con municipios y organizaciones de la cuenca. Coordinaciones permanentes con Alcaldes de la cuenca media y alta y con el Gobierno Regional de Lima
- Culminación de la formulación participativa del Diagnóstico socio económico y del Mapa de actores de la cuenca
- Inicio de la formulación participativa del Consejo de RRHH y de la Mesa de Desarrollo Económico Local de la cuenca
- Inicio del servicio de asistencia Técnica a las cadenas productivas.
- Retraso en la adjudicación de consultorías para formular planes de asistencia técnica de dos cadenas productivas y la cadena de turismo, al estar condicionada al término del diagnóstico socio económico y el mapa de actores.
- Retraso en la contratación de los técnicos del Área de servicios del proyecto y del consultor de monitoreo
- En ambos casos, se está agilizando el procedimiento para asegurar los contratos en Agosto.
- Demora en los procesos de contratación, limita la capacidad de gasto y cumplimiento de metas
- Demora en el cofinanciamiento de fuente donante complementaria (IAF. Se espera firma de contrato y 1er desembolso en Setiembre.
- Acciones críticas: Mejorar eficiencia en la gestión, asegurar el cofinanciamiento, completar el equipo básico de consultores permanentes y mantener relaciones con los principales municipios y autoridades regionales luego del cambio de autoridades

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Logros:

2. Limitaciones y riesgos:

- Presentación del proyecto a principales actores políticos y sociales de la cuenca, despertando interés y compromiso. Interés de la ANPE para firmar convenios de cooperación con municipios y organizaciones de la cuenca. Coordinaciones permanentes con Alcaldes de la cuenca media y alta y con el Gobierno Regional de Lima
- Culminación de la formulación participativa del Diagnóstico socio económico y del Mapa de actores de la cuenca
- Inicio de la formulación participativa del Consejo de RRHH y de la Mesa de Desarrollo Económico Local de la cuenca
- Inicio del servicio de asistencia Técnica a las cadenas productivas.
- Retraso en la adjudicación de consultorías para formular planes de asistencia técnica de dos cadenas productivas y la cadena de turismo, al estar condicionada al término del diagnóstico socio económico y el mapa de actores.
- Retraso en la contratación de los técnicos del Área de servicios del proyecto y del consultor de monitoreo
- En ambos casos, se está agilizando el procedimiento para asegurar los contratos en Agosto.
- Demora en los procesos de contratación, limita la capacidad de gasto y cumplimiento de metas
- Demora en el cofinanciamiento de fuente donante complementaria (IAF. Se espera firma de contrato y 1er desembolso en Setiembre.
- Acciones críticas: Mejorar eficiencia en la gestión, asegurar el cofinanciamiento, completar el equipo básico de consultores permanentes y mantener relaciones con los principales municipios y autoridades regionales luego del cambio de autoridades

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Desarrollo de capacidades locales para la gestión y promoción de la actividad productiva, particularmente a través de la innovación tecnológica y la agregación de valor, facilitando así la generación de empleo.	P.11	0			20 Oct 2012	0 Feb 2010	
	P.12	0			20 Oct 2012	0 Feb 2010	
	P.13	0			20 Oct 2012	0 Feb 2010	
	P.14	0			30 Oct 2012	0 Feb 2010	
	P.15	0			2 Oct 2012	0 Feb 2010	
Componente 1: Fortalecimiento de espacios de gestión público-privados para el desarrollo económico y ambiental Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	0			1 Oct 2010	1 Jul 2010	En curso
	C1.12	0			17 Oct 2010	1 Jul 2010	En curso
	C1.13	0			12 Oct 2012	0	
	C1.14	0			50	0	

más eficiente de interacción con las empresas y de gestión del territorio.

constitución de una Mesa público.privada para el Desarrollo económico local previstas en el componente 1. Asimismo, se han propuesto mecanismos claros de ejecución y, a través del fondo de consultoría del componente 2 se está asegurando la necesaria flexibilidad para adaptarse a la evolución del sistema productivo. Con el componente 3 se incentivará el concurso de perfiles público-privados para el desarrollo sostenible

3. Adelanto de elecciones municipales a Octubre 2010, incorpora un componente político que puede distraer la atención de los actores sociales y generar cambios en las autoridades municipales comprometidas con el desarrollo local

Bajo

Desarrollo de capacidades para el desarrollo local con actores públicos y de la sociedad civil. Formulación participativa del Plan de Desarrollo Territorial y de planes específicos para el desarrollo económico local, previstos en el componente 1

Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

[X] no hay una estrategia explícita de recuperación de costos por los servicios que presta el proyecto

Comentarios

Todavía no ha sido formulado

El proyecto presta servicios de desarrollo empresarial a los beneficiarios y no tiene una estrategia de recuperación de costos ni de sostenibilidad

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En el primer semestre de ejecución, no se han identificado aún problemas que afecten a la sostenibilidad del proyecto

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]
