
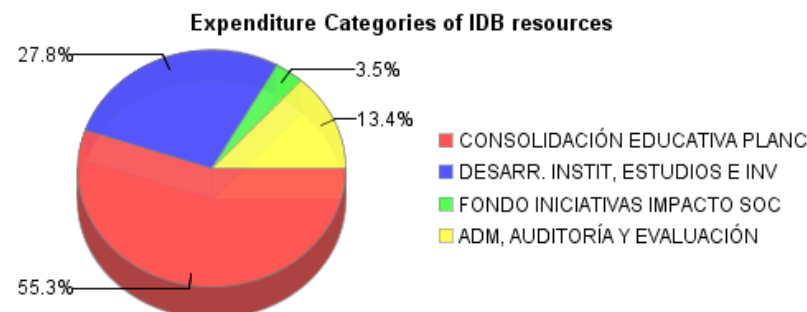
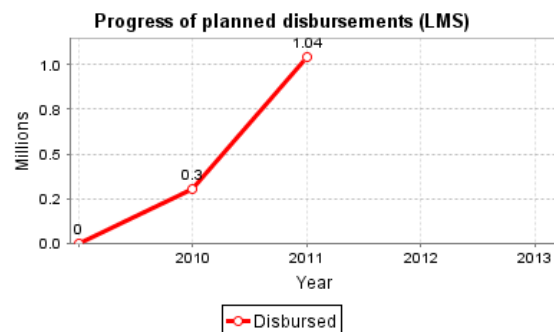


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Sector:	EDUCATION-e-EDUCATION				
Loan Number(s):	2260/OC-UR	Current Approved Amount:	6.000.000,00	Original IDB:	6.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.037.264,50	Current IDB:	6.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	17,29	Pari-passu:	71,00
Related Operation(s):		Balance:	4.962.735,50	Co-Financing/Country:	2.500.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	8.500.000,00
				Amortization Period (months):	252

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 20-abr-2012 Validated by Country Representative: 02-may-2012

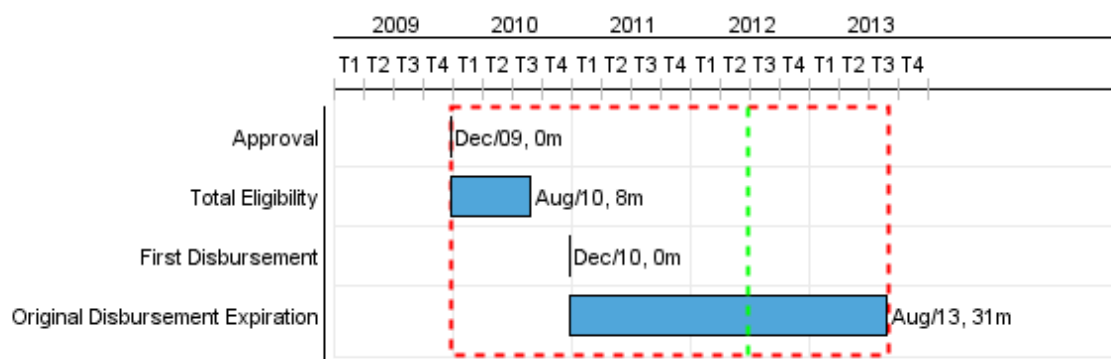

Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	1. Prácticas educativas modificadas.
-----------------	--------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
1.1 Docentes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00
1.2 Estudiantes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Outcome:	2. El Centro de Estudios e Investigación (CEI) logra posicionarse como referente a nivel nacional e internacional
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
2.1 Investigaciones realizadas por el CEI con publicación a nivel internacional.	Publicaciones		2011	P A	2,00
2.2 Estudios realizados tienen influencia sobre políticas educativas.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Consolidación Educativa del Plan Ceibal									
1.1 Estándares para contenidos publicados.	Estándares	1,00	1,00		2,00	50.000,00	13.040,00		27.000,00
1.2. Sistema de Certificación de estándares desarrollado.	Sistema		1,00		1,00	30.000,00			6.000,00
1.3. Plataforma tecnológica para contenidos digitales habilitada.	Plataforma				1,00	240.000,00			986.000,00
1.4. Adquisición y desarrollo de contenidos digitales completado.	Contenidos	200,00	130,00		600,00	526.000,00	40.260,00		928.240,00
1.5. Plataforma tecnológica para el registro, gestión e información educativa habilitada.	Plataforma				1,00	100.000,00	278,00		102.278,00
1.6. Sitios institucionales desarrollados.	Sitios								
1.7. Plataforma tecnológica para evaluación en línea habilitada.	Plataforma				1,00	151.500,00	102.269,00		254.150,00
1.9. Instrumentos de evaluación para medir aprendizajes a nivel nacional desarrollados.	Instrumentos de evaluación	36,00	27,00		69,00	99.000,00	151.791,00		576.784,00
1.11. Maestros, Docentes, directivos e inspectores en escuelas piloto capacitados.	Docentes	450,00	450,00		10.000,00	1.162.800,00	845.004,00		2.219.246,00
Componente 2. Desarrollo institucional, estudios e investigación									
2.1 Centro de Estudios e Investigaciones (CEI) creado y en funcionamiento.	centro				1,00	300.000,00	52.705,00		758.428,00
2.8 Proyectos pilotos desarrollados.	Pilotos				3,00				1.355.697,00
2.10 Estudios publicados.	Publicaciones				7,00				24.000,00
2.12 Seminarios internacionales realizados.	Eventos				2,00				178.570,00
Componente 3. Fondo de iniciativas para el impacto social del Plan CEIBAL									
3.1 Estudio de relevamiento de iniciativas existentes publicado.	Publicaciones				1,00	25.000,00	1.165,00		22.940,00
3.2 Iniciativas financiadas por fondo concursable desarrolladas.	Iniciativas	17,00	8,00		27,00	175.000,00	68.913,00		316.960,36
3.3 Eventos anuales de difusión desarrollados.	Eventos				2,00	627,00			49.137,00
3.4 Estudio de evaluación del impacto social del Plan CEIBAL publicado.	Publicaciones				1,00				9.300,00
Administración y Auditoría									
Evaluación Externa desarrollada	Publicaciones				1,00	100.000,00	17.640,00		254.800,00
TOTAL						2.959.927,00	1.293.065,00		8.069.530,36
