




Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE FAZENDA DE BAHIA	Monto Aprobado Actual:	45.270.000,00	BID Original:	45.270.000,00
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	45.270.000,00
Número(s) de Préstamo:	2914/OC-BR	% Desembolsado:		Pari-passu:	90,00
Etapas:	Approved	Saldo:	45.270.000,00	Co-financiamiento/País:	5.030.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	50.300.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1478, RG-P1509			Período de Amortización (meses):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 12-abr-2013 Validado por Representante de País: 16-abr-2013

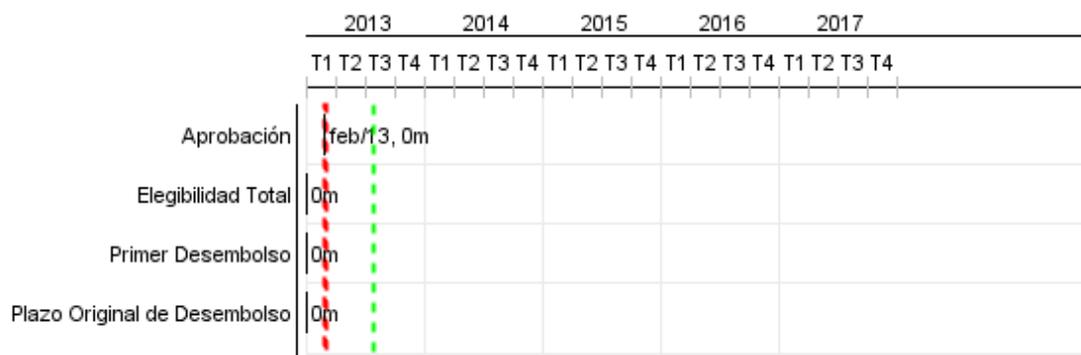

Progreso Acumulado al 2012


Progreso Acumulado

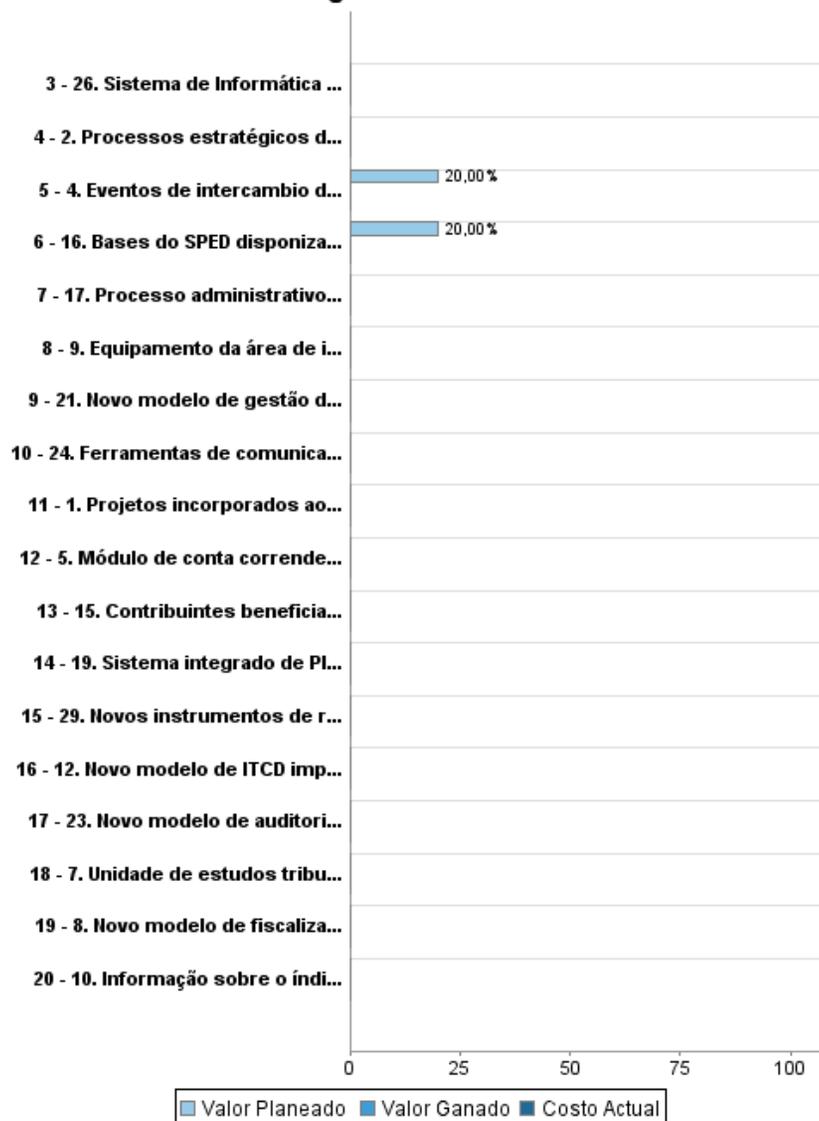

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1319 - PROFISCO Programa Modernización y Fortalecim. Gestión Fiscal del Estado de Bahia
 2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Progreso Acumulado

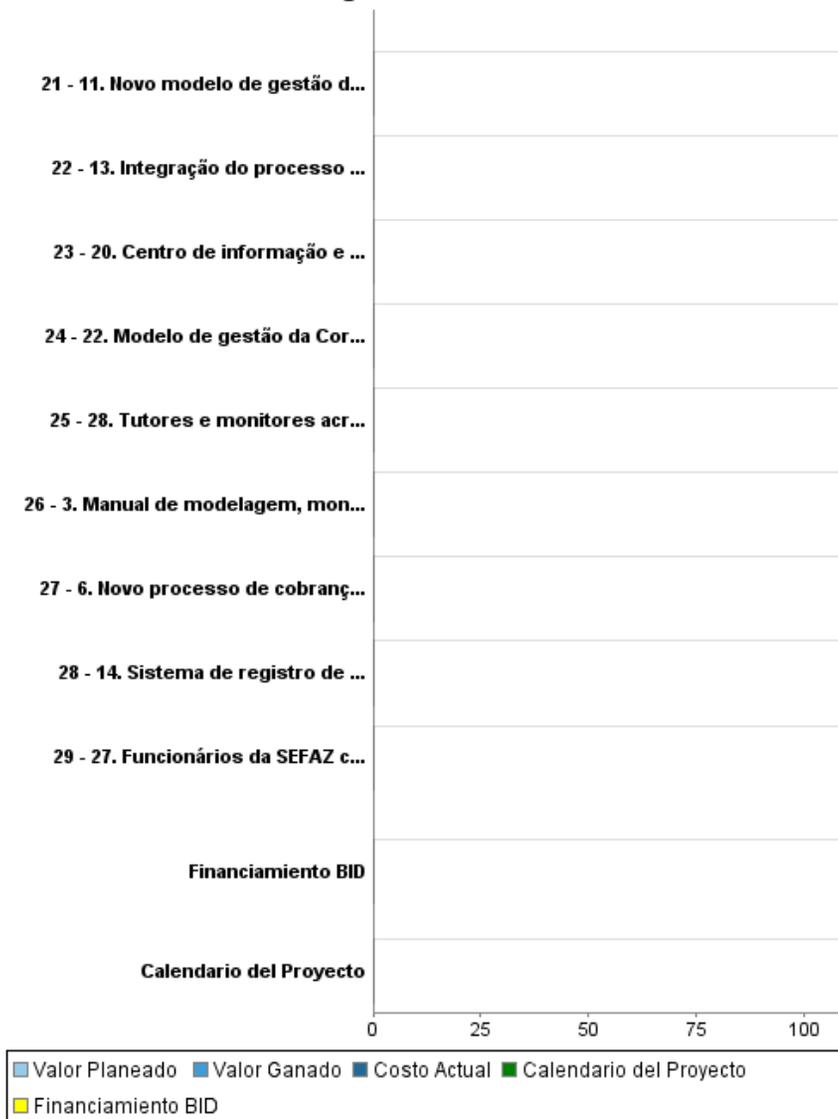

Resultados
Resultado: R1 - Aumento da arrecadação do ICMS

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Arrecadação do ICMS aumentada	R\$ bilhões	12,20	2011	P A			16,20		19,60	19,60

Resultado: R2 - Aumento da arrecadação do ITCD

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Arrecadação do ITCD aumentada	R\$ milhões	27,00	2012	P A					35,10	65,10

Resultado: R3 - Redução do tempo para obter informação da arrecadação

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Tempo transcorrido entre o pagamento do imposto e o registro da informação no sistema de arrecadação da SEFAZ reduzido	Horas	24,00	2011	P A					0,50	0,50

Resultado: R4 - Redução do tempo para os prazos dos processos de revisão fiscal

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Tempo transcorrido no prazo dos processos de revisão fiscal e das inspeções reduzido	dias	45,00	2011	P A					30,00	30,00

Resultado: R5 - Incremento do uso gerencial do ACP a partir da informação gerada pelo novo sistema de administração financeira

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Unidades da administração pública estatal adotando o sistema de destinação de gastos públicos (ACP)	Unidades administrativas	10,00	2011	P A					28,00	28,00

Resultado: R6 - Redução do custo de capacitação em temas de gestão fiscal

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Custo médio anual de capacitação por funcionário reduzido	R\$	450,00	2011	P A					225,00	225,00

Resultado: R7 - Aumento na capacitação de funcionários da administração tributária

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Funcionários da administração tributária capacitados	Funcionários por ano	201,00	2011	P A					550,00	550,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE I - Integração da Gestão Fiscal									
1. Projetos incorporados ao sistema de monitoramento sob a modalidade de BPMS	Projetos estratégicos monitorados				6,00				375.500,00
2. Processos estratégicos da SEFAZ com procedimentos mapeados por meio de ambientes Business Process Management System (BPMS)	Processos								375.500,00
3. Manual de modelagem, monitoramento e avaliação para projetos sob modalidade PPP confeccionado.	Manual de procedimento				1,00				375.500,00
4. Eventos de intercambio de experiências com as secretarias de fazenda de outros estados realizados	eventos				8,00				375.500,00
COMPONENTE II - Administração Tributária e do Contencioso Fiscal									
5. Módulo de conta corrente de contribuintes implantado	Módulo								764.000,00
6. Novo processo de cobrança administrativa implantado	Processo de cobrança				1,00				1.000.000,00
7. Unidade de estudos tributários criada	Unidade de estudos				1,00				1.000.000,00
8. Novo modelo de fiscalização do trânsito de mercadorias implantado	Modelo				1,00				1.000.000,00
9. Equipamento da área de inteligência fiscal com instrumentos modernos de fiscalização	Instrumentos tecnológicos de fiscalização				1,00				1.000.000,00
10. Informação sobre o índice de valor agregado (IVA) para cada município disponibilizada via web	Municípios com acesso à informação				417,00				1.000.000,00
11. Novo modelo de gestão do IPVA implantado	Modelo IPVA				1,00				1.000.000,00
12. Novo modelo de ITCD implantado	Modelo de ITCD				1,00				1.000.000,00
13. Integração do processo administrativo fiscal eletrônico com os sistemas da SEFAZ efetivada	Sistemas da SEFAZ ingregados				1,00				1.000.000,00
14. Sistema de registro de contribuintes da SEFAZ integrado com outras entidades mediante REDESIM	Entidades externas integradas				1,00				1.000.000,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
15. Contribuintes beneficiados mediante a implantação do DT-e (Domicilio tributário eletrônico)	Contribuintes				3.000,00				1.000.000,00
16. Bases do SPED disponibilizadas via web	Bases disponíveis				6,00				1.000.000,00
17. Processo administrativo tributário (e-PAT) integrado ao SPED	Processo				1,00				1.000.000,00
COMPONENTE III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno da Gestão Fiscal									
18. Unidades financeiras da administração pública estatal e da Superintendência de Administração Financeira (SAF) operando os processos de execução financeira e orçamentária de acordo com os novos procedimentos	Unidades financeiras				31,00				914.000,00
19. Sistema integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças - FIPLAN implantado	sistema FIPLAN				1,00				914.000,00
20. Centro de informação e memória criado	Centro de memória				1,00				914.000,00
21. Novo modelo de gestão de processos da Direção Geral implantado	Modelo de Gestão				1,00				914.000,00
22. Modelo de gestão da Corregedoria implantado	Modelo de Gestão				1,00				914.000,00
23. Novo modelo de auditoria governamental baseado em riscos implantado	Modelo de auditoria				3,00				914.000,00
COMPONENTE IV - Gestão de Recursos Corporativos									
24. Ferramentas de comunicação implantadas, mediante a melhora da qualidade do atendimento aos contribuintes	Ferramentas				1,00				5.200.000,00
25. Ações de comunicação implementadas, a partir da melhora na relação da SEFAZ com seus recursos humanos	ações de comunicação				5,00				5.200.000,00
26. Sistema de Informática da SEFAZ melhorado	Sistema				1,00				5.200.000,00
27. Funcionários da SEFAZ capacitados, uma vez incrementada a política de capacitação da SEFAZ	Funcionários capacitados anualmente				700,00				5.200.000,00
28. Tutores e monitores acreditados, para a prática de capacitação (Educação à Distância).	Tutores e monitores								5.200.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1319 - PROFISCO Programa Modernización y Fortalecim.Gestión Fiscal del Estado de Bahia
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
29. Novos instrumentos de regulamentação dos recursos humanos da SEFAZ implementados	Instrumento Legal				1,00				3.920.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO									
Gestão do Projeto	N/A								391.000,00
Monitoramento, avaliação e auditorias	N/A								239.000,00
TOTAL									50.300.000,00
