



Operation Number: **DR-L1053**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/31/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **11/06/2014**
Division Chief validation date: **11/07/2014**
Country Representative validation date: **11/07/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for Consolidation of the Social Protection System	Loan Number:	2733/OC-DR
Executing Agency (EA):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA		
Team Leader:	Parodi,Sandro	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1053	\$130,000,000.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1053	\$130,000,000.00	\$75,000,000.00	57.69%	\$55,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

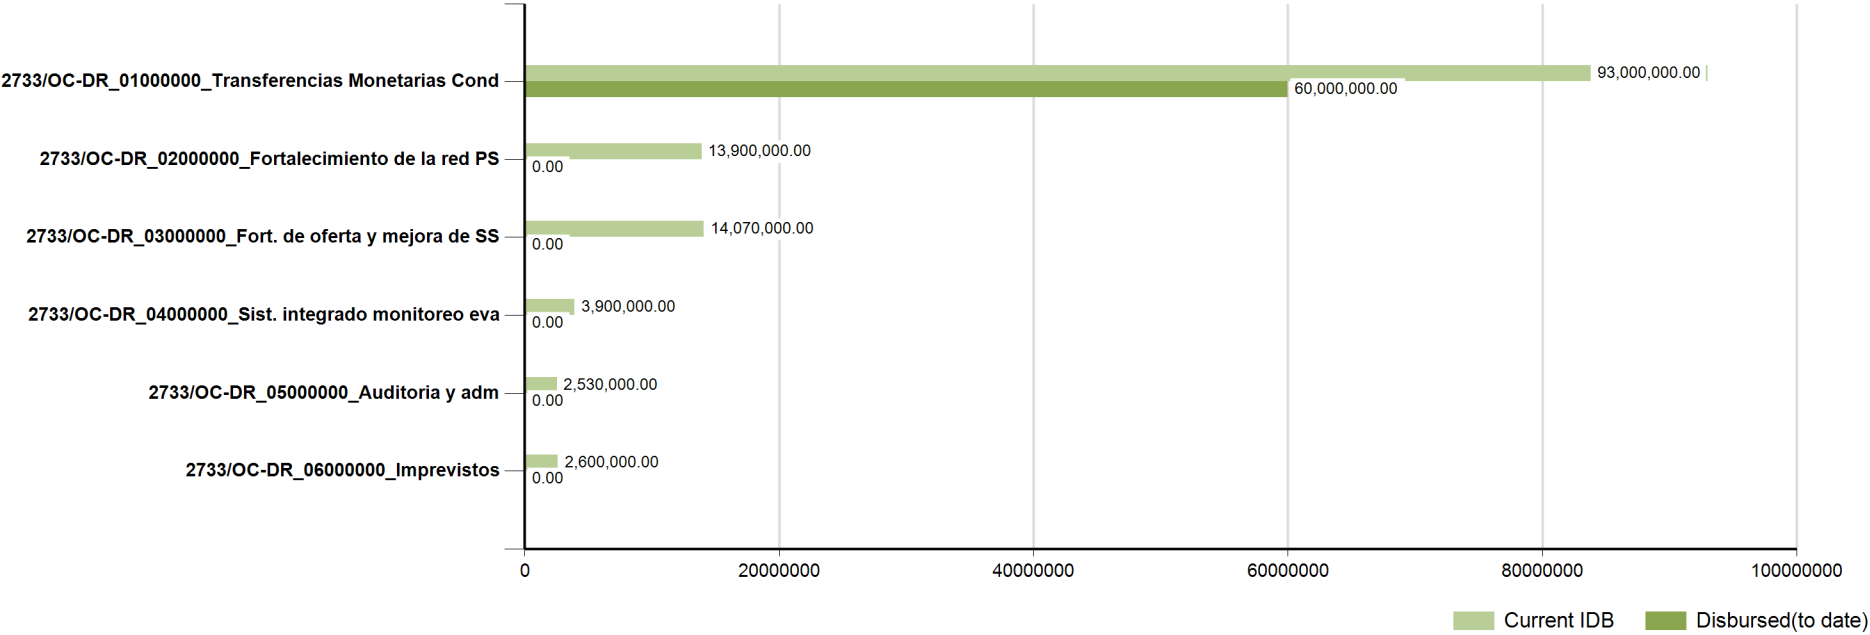

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad con menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Estatura promedio de niños y niñas en el rango de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad.		centímetros	99.30	2011	Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)		P	101.00
							P(a)	101.00
							A	
1.2 Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunación completa		porcentaje	28.50	2011	Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)		P	38.50
							P(a)	38.50
							A	
1.3 Tasa de sobreedad en media de estudiantes en hogares beneficiarios de Solidaridad		porcentaje	47.68	2011	Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)		P	40.00
							P(a)	40.00
							A	
1.4 Porcentaje de becarios de ILAE entre 18 y 19 años que completaron 12 años de escolaridad		porcentaje	16.80	2011	Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)		P	22.00
							P(a)	22.00
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Demanda de servicios de salud y educación de los beneficiarios de Solidaridad incrementada									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2014	EOP
1.1 Mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que llevaron al último niño nacido vivo a al menos un control en el centro de salud		porcentaje	56.80	2011	EEPS (varios años)		P		60.00	70.00
							P(a)		60.00	70.00
							A			

2.2 Costo administrativo del Programa Solidaridad como porcentaje del presupuesto total de Solidaridad		porcentaje	12.60	2011		Se ajusto la linea de base para reflejar informacion de ejecucion presupuestal recientemente provista por el gobierno. el dato anterior contenia informacion de lo presupuestado.	P	12.00	11.00	10.00
	P(a)						12.00	11.00	10.00	
	A									
2.3 Oficinas regionales de SIUBEN que funcionan como instancias operativas desconcentradas		oficinas	0.00	2011	Informe del status actual		P		2.00	10.00
	P(a)							2.00	10.00	
	A									
2.4 Estudiantes beneficiarios de ILAE con informacion de matriculacion registrada en el Sistema de Gestion de los Centros Educativos (SGCE)		porcentaje	0.00	2011	SGC y base de datos Solidaridad		P			75.00
	P(a)								75.00	
	A									
2.5 Hogares de Solidaridad con informacion de direccion de la vivienda actualizada		porcentaje	33.00	2011	Auditorias recurrentes		P			90.00
	P(a)								90.00	
	A									
Outcome:	3 Brechas de cobertura de salud reducida y calidad de los servicios de salud mejorada									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2014	EOP
3.1 Personal de salud que conoce el 80% o más de los contenidos de los protocolos de atención del primer nivel		porcentaje	13.20	2011	Evaluación independiente financiada por DR-L1047		P			35.00
	P(a)								35.00	
	A									

3.2 Hogares beneficiarios de Solidaridad que recibe atenciones en centros de salud habilitados		porcentaje	12.00	2011	Auditorias recurrentes		P			34.00
							P(a)			34.00
							A			
3.3 Hogares de Solidaridad cuyas atenciones de salud en el último trimestre fueron registradas en el SGC		porcentaje	2.90	2011	Sistema de Gestion Clinica (SGC)		P			50.00
							P(a)			50.00
							A			
Outcome:	4 Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación iniciado									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2014	EOP
4.1 Documentos de investigación sobre Protección Social		Documents	0.00	2011	Verificación directa GCPS/BID/ Banco Central		P			10.00
							P(a)			10.00
							A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Transferencias condicionadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación	Personas	P	303,519.00	1,568,179.00	P	18,000,000.00	93,000,000.00
		P(a)	387,829.00	1,568,179.00	P(a)	23,000,000.00	93,000,000.00
		A	0.00	1,180,350.00	A	0.00	70,000,000.00
Fortalecimiento de la red de proteccion social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Plataforma de Atención al Usuario del Sistema de Protección Social Unificada	Plataforma	P	1.00	1.00	P	2,500,000.00	2,500,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,000.00	30,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Nuevo modelo de focalización de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN) implementado	Modelo	P		1.00	P		480,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		80,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	80,000.00
Sistema permanente de actualización continua de Solidaridad instalado y funcionando	Sistema	P	1.00	1.00	P	3,000,000.00	3,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	100,000.00	3,100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Dispositivos móviles para la actualización permanente y seguimiento de la corresponsabilidad activados	dispositivos	P	1,200.00	1,200.00	P	2,200,000.00	2,200,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		11,782,929.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Personal gerencial, técnico, analítico y operativo de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN) capacitado	personas	P	165.00	165.00	P	330,000.00	330,000.00
		P(a)		165.00	P(a)		330,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas tecnológicos de Sistema Unico de Beneficiariois (SIUBEN) con certificados en normas de calidad	certificación	P	3.00	3.00	P	540.00	540.00
		P(a)		2.00	P(a)	80,000.00	540,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación operativa de Solidaridad implementada	evaluación	P	1.00	1.00	P	100,000.00	100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	20,000.00	220,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de información estadística para fines gerenciales implementado	sistema	P	1.00	1.00	P	470,000.00	470,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Personal de oficinas regionales y provinciales de Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) capacitados	personas	P	150.00	150.00	P	300,000.00	300,000.00
		P(a)		150.00	P(a)		300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Técnicos distritales capacitados en el uso del Sistema de Gestión de Centros Educativos (SGCE)	personas	P	457.00	457.00	P	800,000.00	800,000.00
		P(a)		457.00	P(a)		1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudio para identificar oportunidades de mejora en el SGCE implementado	estudio	P		1.00	P		70,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		70,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan de recuperación de datos en casos de desastre del Sistema de Protección Social diseñado	Plan	P	1.00	1.00	P	400,000.00	400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		400,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de Seguridad del Sistema de Protección Social desarrollado	Sistema	P	1.00	1.00	P	1,000,000.00	1,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud		Physical Progress			Financial Progress		

Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Establecimientos de salud del primer nivel habilitados	establecimientos	P	200.00	1,051.00	P	660,000.00	3,500,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		3,640,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Recursos humanos de atención en salud capacitados mediante nuevos módulos temáticos	personas	P	355.00	1,545.00	P	368,285.00	1,450,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		1,579,126.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudio de diagnóstico de las brechas de cobertura de los servicios de atención primaria en zonas urbanas y cierre de brecha realizado	estudio	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		205,255.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	55,255.00
Convenios de vinculación de módulos temáticos con las escuelas de enfermería y medicina firmados	convenios	P	1.00	3.00	P	210,000.00	810,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		850,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Convenios de gestión por resultados para las regionales de salud firmados	convenios	P	1.00	2.00	P	455,000.00	910,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	279,690.00	279,690.00
		A	5.00	5.00	A	128,616.00	128,616.00
Apoyo al Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluacion (SIME)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Informes de evaluación de los procesos transversales del Sistema de Protección Social realizados	informes	P	2.00	3.00	P	100,000.00	150,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	15,000.00	215,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Encuesta de Evaluación de la Protección Social 2014 implementada	base de datos	P		1.00	P		1,300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Módulos del (Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación) SIME desarrollados	módulos	P	2.00	3.00	P	500,000.00	900,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	20,000.00	1,220,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Tablero de control del SIME desarrollado	tablero	P	1.00	1.00	P	300,000.00	300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Tablero del control del Sistema de Gestión Clínica (SGC) desarrollado	tablero	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	20,000.00	20,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación de los impactos de la habilitación de los Centros de Atención Primaria (CAPs) realizada	evaluacion	P	1.00	1.00	P	300,000.00	300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		800,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudio experimental del uso de incentivos para aumentar la utilización del Sistema de Gestión Clínica realizado	estudio	P	1.00	1.00	P	150,000.00	150,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración e imprevistos							

Other Cost		2014	Cost
Honorarios personal de administración	P		
	P(a)	\$400,000.00	\$1,290,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Auditoría financiera	P	\$867,000.00	\$1,300,000.00
	P(a)	\$25,000.00	\$1,248,000.00
	A	\$23,014.00	\$46,014.00

Imprevistos	P		
	P(a)		\$2,600,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$33,010,825.00	\$116,220,540.00
	P(a)	\$23,989,690.00	\$87,101,940.00
	A	\$151,630.00	\$70,309,885.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Actualización cartografica del padrón de elegibles del SIUBEN	Create Milestone	Uno de los pilares del sistema de actualizacion permanente es que el SIUBEN cuente con una cartografia actualizada a fin de asegurar correspondencia entre la informacion que levantará Solidaridad y la que reporta el padrón del SIUBEN.	6/6/2014	4/1/2014
Output	Asistencia técnica para mejora de la operatividad	Create Milestone	Se agregó hito para capturar avance en el producto de la evaluación operativa.	6/6/2014	4/1/2014
Output	Asistencia tecnica para implementar mejora de procesos	Create Milestone	Se agregó hito para capturar avance en el producto de la certificación durante el 2014	6/6/2014	4/1/2014
Output	Contratación de la firma a cargo de la certificación	Create Milestone	Se agregó hito para capturar avance en el producto de la certificación durante el 2014	6/6/2014	4/1/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
