



Operation Number: **HA-L1078**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **5/5/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **05/06/2015**
Division Chief validation date: **05/07/2015**
Country Representative validation date: **05/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Private Sector Development through Investment Promotion	Loan Number:	2879/GR-HA,2879/GR-HA-1,2879/GR-HA-2
Executing Agency (EA):	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ,Centre de Facilitation des Investissemen ts,MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
Team Leader:	Arias Urones,Ana	Sector/Subsector:	EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HAITI
Borrower:	REPUBLIQUE D' HAITI	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HA-L1078	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HA-L1078	\$17,500,000.00	\$2,437,000.00	13.93%	\$15,063,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

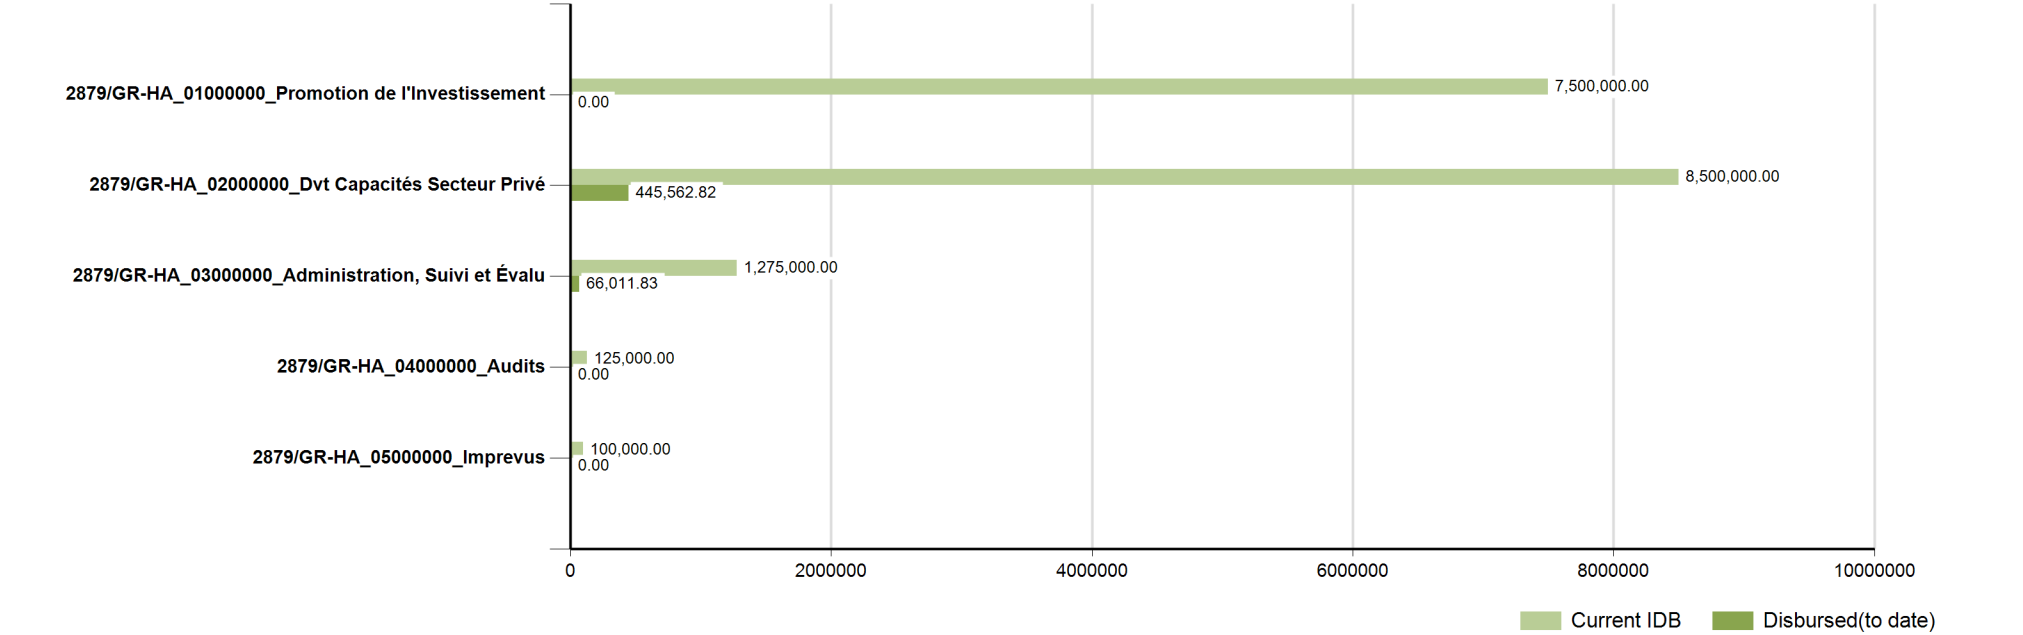

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Becoming a better Investment Facilitation Agency within the Caribbean										
Observation:	Global Investment Promotion Best Practices 2012 found that the responsiveness of investment promotion intermediaries to investor inquiries is low with 80 percent of IPIs not responding to sector-specific investor inquiries.										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
0.1 Score on World Bank's GIPB (Global Investment promotion Best Practices) ranking			Score	23.00	2013	World Bank GIPB		P			43.00
								P(a)			43.00
								A			
Impact:	1 FDI IN HAITI										
Observation:	FDI means Foreign Direct Investment										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
1.0 FDI (inward) flow attracted in Haiti (Annuel)			Millions of Dollars	190.00	2013	Annual Report UNCTAD		P			
								P(a)			250.00
								A			
1.1 FDI stock generated in Haiti (Annuel)			Million USD	1,114.40	2013	Annual Report UNCTAD		P			
								P(a)			1,390.00
								A			

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Service d'accompagnement des investisseurs amélioré									
Observation:	Cela implique les services de promotion, facilitation et études du Centre de Facilitation des Investissements (CFI)									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		EOP		
0.1 Compagnies intéressées à investir en Haïti qui ont été accompagnées par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI)		Compagnies	0.00	2013	Rapports semestriels sur la base du CRM effectués pour la Direction de Facilitation du CFI	1) Ajouté e lettre (mail) d'intérêt de la entreprise , 2) Le rapport du la Direction de Facilitation sera intégré dans le rapport semestriel du le Directeur du la Composante 1	P		300.00	
							P(a)		300.00	
							A			

0.1 Projets en mode Partenariats Publics Privés (PPP) financés par Investissements Directs Étrangers (IDE)		Projet mode PPP	0.00	2014	Rapports semestriels effectués pour l'UCGPPP à la BID		P	
							P(a)	3.00
							A	

Outcome:

1 Climat des affaires amélioré

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Projet de loi déposé au Conseil des Ministres et/ ou Réformes bureaucratiques de l'administration fiscale et d'autres entités du MEF réalisées		Document	0.00	2013	Informe Semestral del Director de la Componente 2 / MEF		P	10.00
							P(a)	9.00
							A	
1.1 Consultations des Institutions Financières à l'Agence d'Évaluation du Crédit selon les standards internationaux répandus		Consultation réalisés	0.00	2013	Informe del Bureau de Credit		P	
							P(a)	1,000.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Promotion des Investissements		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Le plan stratégique et le plan d'affaires du CFI élaborés (Mise en place et mise en œuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI)	Document	P	1.00	2.00	P	223,550.00	1,798,640.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	223,550.00	1,808,640.00
		A	0.00	0.00	A	145,346.50	151,346.50
Installation du système CRM version basic pour le suivi des demandes des investisseurs	Rapport d'utilisation du system	P	1.00	2.00	P	10,000.00	20,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	10,000.00	10,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Nouvelle Cadré Legal pour renforcer la capacité du CFI élaboré	Texte Juridique élaboré	P		1.00	P	55,000.00	255,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	55,000.00	255,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Nombre	P	1.00	3.00	P	51,000.00	247,000.00
		P(a)	1.00	50.00	P(a)	51,000.00	0.00
		A	50.00	50.00	A	0.00	0.00
Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Officials and Entrepreneurs	P		0.00	P		0.00
		P(a)		730.00	P(a)		247,000.00
		A	50.00	50.00	A	5,000.00	5,000.00
Installation du système CRM version avancée pour le suivi des demandes des investisseurs (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	License et Rapport d'utilisation du system	P	1.00	1.00	P	10,000.00	160,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	10,000.00	160,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Les équipements et outils technologiques installés	Equipement	P	12.00	24.00	P	135,000.00	227,200.00
		P(a)	12.00	24.00	P(a)	135,000.00	227,200.00
		A	12.00	12.00	A	51,075.58	51,075.58
La politique de coordination interinstitutionnelle avec l'UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de Partenariats Public-Privé (PPP) conçue	Ligne directrice (MOU entre le CFI et UCGPPP élaboré	P	1.00	1.00	P	10,000.00	77,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	10,000.00	77,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Développement de la politique de coordination interinstitutionnelle avec le secteur privé (Associations Professionnelles) haïtien	Ligne directrice	P	1.00	1.00	P		50,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Elaboration et application de la stratégie du GoH pour la promotion du pays en vue de l'attraction des investissements directs étrangers réalisé	Rapport (Initial et Annuels)	P	1.00	5.00	P	30,000.00	198,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	30,000.00	186,157.50
		A	1.00	1.00	A	5,000.00	5,000.00
Le plan de communication interne et externe du CFI et ses outils élaborés	Rapport Annuel	P	1.00	5.00	P	39,000.00	278,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	39,000.00	289,842.50
		A	1.00	1.00	A	6,842.50	6,842.50
La Guide des Investissements face aux potentiels Investisseurs étrangers rédigé	Guide	P	1.00	2.00	P	195,000.00	395,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	195,000.00	109,000.00
		A	0.00	0.00	A	9,000.00	9,000.00
Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé	Nombre de Nouveaux Services (Rapport Annuel)	P		1.00	P	10,000.00	110,000.00
		P(a)		6.00	P(a)	10,000.00	456,000.00
		A	0.00	0.00	A	60,000.00	60,000.00
Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Nombre de Actions ou Outils (Rapport Annuel)	P	2.00	8.00	P	521,408.00	1,270,600.00
		P(a)	2.00	6.00	P(a)	521,408.00	1,270,600.00
		A	2.00	2.00	A	131,978.72	131,978.72

Etudes de marche des secteurs stratégiques (BPO, AGRO, TEXTIL) pour favoriser l'attraction des investissements réalisés	Nombre Etude (Document Étude)	P		3.00	P	150,000.00	1,163,560.00
		P(a)		3.00	P(a)	150,000.00	1,163,560.00
		A	0.00	0.00	A	3,750.00	3,750.00
"Lead générations programs" oriente vers les marches (pays) pour l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Nombre de programmes Leads (Rapport)	P		3.00	P	60,000.00	520,000.00
		P(a)		4.00	P(a)	60,000.00	460,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Etudes effectuées pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Nombre d'Etudes (Rapport Annuel)	P		4.00	P	30,000.00	730,000.00
		P(a)		6.00	P(a)	30,000.00	730,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Private Sector Capacity Building		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Cadre légal et réglementaire pour les PPP et PP élaboré	Documents Légaux	P		2.00	P	128,035.20	260,544.00
		P(a)		2.00	P(a)	128,035.20	269,220.74
		A	0.00	0.00	A	32,178.14	32,178.14
Dossiers PPP et PP analysés	Dossiers PPP et PP	P		5.00	P	154,600.00	522,100.00
		P(a)		5.00	P(a)	154,600.00	504,820.75
		A	0.00	0.00	A	120,320.75	127,820.75
Equipes PPP à l'intérieur des UEP et Collectivités Territoriales installées	Nombre d'Equipes PPP	P		15.00	P		30,600.00
		P(a)		5.00	P(a)		41,202.51
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Études de faisabilité de projets PPP réalisées	Études	P		5.00	P	32,000.00	320,756.00
		P(a)		3.00	P(a)	32,000.00	408,756.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Système de suivi des PPP et PP établi	Rapport	P		1.00	P		20,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Page web de diffusion de mode de PPP créée	Page Web	P		1.00	P	53,000.00	78,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	53,000.00	8,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Rôle du MEF pour l'amélioration du climat des affaires défini	Rapport	P		1.00	P	50,000.00	150,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	50,000.00	138,076.05
		A	0.00	0.00	A	38,076.05	38,076.05
Renforcement des capacités de l'Unité de climat des affaires de MEF réalisé	Rapport	P		3.00	P	50,000.00	825,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	50,000.00	825,947.36
		A	0.00	0.00	A	50,947.36	53,947.36
Nombre de projets de loi et/ ou reformes bureaucratiques élaborés	Documents (Projet loi et /ou reforme bureaucratique)	P		9.00	P		1,005,000.00
		P(a)		9.00	P(a)		1,015,976.59
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Les axes d'accompagnement du gouvernement chilien pour la modernisation du SNIP définis	Rapport	P		4.00	P	170,000.00	988,331.84
		P(a)		1.00	P(a)	170,000.00	2,371,947.38
		A	0.00	0.00	A	48,125.21	48,125.21
Mécanismes d'accompagnement du S&E d'Ips établi	Rapports (Chaque Contrat)	P	2.00	7.00	P	121,000.00	384,000.00
		P(a)	2.00	7.00	P(a)	121,000.00	388,552.62
		A	1.00	1.00	A	58,552.62	63,052.62
Outils technologique et de formation pour la mise en œuvre du S&E d'Ips désigné et implémenté	Logiciel opérative	P		1.00	P		1,415,668.16
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00

Mise à niveau du logiciel pour répondre aux standards internationaux élaborés par l'IFC réalisé	Logiciel	P		1.00	P	250,000.00	400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	250,000.00	260,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mise en place et mise en œuvre d'un système et d'une plateforme avec l'adaptation du logiciel pour répondre aux besoins du secteur de la Microfinance réalisé	Logiciel	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mise en place et mise en œuvre d'une stratégie de vulgarisation des avantages du BC liée à une assistance technique pour développer une stratégie de lobby pour les principaux acteurs et les parlementaires afin d'aboutir au vote d'une Loi pour le BC réalisé	Evénements de vulgarisation et lobby	P	1.00	5.00	P	50,000.00	300,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	50,000.00	440,000.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Plan d'affaires des mPM entreprises accompagnés	Rapports	P		300.00	P	75,000.00	910,500.00
		P(a)		0.00	P(a)	75,000.00	27,500.00
		A		0.00	A	27,500.00	27,500.00
Chaines de Valeur développés	Chaines de Valeur	P		18.00	P	20,000.00	196,500.00
		P(a)		0.00	P(a)	20,000.00	0.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Nouveaux idées de projets entrepreneuriaux de jeunes et femmes entrepreneurs accompagnés	Nouveaux idées de projets	P		12.00	P	20,000.00	196,500.00
		P(a)		0.00	P(a)	20,000.00	0.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
mPME qu'on accès au crédit (Nombre)	mPME qu'on accès au crédit	P		150.00	P	20,000.00	196,500.00
		P(a)		0.00	P(a)	20,000.00	0.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Administration, Monitoring and Evaluation							

Other Cost		2014	Cost
Project Execution Unit at UCP/MEF	P	\$71,400.00	\$691,600.00
	P(a)	\$71,400.00	\$708,476.68
	A	\$65,375.68	\$70,375.68
Project Execution Unit at CFI	P	\$105,250.00	\$436,920.00
	P(a)	\$105,250.00	\$450,000.00
	A	\$58,607.06	\$62,527.06
Monitoring and Evaluation	P	\$15,000.00	\$100,000.00
	P(a)	\$15,000.00	\$216,523.32
	A	\$0.00	\$0.00
Financial Audits	P		\$125,000.00
	P(a)		\$125,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
CDEE Consultants	P		\$0.00
	P(a)		\$1,500,000.00
	A	\$117,464.02	\$117,464.02
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$2,915,243.20	\$17,353,520.00
	P(a)	\$2,915,243.20	\$13,241,025.93
	A	\$1,035,140.19	\$1,065,060.19

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Le plan stratégique et le plan d'affaires du CFI élaborés (Mise en place et mise en œuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI)	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera. Corrección de cifras según gastos comunicados por la UE	4/30/2015	4/30/2015
Output	"Lead générations programs" oriente vers les marches (pays) pour l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Financial P(a) value	Corrección de cifras según gastos comunicados por la UE	4/30/2015	4/30/2015
Output	Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera. Corrección de cifras según gastos comunicados por la UE	4/30/2015	4/30/2015
Output	Le plan de communication interne et externe du CFI et ses outils élaborés	Modify Financial P(a) value	Corrección de cifras según gastos comunicados por la UE	4/30/2015	4/30/2015
Output	Elaboration et application de la stratégie du GoH pour la promotion du pays en vue de l'attraction des investissements directs étrangers réalisé	Modify Financial P(a) value	Corrección de cifras según gastos comunicados por la UE	4/30/2015	4/30/2015
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Create Output	Se inactivo el producto y se activo de nuevo (con las consiguiente modificación en hito y financiero) según recomendación de SPD para asegurar la trazabilidad	4/30/2015	4/30/2015
Output	Le formation basé sur les meilleures pratiques des API's réalisé	Create Milestone	Se inactivo el producto y se activo de nuevo (con las consiguiente modificación en hito y financiero) según recomendación de SPD para asegurar la trazabilidad	4/30/2015	4/30/2015
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Inactivate Output	Se inactivo el producto y se activo de nuevo (con las consiguiente modificación en hito y financiero) según recomendación de SPD para asegurar la trazabilidad	4/30/2015	4/30/2015
Outcome	Projet de loi déposé au Conseil des Ministres et/ ou Reformes bureaucratiques de l'administration fiscale et d'autres entités du MEF réalisées	Modify Indicator name	En primer lugar se ha procedido ha organizar los resultados de manera que se puede realizar un seguimiento mas preciso de los Resultados Esperados. Al mismo tiempo se han definiendo de manera mas concreta los indicadores para permitir un monitoreo mas adecuado del proyecto. En segundo lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas ha decido centrar los esfuerzos en de mejora de Clima de Negocios en las áreas (Administración Fiscal) de su estricta responsabilidad.	4/17/2015	4/8/2015
Impact	FDI stock generated in Haití (Annuel)	Modify Means of Verification	Es la modificación para incluir la fuente de verificación del nuevo indicar de resultado.	4/16/2015	4/8/2015
Output	La Guide des Investissements face aux potentiels Investisseurs étrangers rédigé	Modify Financial P(a) value	El "Cost" se ajusta con respecto a la experiencia de la Guia 2015.	4/16/2015	4/8/2015
Output	Etude "Trading from Haití to the world" réalisé	Delete Milestone	Este hito se integra en el producto "Etudes effectues pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)" como un estudio mas a realizar por el departamento de estudios	4/16/2015	4/8/2015
Output	Etude sur open data réalisé	Delete Milestone	Este hito se integra en el producto "Etudes effectues pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)" como un estudio mas a realizar por el departamento de estudios	4/16/2015	4/8/2015

Output	Etude sur l'acces au credit realise	Delete Milestone	Este hito se integra en el producto "Etudes effectues pour le departement d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements realises (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)" como un estudio mas a realizar por el departamento de estudios	4/16/2015	4/8/2015
Output	"Lead generations programs" oriente vers les marches (pays) pour l'attraction des investissements realises (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Unit of Measure	Redacción del producto clarificada. El CFI gracias a los avances del 2014 identifica de manera mas precisa el resultado esperado del producto	4/16/2015	4/8/2015
Output	Etudes de marche des secteurs strategiques (BPO, AGRO, TEXTIL) pour favoriser l'attraction des investissements realises	Modify Unit of Measure	Redacción de la unidad de medida clarificada en funcion de la moficación redacción del producto	4/16/2015	4/8/2015
Output	Etudes de marche des secteurs strategiques (BPO, AGRO, TEXTIL) pour favoriser l'attraction des investissements realises	Modify Output name	Redacción del producto clarificada. El CFI en función de los avances del 2014 ha definido con claridad los sectores estrategicos.	4/16/2015	4/8/2015
Output	Participation dans des evenements commerciaux internatiaux realise	Modify Unit of Measure	Redacción de la unidad de medida clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Mission comercial direct et reciproque realise	Modify Unit of Measure	Redacción de hito clarificado	4/16/2015	4/8/2015
Output	Evenements d'atraccion des investissements realise	Modify Unit of Measure	Redacción de la unidad de medida clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Evenement de promotion du "Connect Americas" (en Haití et à l'Exteriure) realise	Modify Unit of Measure	Redacción de la unidad de medida clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Actions et outils pour renforcer le departement du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Unit of Measure	Unidad de medida clarificada en función de la modificación en la redacción del producto	4/16/2015	4/8/2015
Output	Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du departement de FACILITATION de CFI realise	Modify Physical P(a) value	El valor clarificado. Refleja el cambio de P(a) 1 (medida de un solo un servicio) a un P(a)6 (el numero de nuevos servicios que el departamento de facilitación espera poner a disposición)	4/16/2015	4/8/2015
Output	Le manuel de protocole elabore	Delete Milestone	Este hito se integra en el hito "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels realises"	4/16/2015	4/8/2015
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Modify Physical P(a) value	Esta modificación del valor es consecuencia de la redacción del nuevo producto. Inicialmente se esta midiendo el numero de formaciones en mejores practicas de API's -P(a) 3 (Que incluso se incrementan en el nuevo hito a 7 según los avances del 2014) por uno mas racional que es el numero de funcionarios y miembros del sector privado formados -P(a) 730.00-.	4/16/2015	4/8/2015
Output	Documents d'informations pour les investisseurs potentiels realises	Modify Milestone name	Redaccion de hito clarificada. Según se ha explicado engloba a otros hitos	4/16/2015	4/8/2015
Output	Etudes effectues pour le departement d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements realises (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Physical P(a) value	La medida ajustada a la nueva redacción del producto. En consecuencia se cambia la medida de informe anual a numero de estudios realizados. Unidad de medida que el CFI ve mas racional y ajustada a la nueva redacción del producto racionalizado	4/16/2015	4/8/2015

Output	Etudes effectues pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Unit of Measure	Unidad de medida clarificada (Numero de estudios) en base al cambio de redacción del producto	4/16/2015	4/8/2015
Output	Etudes effectues pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Output name	Redacción del producto clarificada para medir los estudios realizados por el departamento de estudios en línea de apoyar al resto de departamentos del CFI o sobre demandas específicas para la atracción de la FDI. Este producto integra todos los productos e hitos que contenían servicios de facilitación. En definitiva supone un producto racionalizado	4/16/2015	4/8/2015
Output	"Lead générations programs" oriente vers les marches (pays) pour l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Output name	Redacción del producto clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Panel de Présentation au Forum des Entrepreneurs Corée-LAC réalisé	Delete Milestone	Este hito se integra en el hito "Participation dans des evenements commerciaux internatinaux réalisé"	4/16/2015	4/8/2015
Output	Misión comercial a Corée réalisé	Delete Milestone	Este hito se integra en el hito "Mission comercial direct et reciproque réalisé"	4/16/2015	4/8/2015
Output	Evenement de promotion du "Connect Americas" (en Haïti et à l'Exteriure) réalisé	Modify Milestone name	Redacción de hito clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Output name	Redacción del producto clarificada para medir las nuevas acciones y herramientas para la promoción de inversiones y la atracción de la FDI. Este producto integra todos los productos e hitos que contenían servicios de facilitación. En definitiva supone un producto racionalizado	4/16/2015	4/8/2015
Output	La base de donne des fournisseurs locaux certifiés élaboré	Modify Unit of Measure	Unidad de medida clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Modify Unit of Measure	Unidad de medida clarificada /ajustada según la redacción del nuevo producto "Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes"	4/16/2015	4/8/2015
Output	Etudes pour la facilitation des investissements réélises	Create Milestone	Este hito se redactó y luego se cambió la redacción al hito "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réélises" (en este último se explicará los cambios)	4/16/2015	4/8/2015
Output	L'etude de taxation et cout la main d'oeuvre élaboré	Delete Milestone	Este hito se redactó y luego se elimino integrado en el hito "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réélises"	4/16/2015	4/8/2015
Output	L'etude sur la disponibilité d'emplacement de terrain industriel apropié élaboré	Delete Milestone	Este hito se redactó y luego se elimino integrado en el hito "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réélises"	4/16/2015	4/8/2015

Output	Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé	Modify Unit of Measure	Unidad de medida clarificada (Es la medida de los nuevos servicios puestos a disposición de los inversores para facilitar la realización de su inversion y la atracción de la FDI)	4/16/2015	4/8/2015
Output	Mise en œuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé	Modify Output name	Redacción del producto clarificada para medir los nuevos servicios puestos a disposición de los inversores para facilitar la realización de su inversion y la atracción de la FDI. Este producto integra todos los productos e hitos que contenían servicios de facilitacion. En definitiva supone un producto racionalizado	4/16/2015	4/8/2015
Output	La page web du CFI opérative et actualisé	Modify Milestone name	Redacción de hito clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Session de formation en l'attraction des investissements pour les Représentants du Secteur Privée réalisé	Delete Milestone	Este hito se inserto y luego se elimino para incluirlo en el producto "Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes" como producto racionalizado	4/16/2015	4/8/2015
Output	Session de formation en l'attraction des investissements pour les Fonctionnaires du Secteur Public réalisé	Delete Milestone	Este hito se inserto y luego se elimino para incluirlo en el producto "Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes" como producto racionalizado	4/16/2015	4/8/2015
Output	Le formation basé sur les meilleures pratiques des API's réalisé	Modify Unit of Measure	Unidad de medida clarificada (es el numero de Agencias de Promoción de Inversiones con las que esta planificado realizar intercambios de formación en base a las mejores prácticas internacionales)	4/16/2015	4/8/2015
Output	Le formation basé sur les meilleures pratiques des API's réalisé	Modify Milestone name	Este hito (anterior producto) se integra en el nuevo producto "Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes" puesto que es una de los modos de formación que el CFI quiere privilegiar.	4/16/2015	4/8/2015
Output	Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes	Modify Output name	Este producto integra todas las acciones de formación dispersas en varios productos ofreciendo una medida mas precisa y según los requerimientos de la división INT/TIU. En consecuencia no supone un cambio de fondo sino en la redacción con el fin de racionalizar los producto (integrando de esta forma todas las acciones de formación y facilitando al CFI y al BID el monitoreo mas preciso de las acciones de formación).	4/16/2015	4/8/2015
Output	Le plan stratégique et le plan d'affaires du CFI élaborés (Mise en place et mise en œuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI)	Modify Output name	Redacción de Producto clarificada	4/16/2015	4/8/2015
Output	Atelier avec CEI-RD pour la selection du meilleure logiciel CRM réalisé	Delete Milestone	Este hito se integra en otro "Le formation basé sur les meilleures pratiques des API's réalisé".	4/16/2015	4/8/2015
Output	Equipes PPP à l'intérieur des UEP et Collectivités Territoriales installées	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera	4/15/2015	4/8/2015
Output	Mise en place et mise en œuvre d'une stratégie de vulgarisation des avantages du BC liée à une assistance technique pour développer une stratégie de lobby pour les principaux acteurs et les parlementaires afin d'aboutir au vote d'une Loi pour le BC réalisé	Modify Financial P(a) value	El "Cost" se ajusta porque la BRH ha decidido reasignar 40k provenientes del producto "Mise à niveau du logiciel pour répondre aux standards internationaux élaborés par l'IFC réaliser" que no se van utilizar en este.	4/15/2015	4/8/2015
Output	Mise à niveau du logiciel pour répondre aux standards internationaux élaborés par l'IFC réalisé	Modify Financial P(a) value	El "Cost" se ajusta según los avances del 2014	4/15/2015	4/8/2015
Output	Mécanismes d'accompagnement du S&E d'Ips établi	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera	4/15/2015	4/8/2015
Output	Nombre de projets de loi et/ ou reformes bureaucratiques élaborés	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera	4/15/2015	4/8/2015
Output	Renforcement des capacités de l'Unité de climat des affaires de MEF réalisé	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera	4/15/2015	4/8/2015
Output	Rôle du MEF pour l'amélioration du climat des affaires défini	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera	4/15/2015	4/8/2015
Output	Études de faisabilité de projets PPP réalisées	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera	4/15/2015	4/8/2015

Output	Dossiers PPP et PP analysés	Modify Financial P(a) value	El "Cost" queda invariable es un ajusta la proyección financiera	4/15/2015	4/8/2015
Output	Outils technologique et de formation pour la mise en œuvre du S&E d'ips désigné et implémenté	Inactivate Output	Este producto se ha inactivado porque el MEF esta recibiendo el apoyo del FMI, BM y UE en esta materia (estos apoyos se definieron con posterioridad al inicio de la operación) en un proceso que comporta la creación de una cuenta unica del tesoro, la creación de un esquema director informático.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Plan d'affaires des mPM entreprises accompagnés	Inactivate Output	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Chaines de Valeur développés	Inactivate Output	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Nouveaux idées de projets entrepreneuriaux de jeunes et femmes entrepreneurs accompagnés	Inactivate Output	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/9/2015	4/8/2015
Output	mPME qu'on accès au crédit (Nombre)	Inactivate Output	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Plan de Travail defini	Create Milestone	Este hito se introduce por la necesidad de la CRFP de consensuar internamente el plan de trabajo que sirva como base para el acuerdo marco de colaboración con el Gobierno de Chile en materia de modernización del SNIP / seguimiento de las IP's	4/9/2015	4/8/2015
Output	Atelier de restitution réalisé	Create Milestone	Este hito se introduce por la necesidad de la CRFP de compartir el informe de mision a chile para realizar la coordinación con el resto de donantes y de esta manera tener todos los insumos necesarios para definir el plan de trabajo / colaboración con el Gobierno de Chile en materia de modernización del SNIP	4/9/2015	4/8/2015
Output	Mission d'orientation au Chili	Modify Unit of Measure	Unidad de medida clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	Les axes d'accompagnement du gouvernement chilien pour la modernisation du SNIP definis	Modify Physical P(a) value	La unidad de medida es clarificada en consecuencia al cambio de redacción del producto puesto que de los 4 informes anuales sobre el avance del SNIP en estos momentos lo que se busca en un único (1) informe que sirva como base para solicitar un marco de colaboración con el gobierno de chile.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Mission d'orientation au Chili	Modify Milestone name	Se introdujo este hito como primera etapa para establecer "Les axes d'accompagnement du gouvernement chilien pour la modernisation du SNIP definis "	4/9/2015	4/8/2015
Output	Les axes d'accompagnement du gouvernement chilien pour la modernisation du SNIP definis	Modify Unit of Measure	Redacción de la Unidad de Medida Clarifica en función de la clarificación en la redacción del producto	4/9/2015	4/8/2015
Output	Les axes d'accompagnement du gouvernement chilien pour la modernisation du SNIP definis	Modify Output name	El MEF decidió que era necesario continuar con los esfuerzos emprendidos en el marco de la Comisión de Reforma de Finanzas Públicas (CRFP). En el seno de la misma se encuentra la sub-comisión de modernización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) donde se enmarca el seguimiento de las inversiones públicas (IP's) . La CRFP había decido adoptar el modelo chileno de SNIP (por ende de seguimiento de IP's) y adaptarlo en Haití. El resultado de los trabajos proporcionara la base para definir cual es el marco de colaboración con el Gobierno de Chile. En paralelo el MEF encargo al Banco Mundial un informe que se ha realizado y que incluye lo inicialmente propuesto por el MEF en la redacción inicial del producto. Esto implica que la redacción del producto queda clarificada.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Page web de diffusion de mode de PPP créée	Modify Unit of Measure	En consecuencia al cambio de redacción del producto la unidad de medida es clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	Page web de diffusion de mode de PPP créée	Modify Output name	Redacción del producto clarificada para racionalizar el producto (en el POA inicial se contemplaron recursos para un Forum PPP ahora financiado por la IFC del Grupo del Banco Mundial) y adaptar de esta forma la redacción a la planificación final del MEF en base a la reasignacion de recursos de los diferentes donantes.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Equipes PPP à l'intérieur des UEP et Collectivités Territoriales installées	Modify Physical P(a) value	En base a los avances del 2014 (en el marco del proceso de la redacción de la ley y los decretos de aplicación), esos trabajos el MEF revisa sus expectativas 2015/2018 decidiendo constituir un numero de equipos PPP solo en los ministerios clave según las recomendaciones de los avances del 2014	4/9/2015	4/8/2015

Output	Le support à l'initiative du Secteur Privé pour l'extension de la Loi HOPE réalisé	Modify Milestone name	Redacción del hito clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	La formation et opérationnalisation des Attachés Commerciaux à l'extérieur orientée vers l'attraction des investissements réalisée	Modify Milestone name	Redacción del hito clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	Le manuel de formation pour le réseau des Attachés Commerciaux à l'extérieur élaboré	Modify Milestone name	Redacción del hito clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	Elaboration et application de la stratégie du GoH pour la promotion du pays en vue de l'attraction des investissements directs étrangers réalisé	Modify Output name	Redacción del producto clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	Développement de la politique de coordination interinstitutionnelle avec le secteur privé (Associations Professionnelles) haïtien	Modify Output name	Redacción del producto clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	La politique de coordination interinstitutionnelle avec l'UGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de Partenariats Public-Privé (PPP) conçue	Modify Unit of Measure	Redacción del producto clarificada	4/9/2015	4/8/2015
Output	Installation du système CRM version avancée pour le suivi des demandes des investisseurs (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Unit of Measure	En consecuencia con el cambio en la redacción del `producto por su racionalización. La unidad de medida ajustada para reflejar mejor el producto	4/9/2015	4/8/2015
Output	Installation du système CRM version avancée pour le suivi des demandes des investisseurs (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)	Modify Output name	Se modifico la redacción porque inicialmente el producto era "Le système CRM de suivi des demandes des investisseurs qu'inclura aussi statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe opérationnalisé" (Rapport d'utilisation du system) habiendo un segundo producto denominado "Le système CRM installé" (License). El CFI considero que era necesario racionalizar los productos de manera que se hiciera referencia a una versión básica y otro de versión avanzada.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Installation du système CRM version basic pour le suivi des demandes des investisseurs	Modify Physical P(a) value	Debido a la racionalización del producto "Le système CRM de suivi des demandes des investisseurs qu'inclura aussi statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées parsexe opérationnalisé " en dos versiones básica y avanzada. En consecuencia el P(a) pasa de 2 (que incluía la versión básica y avanzada) a 1 (solo versión básica).	4/9/2015	4/8/2015
Output	Installation du système CRM version basic pour le suivi des demandes des investisseurs	Modify Output name	Se modifico la redacción porque inicialmente el producto era "Le système CRM de suivi des demandes des investisseurs qu'inclura aussi statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe opérationnalisé" (Rapport d'utilisation du system) habiendo un segundo producto denominado "Le système CRM installé" (License). El CFI considero que era necesario racionalizar los productos de manera que se hiciera referencia a una versión básica y otro de versión avanzada.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Elaboration de la politique de coordination avec les autres institutions étatiques pour partager la mission et vision du CFI	Create Milestone	Este hito se introduce por la necesidad de tener un documento guía para desarrollar el rol de coordinación del CFI con otras instituciones del estado.	4/9/2015	4/8/2015
Output	Réalisation des cours de formation continue donnés par le conseiller spécial au personnel du CFI sur la formation aux institutions du GoH en matière de Commerce et Investissements et qui considèrent les questions de genre	Modify Milestone name	Error la transcripción del hito se corrige posteriormente como "Réalisation des cours de formation continue donnés par le conseiller spécial au personnel du CFI sur la formation aux institutions du GoH en matière de Commerce et Investissements et qui considèrent les questions de genre" donde se explicara la modificación.	4/9/2015	4/8/2015

Output	Système de suivi des PPP et PP établi	Inactivate Output	El MEF decidio que habia que suprimir este producto pués se encuentra englobado en la acción que el propio MEF realiza de seguimiento de las inversiones públicas a través del sub-componente de seguimiento de inversiones públicas	4/7/2015	4/8/2015
Output	Mode PPP et PP comme alternatives de financement (pour les secteurs d'affaires et le secteur public) reconnu	Modify Financial P(a) value	El "Cost" resta invariable y se realiza un ajuste entre lo realizado en el 2014 y lo reajustes 2015/2018	4/7/2015	4/8/2015
Output	Système de suivi des PPP et PP établi	Modify Financial P(a) value	El MEF decidio que habia que suprimir este producto pués se encuentra englobado en la acción que el propio MEF realiza de seguimiento de las inversiones públicas a través del sub-componente de seguimiento de inversiones públicas	4/7/2015	4/8/2015
Output	Cadre légal et réglementaire pour les PPP et PP élaboré	Modify Financial P(a) value	El "Cost" resta invariable y se realiza un ajuste entre lo realizado en el 2014 y lo reajustes 2015/2018	4/7/2015	4/8/2015
Output	mPME qu'on accès au crédit (Nombre)	Modify Financial P(a) value	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/7/2015	4/8/2015
Output	Nouveaux idées de projets entrepreneuriaux de jeunes et femmes entrepreneurs accompagnés	Modify Financial P(a) value	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/7/2015	4/8/2015
Output	Chaines de Valeur développés	Modify Financial P(a) value	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/7/2015	4/8/2015
Output	Plan d'affaires des mPM entreprises accompagnés	Modify Financial P(a) value	Ce produits sont relatifs aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le coûts de ces consultants sera passé comme centre de coûts.	4/7/2015	4/8/2015
Output	Le système CRM (Provisoire et Definitif) de suivi des demandes des investisseurs qu'inclura aussi statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe opérationnalisés	Modify Financial P(a) value	Se cambio con posterioridad la redacción del Ouput dejando invalidada esta modificación	4/7/2015	4/8/2015
Impact	FDI stock generated in Haïti (Annuel)	Create Impact Indicator	Redacción del indicador de impacto clarificada	4/6/2015	4/8/2015
Impact	FDI (inward) flow attracted in Haiti (Annuel)	Modify Indicator name	Redacción del indicador de impacto clarificada	4/6/2015	4/8/2015
Impact	FDI IN HAITI	Modify Statement	Se elimino de la redacción CEPAL porque se considero que la UNCTAD es un medio de verificación que proporciona herramientas , series históricas mas adecuadas para medir el impacto como se ha explicado en su creación.	4/6/2015	4/8/2015
Impact	FDI stock generated	Delete Impact	Se deshace el nuevo impacto por que lo que se queria era crear un nuevo indicador	4/6/2015	4/8/2015
Impact	FDI stock generated	Create Impact	Por un error se creo un nuevo impacto cuando lo que se quería era crear un indicador.	4/6/2015	4/8/2015
Impact	Annual report of UNCTAD	Modify Means of Verification	Es el medio de verificación mas solido y que permite poder medir el FDI a nivel global y de manera particular en Haïti (en concordancia con el nuevo impacto "FDI IN HAITI". Además proporciona (con herramientas de análisis) una serie histórica y actualizada cada año que permite establecer la línea de base y asegurar una medida correcta de este impacto.	4/6/2015	4/8/2015
Impact	Annual report of UNCTAD	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Es la línea de base que proporciona el informe anual de la UNCTAD que es la referencia mas fiable para poder medir el FDI a nivel global y de manera particular en Haïti. Además proporciona una serie histórica y actualizada cada año que permite establecer la línea de base y asegurar una medida correcta de este impacto.	4/6/2015	4/8/2015
Impact	Global Competitiveness and Business Impact of rules in FDI	Delete Impact	Este impacto se reagrupa en "FDI IN HAITI" ofreciendo un resultado mas certero para poder medir de manera adecuada el impacto de la operación. De esta manera se puede medir mejor el impacto en términos de promoción de la inversión en consonancia con el objetivo del proyecto.	4/6/2015	4/8/2015
Impact	Foster private sector development in Haiti	Delete Impact	Este impacto se reagrupa en "FDI IN HAITI" ofreciendo un resultado mas certero para poder medir de manera adecuada el impacto de la operación. De esta manera se puede medir mejor el impacto en términos de promoción de la inversión en consonancia con el objetivo del proyecto.	4/6/2015	4/8/2015

Outcome	Reformes bureaucratiques de l'administration fiscale réalisées	Modify EOP P(a)	Planificación revisada en base a los avances del 2014 y expectativas 2015/2018 bajo e liderazgo del nuevo responsable de la sub-componente de Clima de Negocios según las orientaciones del nuevo Ministro de Economía y Finanzas.	4/2/2015	4/8/2015
Output	Études de faisabilité de projets PPP réalisées	Modify Physical P(a) value	Planificación revisada en base a los avances del 2014 y expectativas 2015/2018 bajo e liderazgo de la nueva Directora del CFI.	4/2/2015	4/8/2015
Output	Le "lead générations programs" sur les promotions de joint-ventures avec entrepreneurs locaux - étrangers et pour l'attraction des investissements et capacités de la diaspora haïtienne et des secteurs clés qui privilégient entreprises des femmes ou avec grande participation des femmes sont développés	Modify Physical P(a) value	Planificación revisada en base a los avances del 2014 y expectativas 2015/2018 bajo e liderazgo de la nueva Directora del CFI.	4/2/2015	4/8/2015
Output	Participation dans des evenements commerciaux internatiaux réalisé	Create Milestone	Este hito se incluye porque es una de las acciones estándar en las buena práctica internacional de API's dentro de los departamentos de facilitación. El mismo se incluye en el nuevo producto "Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Mission commerciale direct et reciproque réalisé	Create Milestone	Este hito se incluye porque es una de las acciones estándar en las buena práctica internacional de API's dentro de los departamentos de facilitación. El mismo se incluye en el nuevo producto "Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Evenements d'atraccion des investissements réalisé	Create Milestone	Este hito se incluye porque es una de las acciones estándar en las buena práctica internacional de API's dentro de los departamentos de facilitación. El mismo se incluye en el nuevo producto "Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Evenement de lancement du "Connect Americas"	Create Milestone	Este hito se redacta posteriormente de nuevo con la redacción "Evenement de promotion du "Connect Americas" (en Haïti et à l'Exterieur) réalisé" en donde se precisaran las motivaciones de la modificación	4/2/2015	4/8/2015
Output	Etude "Trading from Haïti to the world" réalisé	Create Milestone	Este hito engloba en un producto denominado "Etudes effectuées pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)"	4/2/2015	4/8/2015

Output	Etude sur open data réalisé	Create Milestone	Este hito engloba en un producto denominado "Etudes effectues pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Etude sur l'accès au crédit réalisé	Create Milestone	Este hito engloba en un producto denominado "Etudes effectues pour le département d'Etudes en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS fourni (avec la comptabilisation des entreprises de femmes)	Modify Physical P(a) value	Se ajusta la redacción posteriormente "Mise en oeuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé". En ese momento se explicara la modificación y el cambio de valor.	4/2/2015	4/8/2015
Output	Session de formation en l'attraction des investissements pour les Représentants du Secteur Privée réalisé	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino para englobarse en un producto denominado "Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Session de formation en l'attraction des investissements pour les Fonctionnaires du Secteur Public réalisé	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino para englobarse en un producto denominado "Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Panel de Présentation au Forum des Entrepreneurs Corée-LAC réalisé	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino al englobarse en uno denominado "Participation dans des evenements commerciaux internatiaux réalisé"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Misión comercial a Corée réalisé	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino al englobarse en uno denominado "Mission Comercial Direct et Reciproques réalisé"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Matériel de Promotion élaboré	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino para englobarse en uno denominado "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réalises"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Le système de missions commerciales, foires commerciales et forums (en Haïti et à l'étranger) pour la promotion des investissements conçu	Create Milestone	Se transforma en un hito este producto dentro del producto Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)" en un esfuerzo de razionalización de productos	4/2/2015	4/8/2015
Output	L'etude sur la disponibilité d'emplacement de terrain industriel apropié élaboré	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino para englobarse en un hito denominado "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réalises"	4/2/2015	4/8/2015

Output	L'etude de taxation et cout la main d'oeuvre élaboré	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino para englobarse en un hito denominado "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réélises"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Le service de tapis rouge fourni	Create Milestone	Se incluyo y luego se elimino este hito por estar incluido en el hito "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réélises"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Le manuel de protocole élaboré	Create Milestone	Se incluyo y luego se elimino este hito por estar incluido en el hito "Documents d'informations pour les investisseurs potentiels réélises"	4/2/2015	4/8/2015
Output	La base de donne des fournisseurs locaux certifiés élaboré	Create Milestone	Este hito es un servicio estandar en las API's que se ha incluido como un servicio mas a prestar dentro del producto Mise en oeuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé "	4/2/2015	4/8/2015
Output	Le Diagnostique pour l'one-stop-center réalisé	Create Milestone	Es la transformación de un producto en un hito porque se entiende que es un servicio mas de la dirección de facilitación del CFI en el producto "Mise en oeuvre d'un nouveau Catalogue de Services pour le renforcement du département de FACILITATION de CFI réalisé"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Support à l'initiative du Secteur Privée pour l'extension de la Loi HOPE réalisé	Create Milestone	Es un hito esencial que se introduce en el producto "Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)". Al ser un apoyo ala acción que desarrolla el Sector Privado en favor de ampliar lo beneficios de la ley HOPE en el congreso y senado de los USA para ampliar los beneficios de esta ley que permite exportar hacia USA productos de manufactura textil a tasa 0 con un alto impacto en la atracción de FDI.	4/2/2015	4/8/2015
Output	Le plan de communication interne et externe du CFI et ses outils élaborés	Modify Unit of Measure	Redacción de la unidad de medida clarificada	4/2/2015	4/8/2015
Output	Atelier avec CEI-RD pour la selection du meilleure logiciel CRM réalisé	Create Milestone	Este hito se creo y se elimino porque se engloba en el producto "Fonctionnaires et membres du Secteur Privé formes" pues es una formacion que reciben los funcionarios del CFI en un intercambio de buena práctica con otra Agencia de Promoción de Inversiones (API o API's en plural)	4/2/2015	4/8/2015
Output	Formation pour le personnel du CFI avec KOTRA réalisé	Create Milestone	Este hito se introdujo pero luego se elimino al englobarse en uno denominado "Mission Comercial Direct et Reciproque réalisé"	4/2/2015	4/8/2015
Output	Nouvelle Cadré Legal pour renforcer la capacité du CFI élaboré	Modify Unit of Measure	El CFI y el Ministerio de Comercio e industria han planteado que es mas correcto redactar el producto de esta manera porque quieren solicitar la derogación de la cláusula contractual 4.07 (c) no sea aplicada. En consecuencia quieren que se actualice de esta manera la redacción del Output	4/2/2015	4/8/2015
Outcome	Compagnies intéressées à investir en Haïti qui ont été accompagnées par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI)	Modify Means of Verification	Es la aclaración que el medio de verificación.	4/2/2015	4/8/2015

Outcome	Consultations des Institutions Financières à l'Agence d'Evaluation du Crédit selon les standards internationaux répandus	Modify Means of Verification	Es la aclaración que el medio de verificación.	3/18/2015	4/8/2015
Outcome	Reformes bureaucratiques de l'administration fiscale réales	Modify Means of Verification	Es la aclaración que el medio de verificación.	3/18/2015	4/8/2015
Outcome	Projets en mode Partenariats Publics Privés (PPP) financés par Investissements Directs Étrangers (IDE)	Modify Means of Verification	Es la aclaración que el medio de verificación.	3/18/2015	4/8/2015
Impact	Index on CEPAL (National Economic Profile)	Create Impact Indicator	Al crear el impacto FDI NET (CEPAL) se ligo al indicador "Index on CEPAL (National Economic Profile)".	3/18/2015	4/8/2015
Impact	FDI NET (CEPAL)	Create Impact	Este nuevo impacto reagrupa los anteriores "Foster private sector development in Haiti" y "Global Competitiveness and Business Impact of rules in FDI" ofreciendo un resultado mas certero para poder medir de manera adecuada el impacto de la operación. De esta manera se puede medir mejor el impacto en terminos de promoción de la inversión en consonancia con el objetivo del proyecto.	3/18/2015	4/8/2015
Output	Nombre de projets de loi et/ ou reformes bureaucratiques élaborés	Modify Unit of Measure	Unidad de medida ajustada para reflejar mejor el producto	3/17/2015	4/8/2015
Output	Nombre de projets de loi et/ ou reformes bureaucratiques élaborés	Modify Output name	El MEF considera que en un contexto donde no hay parlamento es posible y necesario avanzar en el ámbito de las reformas burocráticas de su competencia directa en el área fiscal (Dirección General de Impuestos y Dirección General de Aduanas). Estas reformas además contribuyen de manera significativa a la "Mejora del Clima de Negocios" que es el nuevo resultado definido. Y este a su vez contribuye a la atracción de IDE.	3/17/2015	4/8/2015
Output	Manuel de procédures pour le PPP élaboré	Modify Milestone name	Esta modificación sirve para introducir una herramienta esencial para la aplicación del nuevo marco legal para PPP. El Ministerio de Economía y Finanzas entiende que es vital para poder contar con los procedimientos de estudio de los proyectos en modo PPP que le permitan coordinarse con el resto de las instituciones del estado. Y al mismo tiempo poder contar con una base para poder estudiar la factibilidad o no de los proyectos. Y cuales de ellos serán posteriormente objeto de eventualmente la atracción de IDE.	3/17/2015	4/8/2015
Output	Le diagnostic des attributions légales des autres institutions du l'Etat qui touchent les attributions du CFI réalisé	Modify Unit of Measure	Aclaración de la unidad de medida	3/17/2015	4/8/2015
Output	Le diagnostic des attributions légales des autres institutions du l'Etat qui touchent les attributions du CFI réalisé	Modify Milestone name	Ajuste gramatical de redacción	3/17/2015	4/8/2015
Output	Le diagnostic comparatif des API's comme support pour élaboré la nouveau Loi réalisé	Modify Milestone name	Ajuste gramatical de redacción	3/17/2015	4/8/2015
Output	Nouvelle Cadré Legal pour renforcer la capacité du CFI élaboré	Modify Output name	El anterior producto era "Nueva ley para reforzar el CFI elaborada" se acordó modificarlo porque la reforma pueda ser mas amplia.	3/17/2015	4/8/2015
Outcome	Consultations des Institutions Financières à l'Agence d'Evaluation du Crédit selon les standards internationaux répandus	Modify Indicator name	Mejora de redacción del Outcome "Nombre de consultations des Institutions Financières à l'Agence d'Evaluation du Crédit selon les standards internationaux répondus"	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Projets en mode Partenariats Publics Privés (PPP) financés par Investissements Directs Étrangers (IDE)	Modify Indicator name	Mejora de redacción del Outcome "Nombre de projet PPP financé par IDE"	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Compagnies intéressées à investir en Haïti qui ont été accompagnées par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI)	Modify Indicator name	Este Outcome se integra (define) en el nuevo Outcome "Service d'accompagnement des investisseurs amélioré".	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Système de suivi (construction et suivi du budget et matière d'IPs) et évaluation (ex-ante / ex-post) des investissements publics établi et capable de fournir informations	Delete Outcome	Se ha acordado con la unidad ejecutora que este Outcome no ofrecia una medida adecuada de los resultados de la operación. Por ello se ha decido que era mas adecuado realizar el monitoreo a nivel de Producto.	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Rendre le bureau de crédit opérationnel afin de permettre aux Institutions Financières d'utiliser une Agence d'Evaluation du Crédit établie selon les standards internationaux élaborés par l'IFC	Delete Outcome	Se ha procedido ha organizar los resultados de manera que se puede realizar un seguimiento mas preciso de los Resultados Esperados. Al mismo tiempo se han definiendo de manera mas concreta los indicadores para permitir un monitoreo mas adecuado del proyecto.	3/13/2015	4/9/2015

Outcome	Nombre de consultations des Institutions Financières à l'Agence d'Evaluation du Crédit selon les standards internationaux répondus	Create Outcome Indicator	En primer lugar, se ha procedido ha organizar los resultados de manera que se puede realizar un seguimiento mas preciso de los Resultados Esperados. Al mismo tiempo se han definiendo de manera mas concreta los indicadores para permitir un monitoreo mas adecuado del proyecto	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Reformes bureaucratiques de l'administration fiscale réaleses	Modify Unit of Measure	Es un error técnico del sistema es lo mismo que aterior solo para indicar la Unidad de Medida como "Numero de Proyectos en modo PPP que son financiados con IDE"	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Climat des affaires amélioré	Modify Statement	Se ha procedido ha organizar los resultados de manera que se puede realizar un seguimiento mas preciso de los Resultados Esperados. Al mismo tiempo se han definiendo de manera mas concreta los indicadores para permitir un monitoreo mas adecuado del proyecto.	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Augmentation du nombre de Micro-Petites- Moyen entreprises qu'ont été accompagnés pour le CDEE pour l'élaboration de son plan de affaires visant à créer une meilleure compétitivité et accès au crédit dans la logique de chaine de valeur local qui doit contribuer à la croissance économique et la création d'emploi	Delete Outcome	Ce resultat est relatif aux opérations CMF parce que HA-L1078 en finance 6 consultants. Comme HA-L1078 n'a pas de contrôle sur la performance des autres projets, le resultat sera mesure dans les programmes (2416/GR-HA, 2555/GR-HA, 2827/GR-HA.	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Nombre de projet PPP financé par IDE	Create Outcome Indicator	Este indicador facilita una medida del nuevo Outcome "Service d'accompagnement des investisseurs amélioré" para poder establecer que la medida del resultado esperado es el "Nombre de projet PPP financé par IDE" encudrando de manera mas precisa la contribución a los objetivos del proyecto.	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Développement et promotion de Partenariats Public Privé (PPP) et de Participations Publiques (PP) dans un nouveau cadre normatif	Delete Outcome	Este resultado se ha integrado (precisado) en el nuevo Outcome "Nombre de projet PPP financé par IDE"	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Augmentation des outils promotion et études mise à disposition pour le CFI aux potentiels investisseurs	Delete Outcome	Este resultado se ha integrado (precisado) en el nuevo Outcome "Service d'accompagnement des investisseurs amélioré"	3/13/2015	4/8/2015
Outcome	Service d'accompagnement des investisseurs amélioré	Modify Statement	Se ha procedido ha organizar los resultados de manera que se puede realizar un seguimiento mas preciso de los Resultados Esperados. Al mismo tiempo se han definiendo de manera mas concreta los indicadores para permitir un monitoreo mas adecuado del proyecto.	3/13/2015	4/8/2015
Impact	Score in UNCTAD's Foreign Direct Investment Attraction Index /Foreign Direct Investment Potential Index	Modify EOP P(a)	PAra ajustarse a la matriz aprobada que dice que sera mayor que 1 pero no necesariamente llegar hasta 2 como se indico inicilamente	3/13/2015	3/13/2015
Impact	Augmentation du niveau d'investissent obtenu par les de Micro-Petites- Moyennes entreprises qu'ont été accompagnés pour le CDEE	Delete Impact	Este indicador se añadió a la matriz inicial del proyecto para intentar medir el impacto de los proyectos HA-L1050/L1057/L1068. Esto se hizo porque en el documento de proyecto y el acuerdo de donación (Art. 2.03 del Anexo) figura que el HA-L1078 financia varios consultores del CDEE, y que el CDEE cuenta con los mencionados proyectos. Hemos realizado el análisis que aunque el HA-L1078 financia los mencionados consultores del CDEE no financia los productos y por lo tanto no le corresponde medir estos Impactos. Por lo tanto a nivel de impacto volvemos a la matriz de resultados aprobada.	3/13/2015	3/13/2015
Impact	Intended jobs to be created by the potential investors in Haiti	Delete Impact	Este indicador forma parte de la cadena de resultados pero en una consecuencia de los indicadores que me miden el impacto. En consecuencia no debe figurar como tal. De esta forma la matriz de resultados del proyecto queda configurada a nivel de impacto como se aprobó.	3/13/2015	3/13/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
