



Operation Number: **BO-L1082**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **12/8/2014**
PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **11/12/2014**
Division Chief validation date: **11/12/2014**
Country Representative validation date: **11/17/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Improved Access to Health Services El Alto Bolivia	Loan Number:	3151/BL-BO
Executing Agency (EA):	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES		
Team Leader:	Buscarons Cuesta,Luis	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1082	\$43,000,000.00	\$43,000,000.00	\$5,524,000.00	\$0.00	\$48,524,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1082	\$43,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$43,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

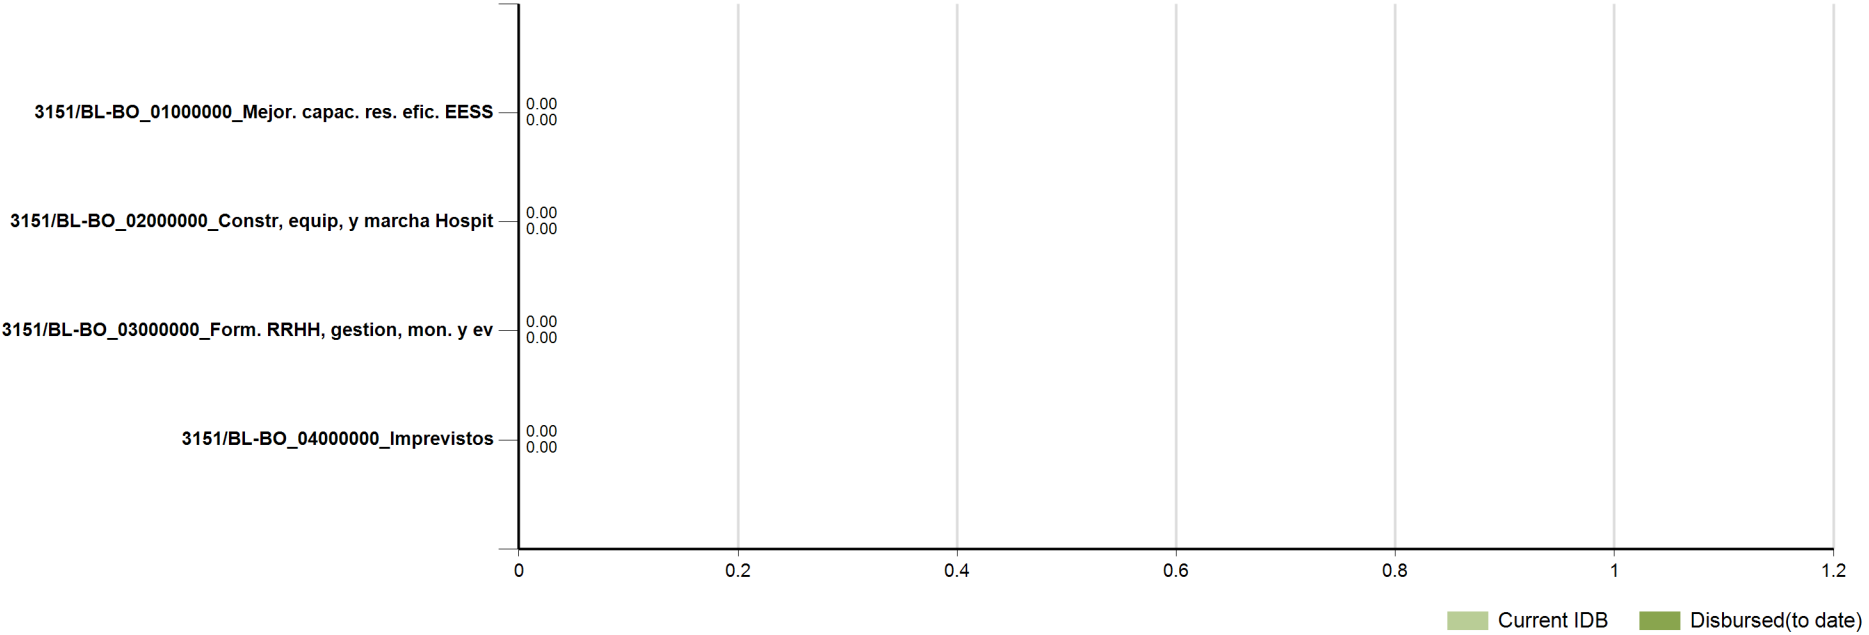

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Reducción de la mortalidad: i) neonatal; ii) materna; y ii) por cáncer cervico-uterino en El Alto							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 1.1 Mortalidad neonatal precoz hospitalaria por 1.000 NV* (<7 días) en el municipio El Alto		%		2013			P	
							P(a)	
							A	
0.1 1.2 Mortalidad materna hospitalaria por 100.000 NV en el municipio El Alto		%		2013			P	
							P(a)	
							A	
0.2 1.3Mortalidad por CaCU (Cáncer Cérvico - Uterino) por 100.000 mujeres entre 30 y 49 años de edad en el departamento de La Paz		%		2013			P	
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Utilización de los servicios hospitalarios en el Municipio de El Alto incrementada												
Observation:	Ver fuente de indicadores en la Matriz de Resultados.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
0.0 Porcentaje de emergencias derivadas a La Paz sobre el total de emergencias generadas en el Municipio El Alto		%	3.00	2013			P						
							P(a)						
							A						
0.1 Porcentaje de partos institucionales en relación al número de partos esperados el Municipio de El Alto		%	59.20	2012			P	55.00	57.00	59.00	62.00	65.00	75.00
							P(a)						
							A						

0.2 Personas que se benefician de un paquete básico de servicios de salud. (total de mujeres tamizadas bajo el Programa)		Personas	0.00	2014			P	0.00	0.00	0.00	20,500.00	25,500.00	30,500.00
							P(a)						
							A						
Outcome:	0 Capacidad de resolución en atención de salud materno-infantil y CaCU (Cáncer Cérvico - Uterino) en el Municipio de El Alto mejorada												
Observation:	Ver fuente de indicadores y definiciones en la Matriz de Resultados.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
							2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
0.0 Porcentaje de mujeres entre 30 y 49 años tamizadas con IVAA que obtengan resultado positivo (sobre el total de mujeres tamizadas)		%	0.00	2013			P	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	5.00
							P(a)						
							A						
0.1 Porcentaje de mujeres tamizadas con IVAA positivo que completan el tratamiento según protocolo en un año		%	0.00	2013			P	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	80.00
							P(a)						
							A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Mejoramiento de la capacidad resolutive y eficiencia gerencial de los establecimientos de salud del primer nivel		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Protocolo para el tratamiento curativo y/o paliativo de casos de CaCU* invasor elaborado	Protocolo	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento con personal capacitado en el nuevo protocolo de prevención, tratamiento y control del CaCU (Se refiere al 100% del personal responsable del área de CaCU de un establecimiento)	Red	P		5.00	P		700,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Personas capacitadas en referencia/ contra referencia, gestión hospitalaria y de calidad y/o gestión de información	Personas	P		120.00	P		500,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Protocolo y/o guía de coordinación y comunicación intra-red y de gestión hospitalaria elaborados	Protocolo	P		2.00	P		300,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con equipamiento para cuidado maternoinfantil y emergencias obstétricas según norma de caracterización	Red	P		5.00	P		750,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con equipamiento para la atención de CaCU según norma de caracterización	Red	P		5.00	P		750,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con equipamiento para la comunicación y coordinación según protocolo bajo 1.4	Red	P		5.00	P		500,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con al menos una persona capacitada en mantenimiento de equipo médico para la atención de CaCU y/o salud materno-infantil	Red	P		5.00	P		30,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Construcción, equipamiento, y puesta en marcha del hospital de tercer nivel de El Alto Sur		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Hospital diseñado	Diseño	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Hospital construido según plan médico-funcional	Construido	P		1.00	P		15,600,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Hospital equipado según plan médico-funcional	Equipado	P		1.00	P		18,300,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		

Plan de puesta en marcha del hospital El Alto Sur elaborado	Plan	P		1.00	P		900,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Formación en RRHH, gestión, M&E del programa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Personal capacitado en especialidades hospitalarias (físicos médicos, técnicos y médicos radio-terapeutas, entre otros)	Personas	P		150.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Ente Gestor contratado	Contrato	P	1.00	1.00	P	50,000.00	2,821,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		

Other Cost			2014	Cost
Evaluaciones	P			\$155,000.00
	P(a)			\$0.00
	A			
Fortalecimiento institucional/ administración del programa	P		\$20,000.00	\$1,394,000.00
	P(a)			\$0.00
	A			
Total Cost			2014	Total Cost
	P		\$70,000.00	\$43,000,000.00
	P(a)			
	A			

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
