

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	BID	Local	BEI	TOTAL
0	PEP_ECL1129Resumen	1459 días	jue 01/01/15	sáb 29/12/18	\$80,000,640.08	\$1,100,000.00	\$39,175,000.00	\$120,275,640.08
1	1 Componente 1. Articulación intersectorial de servicios sociales	1459 días	jue 01/01/15	sáb 29/12/18	\$3,000,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
2	1.1 Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de mecanismos de articulacion intersectorial	609 días	lun 01/06/15	dom 29/01/17	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
3	1.1.1 Diseño de mecanismos para la actualización permanente del Registro Único de Beneficiarios y su articulación con los programas sociales	276 días	mié 01/07/15	vie 01/04/16	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4	1.1.1.1 Contratación de Consultor	90 días	mié 01/07/15	lun 28/09/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	1.1.1.2 Ejecución de la consultoría	180 días	mar 29/09/15	sáb 26/03/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	1.1.1.3 Primer pago	1 día	mar 29/09/15	mar 29/09/15	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
7	1.1.1.4 Primer producto de consultoria: Informe de análisis comparativo entre los requerimientos del RUB y la información generada por los servicios sociales	1 día	sáb 14/11/15	sáb 14/11/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	1.1.1.5 Segundo pago	1 día	dom 15/11/15	dom 15/11/15	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
9	1.1.1.6 Segundo producto de consultoria: Propuesta operativa para actualizar el RUB mediante información proveniente de servicios sociales seleccionados	1 día	mié 30/12/15	mié 30/12/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	1.1.1.7 Tercer producto de consultoria: Software del RUB y/o de los servicios sociales ajustados para permitir su integración	1 día	dom 14/02/16	dom 14/02/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	1.1.1.8 Cuarto producto de consultoria: Mecanismos e instrumentos para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la actualización permanente del RUB	1 día	jue 31/03/16	jue 31/03/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	1.1.1.9 Tercer pago	1 día	vie 01/04/16	vie 01/04/16	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
13	1.1.2 Asistencia técnica para diseñar mecanismos de interoperabilidad entre el registro interconectado de programas sociales y el sistema de acompañamiento	270 días	dom 01/11/15	mié 27/07/16	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
14	1.1.2.1 Contratación de Consultor	90 días	lun 01/06/15	sáb 29/08/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1.1.2.2 Ejecución de la consultoría	180 días	dom 01/11/15	jue 28/04/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen Fecha: mar 30/09/14	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	BID	Local	BEI	TOTAL
16	1.1.2.3 Primer pago	1 día	dom 30/08/15	dom 30/08/15	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
17	1.1.2.4 Primer producto: Informe de diagnóstico de la interoperabilidad actual entre el RIPS y RUB, y los servicios actualmente incluidos en el RIPS	1 día	dom 29/11/15	dom 29/11/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1.1.2.5 Segundo producto: Informe de análisis de los sistemas de información de servicios sociales adicionales que se integrarían al RIPS	1 día	lun 30/11/15	lun 30/11/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1.1.2.6 Segundo pago	1 día	lun 30/11/15	lun 30/11/15	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
20	1.1.2.7 Tercer producto: Software fortalecido para la interoperabilidad del RIPS con las bases de datos de los servicios sociales	1 día	lun 29/02/16	lun 29/02/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1.1.2.8 Cuarto producto de consultoría: Informe con resultados de la asistencia técnica para ajustar las bases de datos antiguas (legacy data bases) de los servicios sociales a integrarse	1 día	sáb 30/04/16	sáb 30/04/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1.1.2.9 Tercer pago	1 día	dom 01/05/16	dom 01/05/16	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
23	1.1.3 Desarrollo de un repositorio de datos que integra la información del registro único de beneficiarios, el sistema de acompañamiento y los registros administrativos de los programas sociales	456 días	dom 01/11/15	dom 29/01/17	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
24	1.1.3.1 Contratación	90 días	dom 01/11/15	vie 29/01/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1.1.3.2 Ejecución	365 días	sáb 30/01/16	sáb 28/01/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1.1.3.3 Primer pago	1 día	sáb 30/01/16	sáb 30/01/16	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
27	1.1.3.4 Segundo Pago	1 día	vie 29/07/16	vie 29/07/16	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
28	1.1.3.5 Tercer pago	1 día	dom 29/01/17	dom 29/01/17	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
29	1.2 Subcomponente 1.2. Sistema integral de acompañamiento	1148 días	jue 01/01/15	mié 21/02/18	\$1,400,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
30	1.2.1 Diseño de mecanismos de referenciación y gestión de servicios del sistema integrado de acompañamiento	365 días	jue 01/01/15	jue 31/12/15	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
31	1.2.2 Asistencia técnica para el desarrollo e implementación de mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la articulación intersectorial del sistema de acompañamiento	183 días	lun 01/06/15	lun 30/11/15	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 2

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	BID	Local	BEI	TOTAL
32	1.2.2.1 Contratación de la consultoría	60 días	lun 01/06/15	jue 30/07/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33	1.2.2.2 Ejecución de la consultoría	120 días	vie 31/07/15	vie 27/11/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34	1.2.2.3 Primer pago	1 día	vie 31/07/15	vie 31/07/15	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
35	1.2.2.4 Segundo pago	1 día	mié 30/09/15	mié 30/09/15	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
36	1.2.2.5 Producto final de la consultoria: estrategia de monitoreo y evaluación del SIA a nivel nacional a ser implementados por el MCDS anualmente	1 día	lun 30/11/15	lun 30/11/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37	1.2.2.6 Tercer pago	1 día	lun 30/11/15	lun 30/11/15	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
38	1.2.3 Encuestas de Situación Socio Económica de los Hogares –ESSHO e investigación complementaria	844 días	dom 01/11/15	mié 21/02/18	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
39	1.2.3.1 Contratación de la consultoría	90 días	dom 01/11/15	vie 29/01/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40	1.2.3.2 Ejecución de la consultoría	700 días	sáb 30/01/16	vie 29/12/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41	1.2.3.3 Anticipo	1 día	sáb 30/01/16	sáb 30/01/16	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
42	1.2.3.4 Primer pago a la presentación de los resultados de la encuesta	1 día	dom 28/08/16	dom 28/08/16	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
43	1.2.3.5 Segundo pago a la presentación del plan del segundo levantamiento	1 día	mié 26/04/17	mié 26/04/17	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
44	1.2.3.6 Tercer pago a la presentación de los resultados del segundo levantamiento	1 día	mié 21/02/18	mié 21/02/18	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
45	1.2.4 Asistencia técnica para diseñar de mecanismo de actualización para administrar la cartilla de servicios sociales	274 días	dom 01/11/15	dom 31/07/16	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
46	1.2.4.1 Contratación de la consultoría	30 días	dom 01/11/15	lun 30/11/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	1.2.4.2 Ejecución de la consultoría	240 días	mar 01/12/15	mié 27/07/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
48	1.2.4.3 Primer pago	1 día	mar 01/12/15	mar 01/12/15	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
49	1.2.4.4 Primer informe: Informe de análisis del proceso de mapeo en territorio (por cada ministerio) de los servicios sociales incluidos en la CSS	1 día	mié 02/12/15	mié 02/12/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50	1.2.4.5 Segundo pago	1 día	jue 31/03/16	jue 31/03/16	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea



Hito externo



Informe de resumen manual



División



Tarea inactiva



Resumen manual



Hito



Hito inactivo



Sólo el comienzo



Resumen



Resumen inactivo



Sólo fin



Resumen del proyecto



Tarea manual



Fecha límite



Tareas externas



Sólo duración



Progreso



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	BID	Local	BEI	TOTAL
51	1.2.4.6 Segundo informe: Modelo operativo para alimentar permanentemente la CSS por los ministerios coordinados	1 día	sáb 30/07/16	sáb 30/07/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52	1.2.4.7 Tercer pago	1 día	dom 31/07/16	dom 31/07/16	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
53	1.3 Subcomponente 1.3 - Administración y evaluación	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$300,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$500,000.00
54	1.3.1 Evaluacion operativa del Sistema de Acompañamiento a nivel local	1382 días	dom 01/03/15	mar 11/12/18	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
55	1.3.1.1 Contratación de Consultor	30 días	dom 01/03/15	lun 30/03/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56	1.3.1.2 Ejecución de la consultoría	1350 días	mar 31/03/15	dom 09/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
57	1.3.1.3 Primer pago	1 día	mar 31/03/15	mar 31/03/15	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
58	1.3.1.4 Construcción de la línea base	90 días	mar 31/03/15	dom 28/06/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59	1.3.1.5 Segundo pago	1 día	lun 29/06/15	lun 29/06/15	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
60	1.3.1.6 Evaluación de medio termino	90 días	dom 02/10/16	vie 30/12/16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61	1.3.1.7 Tercer pago	1 día	sáb 31/12/16	sáb 31/12/16	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
62	1.3.1.8 Segunda medición y evaluación operativa final	120 días	lun 26/03/18	lun 23/07/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	1.3.1.9 Cuarto pago	1 día	mar 24/07/18	mar 24/07/18	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
64	1.3.1.10 Evaluación de resultados	120 días	lun 13/08/18	lun 10/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
65	1.3.1.11 Pago final	1 día	mar 11/12/18	mar 11/12/18	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
66	1.3.2 Equipo gestion del programa MCDS	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
67	1.3.2.1 Coordinador técnico del componente	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
68	1.3.2.2 Analista de adquisiciones	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
69	1.3.3 Auditorías de estados financieros del proyecto	1384 días	dom 01/03/15	jue 13/12/18	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
70	1.3.3.1 Contratación de la consultoría	30 días	dom 01/03/15	lun 30/03/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71	1.3.3.2 Ejecución de la consultoría	1354 días	mar 31/03/15	jue 13/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72	1.3.3.3 Primer pago	1 día	mié 01/04/15	mié 01/04/15	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
73	1.3.3.4 Segundo pago	1 día	mié 11/01/17	mié 11/01/17	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
74	1.3.3.5 Tercer pago	1 día	jue 13/12/18	jue 13/12/18	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea



Hito externo



Informe de resumen manual



División



Tarea inactiva



Resumen manual



Hito



Hito inactivo




Sólo el comienzo



Resumen



Resumen inactivo



Sólo fin



Resumen del proyecto



Tarea manual



Fecha límite



Tareas externas



Sólo duración



Progreso



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	BID	Local	BEI	TOTAL
75	2 Componente 2. Infraestructura física en Plataforma Social Nacional	1459 días	jue 01/01/15	sáb 29/12/18	\$77,000,640.08	\$800,000.00	\$39,175,000.00	\$116,975,640.08
76	2.1 Sub Componente 2. Infraestructura física en plataforma social nacional	990 días	jue 01/01/15	sáb 16/09/17	\$76,500,640.08	\$0.00	\$39,175,000.00	\$115,675,640.08
77	2.1.1 Construcción de Plataforma Gubernamental social	920 días	vie 20/02/15	dom 27/08/17	\$57,778,405.00	\$0.00	\$39,175,000.00	\$96,953,405.00
78	2.1.1.1 Firma de Contrato	0 días	vie 20/02/15	vie 20/02/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79	2.1.1.2 Pago de anticipo 40%	5 días	vie 20/02/15	mar 24/02/15	\$23,111,362.00	\$0.00	\$15,670,000.00	\$38,781,362.00
80	2.1.1.3 Inicio de Obra	1 día	mié 25/02/15	mié 25/02/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81	2.1.1.4 Ejecución obra	900 días	mié 25/02/15	sáb 12/08/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82	2.1.1.5 Segundo pago construcción (20%)	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	\$11,555,681.00	\$0.00	\$7,835,000.00	\$19,390,681.00
83	2.1.1.6 Tercer pago construcción (20%)	1 día	dom 26/02/17	dom 26/02/17	\$11,555,681.00	\$0.00	\$7,835,000.00	\$19,390,681.00
84	2.1.1.7 Terminacion de la obra	1 día	sáb 26/08/17	sáb 26/08/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85	2.1.1.8 Pago final de construcción (20%)	1 día	sáb 26/08/17	sáb 26/08/17	\$11,555,681.00	\$0.00	\$7,835,000.00	\$19,390,681.00
86	2.1.1.9 IVA	1 día	dom 27/08/17	dom 27/08/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
87	2.1.2 Fiscalización y asistencia técnica	990 días	jue 01/01/15	sáb 16/09/17	\$6,557,235.08	\$0.00	\$0.00	\$6,557,235.08
88	2.1.2.1 Contratación fiscalización	60 días	jue 01/01/15	dom 01/03/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
89	2.1.2.2 Ejecución de la consultoría	930 días	lun 02/03/15	sáb 16/09/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90	2.1.2.3 Primer pago fiscalización	1 día	sáb 07/03/15	sáb 07/03/15	\$1,639,308.77	\$0.00	\$0.00	\$1,639,308.77
91	2.1.2.4 Segundo pago fiscalización	1 día	lun 07/03/16	lun 07/03/16	\$1,639,308.77	\$0.00	\$0.00	\$1,639,308.77
92	2.1.2.5 Tercer pago fiscalización	1 día	mié 08/03/17	mié 08/03/17	\$1,639,308.77	\$0.00	\$0.00	\$1,639,308.77
93	2.1.2.6 Cuarto pago fiscalización	1 día	mar 05/09/17	mar 05/09/17	\$1,639,308.77	\$0.00	\$0.00	\$1,639,308.77
94	2.1.3 Adquisición mobiliario	151 días	mar 27/12/16	vie 26/05/17	\$7,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00
95	2.1.3.1 Contratación bienes	120 días	mar 27/12/16	mar 25/04/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
96	2.1.3.2 Adquisición mobiliario	1 día	vie 26/05/17	vie 26/05/17	\$7,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00
97	2.1.4 Adquisición computadoras	151 días	mar 27/12/16	vie 26/05/17	\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040,000.00
98	2.1.4.1 Contratación bienes	120 días	mar 27/12/16	mar 25/04/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
99	2.1.4.2 Adquisición bienes	1 día	vie 26/05/17	vie 26/05/17	\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040,000.00

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	BID	Local	BEI	TOTAL
100	2.2 Subcomponente 2. Comunicación, mudanza, administración y auditoría	1459 días	jue 01/01/15	sáb 29/12/18	\$500,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
101	2.2.1 Mudanza	41 días	vie 28/07/17	mié 06/09/17	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
102	2.2.1.1 Contratación SDC	30 días	vie 28/07/17	sáb 26/08/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	2.2.1.2 Ejecución servicio	10 días	dom 27/08/17	mar 05/09/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	2.2.1.3 Pago servicio	1 día	mié 06/09/17	mié 06/09/17	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
105	2.2.2 Plan de socialización de avance de obras y funcionamiento de la plataforma social para el publico	983 días	dom 01/02/15	mar 10/10/17	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
106	2.2.2.1 Contratación	30 días	dom 01/02/15	lun 02/03/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	2.2.2.2 Ejecución de la consultoría	950 días	mar 03/03/15	sáb 07/10/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	2.2.2.3 Primer pago	1 día	lun 28/12/15	lun 28/12/15	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
109	2.2.2.4 Primer producto: plan de socialización de la PGDS	1 día	mar 29/12/15	mar 29/12/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
110	2.2.2.5 Segundo pago	1 día	lun 24/10/16	lun 24/10/16	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
111	2.2.2.6 Segundo producto: plan de socialización de avance de obras y funcionamiento de la PGDS para el publico implementado	1 día	mar 10/10/17	mar 10/10/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112	2.2.2.7 Tercer pago	1 día	mar 10/10/17	mar 10/10/17	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
113	2.2.3 Evaluación del componente 2.	1028 días	dom 01/02/15	vie 24/11/17	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
114	2.2.3.1 Contratación	30 días	dom 01/02/15	lun 02/03/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
115	2.2.3.2 Ejecución de la consultoría	950 días	mar 03/03/15	sáb 07/10/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
116	2.2.3.3 Primer pago	1 día	lun 28/12/15	lun 28/12/15	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
117	2.2.3.4 Segundo pago	1 día	lun 24/10/16	lun 24/10/16	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
118	2.2.3.5 Tercer pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
119	2.2.4 Equipo gestion del programa INMOBILIAR y SECOB	1459 días	jue 01/01/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$760,000.00
120	2.2.4.1 Especialista administrativo financiero INMOBILIAR	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
121	2.2.4.2 Analista de contratacion publica INMOBILIAR	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
122	2.2.4.3 Analista administrativo financiero INMOBILIAR	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 6

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	BID	Local	BEI	TOTAL
123	2.2.4.4 Analista contable presupuestario INMOBILIAR	1400 días	dom 01/03/15	sáb 29/12/18	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
124	2.2.4.5 Técnico de adquisiciones para elabor documento de LPI SECOB	1400 días	jue 01/01/15	mié 31/10/18	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
125	2.2.4.6 Funcionario para obtención permisos ambientales	1400 días	jue 01/01/15	mié 31/10/18	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
126	2.2.4.7 Arquitecto para fortalecer el área precontractual	1400 días	jue 01/01/15	mié 31/10/18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
127	2.2.4.8 Ingeniero para el monitoreo y seguimiento de obras	1400 días	dom 01/02/15	sáb 01/12/18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
128	2.2.4.9 Arquitecto para el proceso de cierre de contratos	1000 días	vie 01/01/16	mié 26/09/18	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
129	2.2.5 Auditorías de estados financieros del proyecto	986 días	dom 01/03/15	vie 10/11/17	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
130	2.2.5.1 Contratación de Consultor	30 días	dom 01/03/15	lun 30/03/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
131	2.2.5.2 Ejecución de la consultoría	900 días	mar 31/03/15	vie 15/09/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
132	2.2.5.3 Primer pago	1 día	mié 01/04/15	mié 01/04/15	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
133	2.2.5.4 Segundo pago	1 día	sáb 25/06/16	sáb 25/06/16	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
134	2.2.5.5 Tercer pago	1 día	vie 10/11/17	vie 10/11/17	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual


Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 7

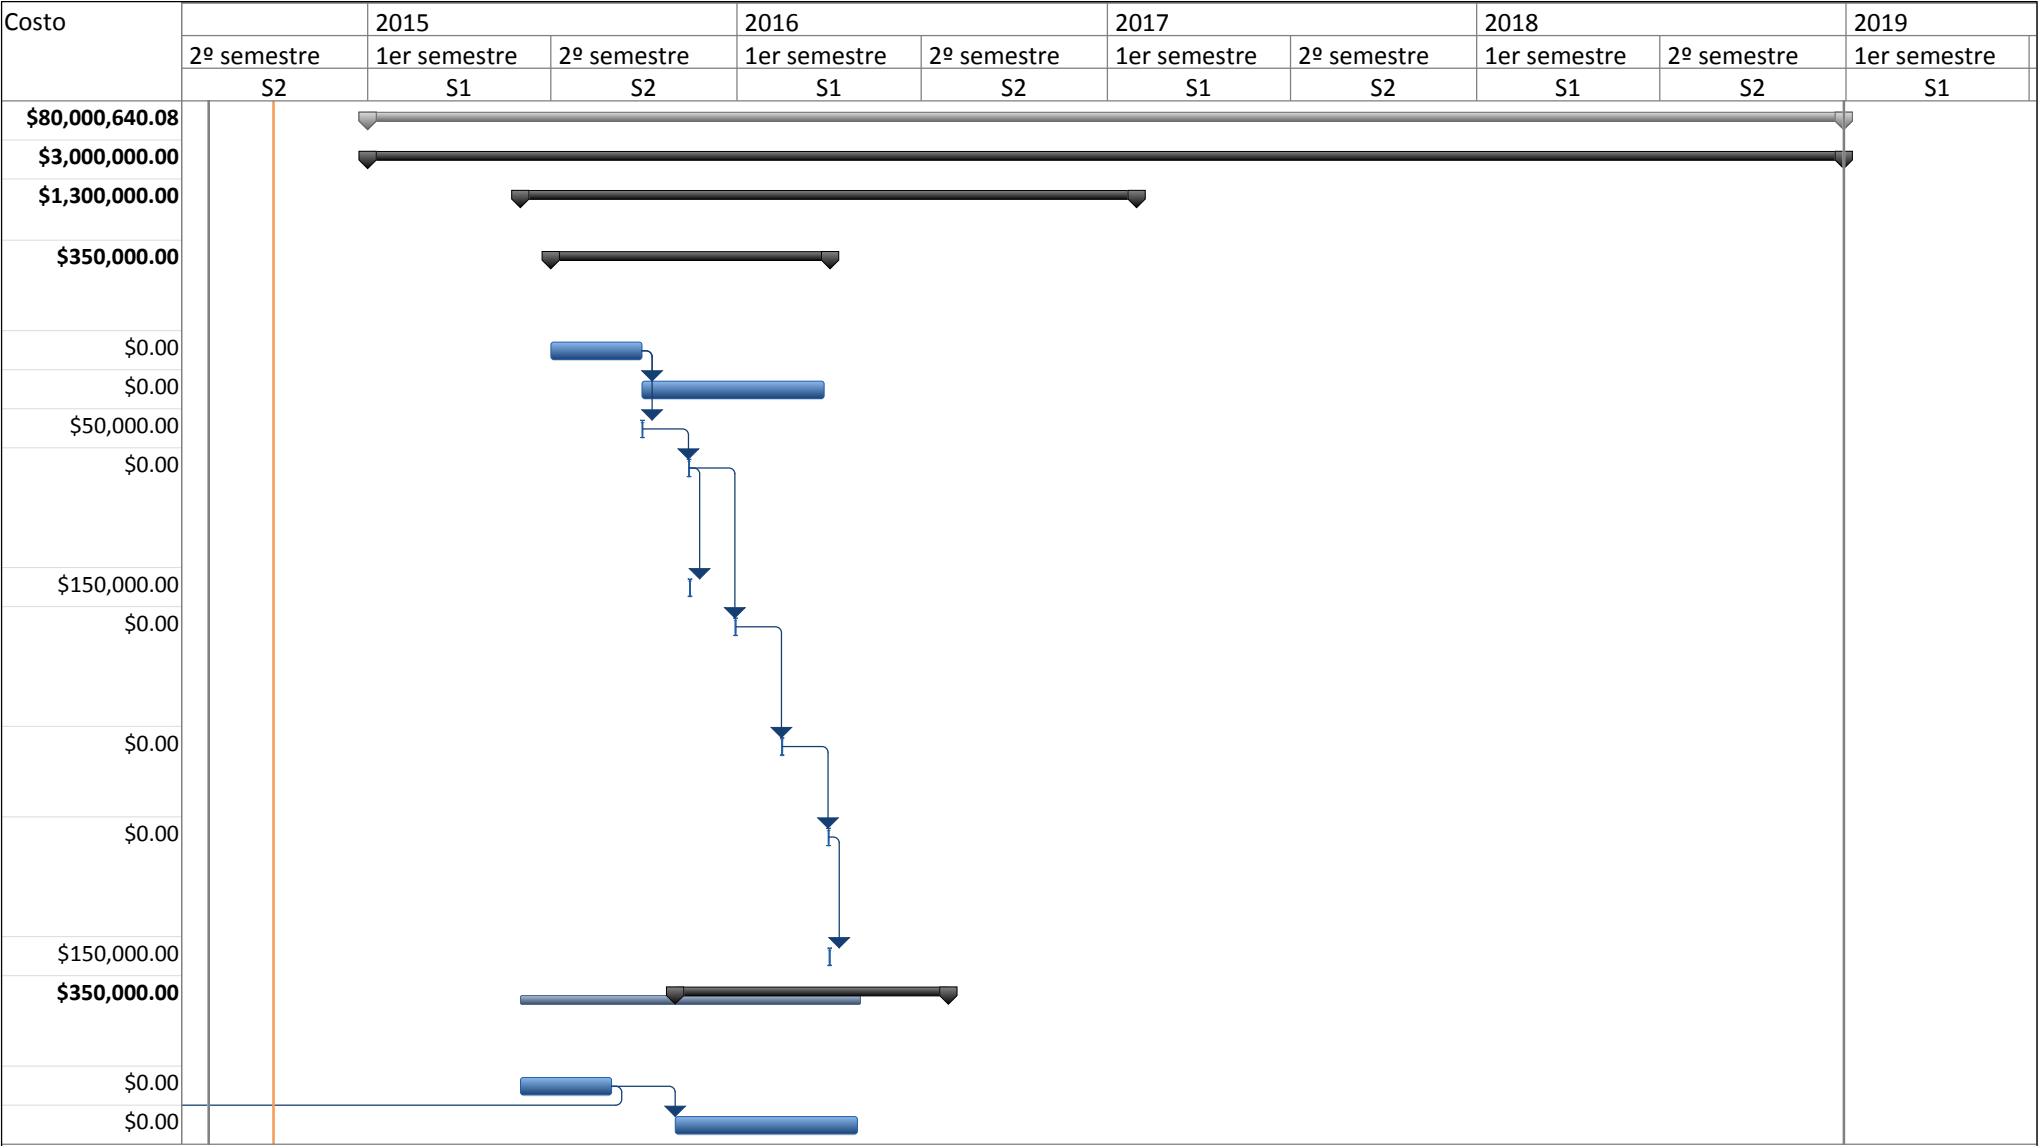

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

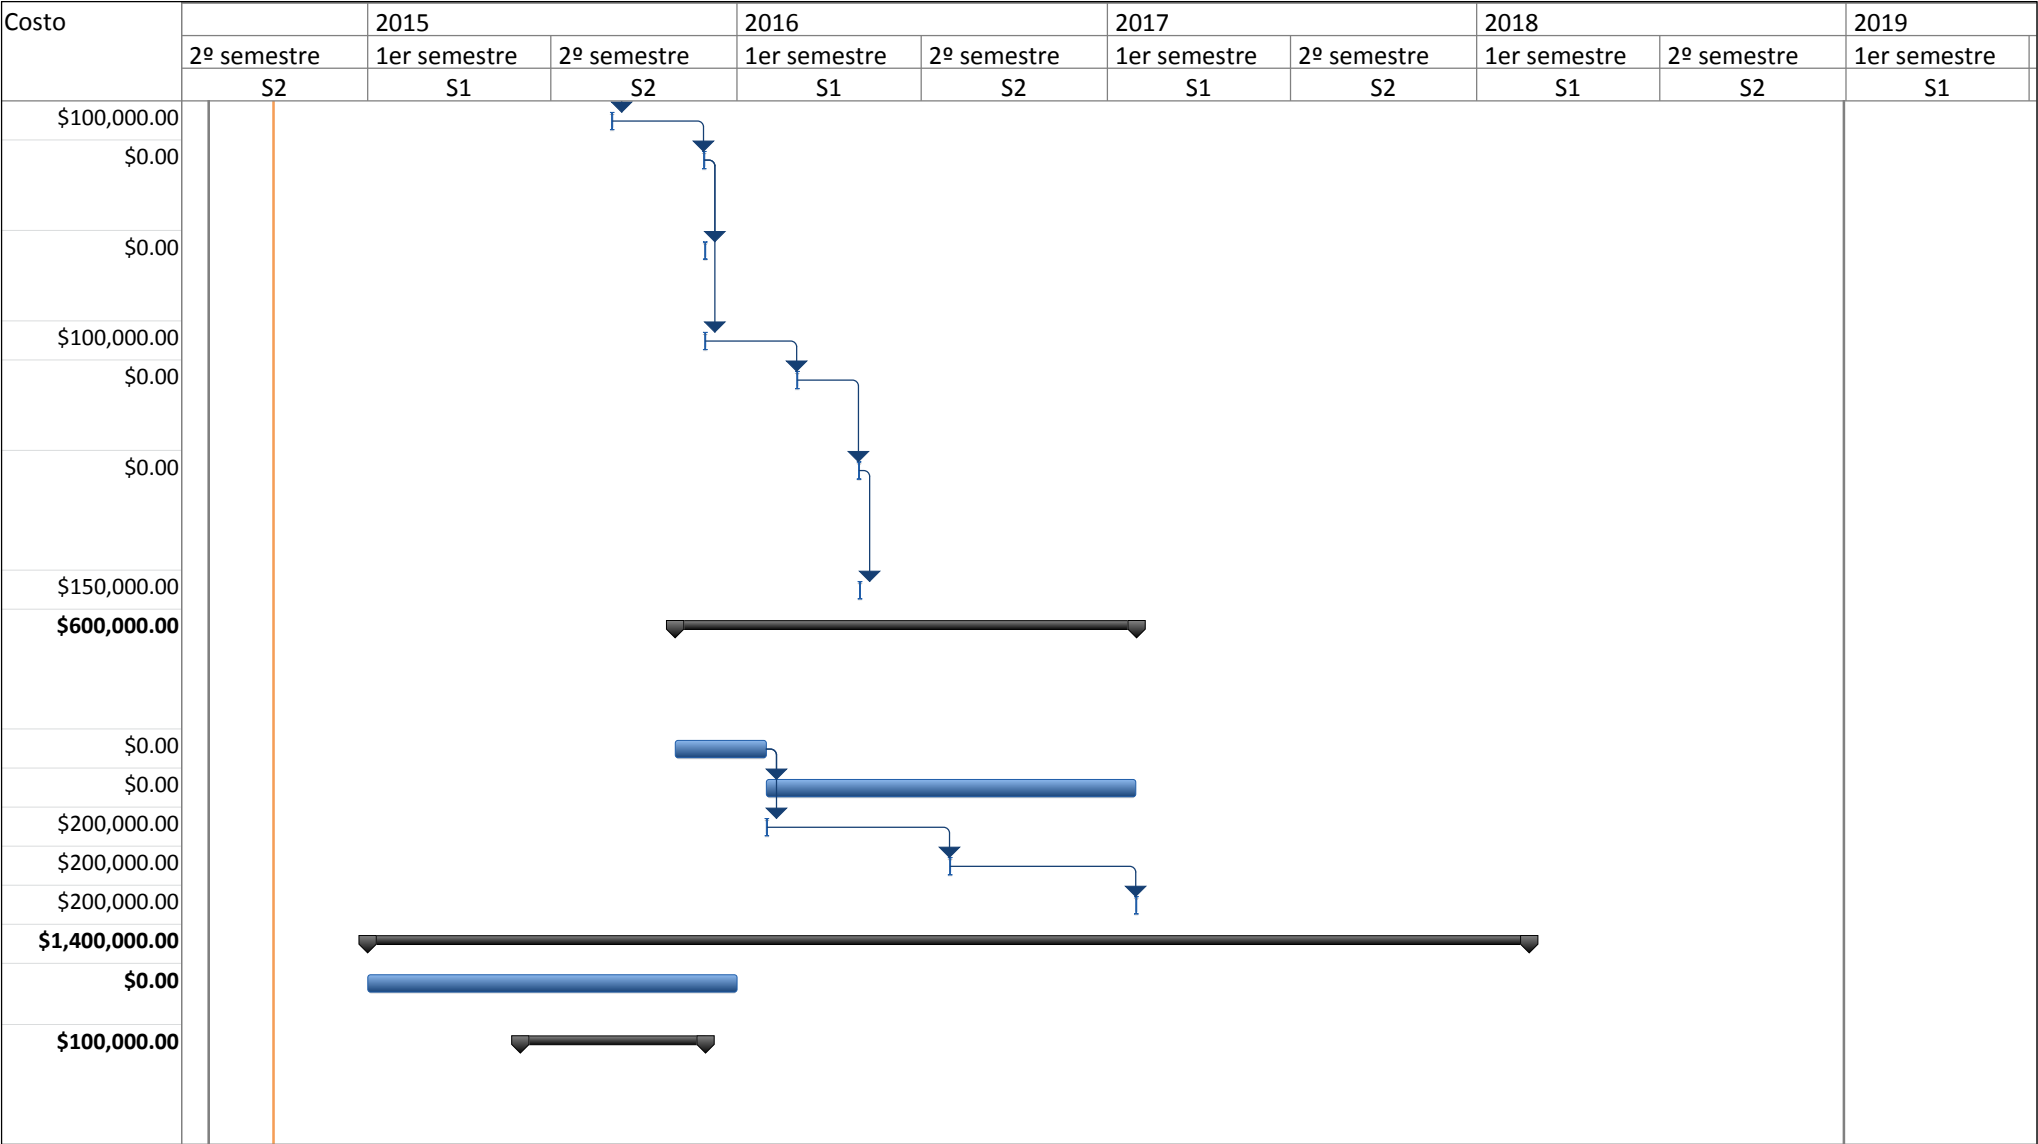

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

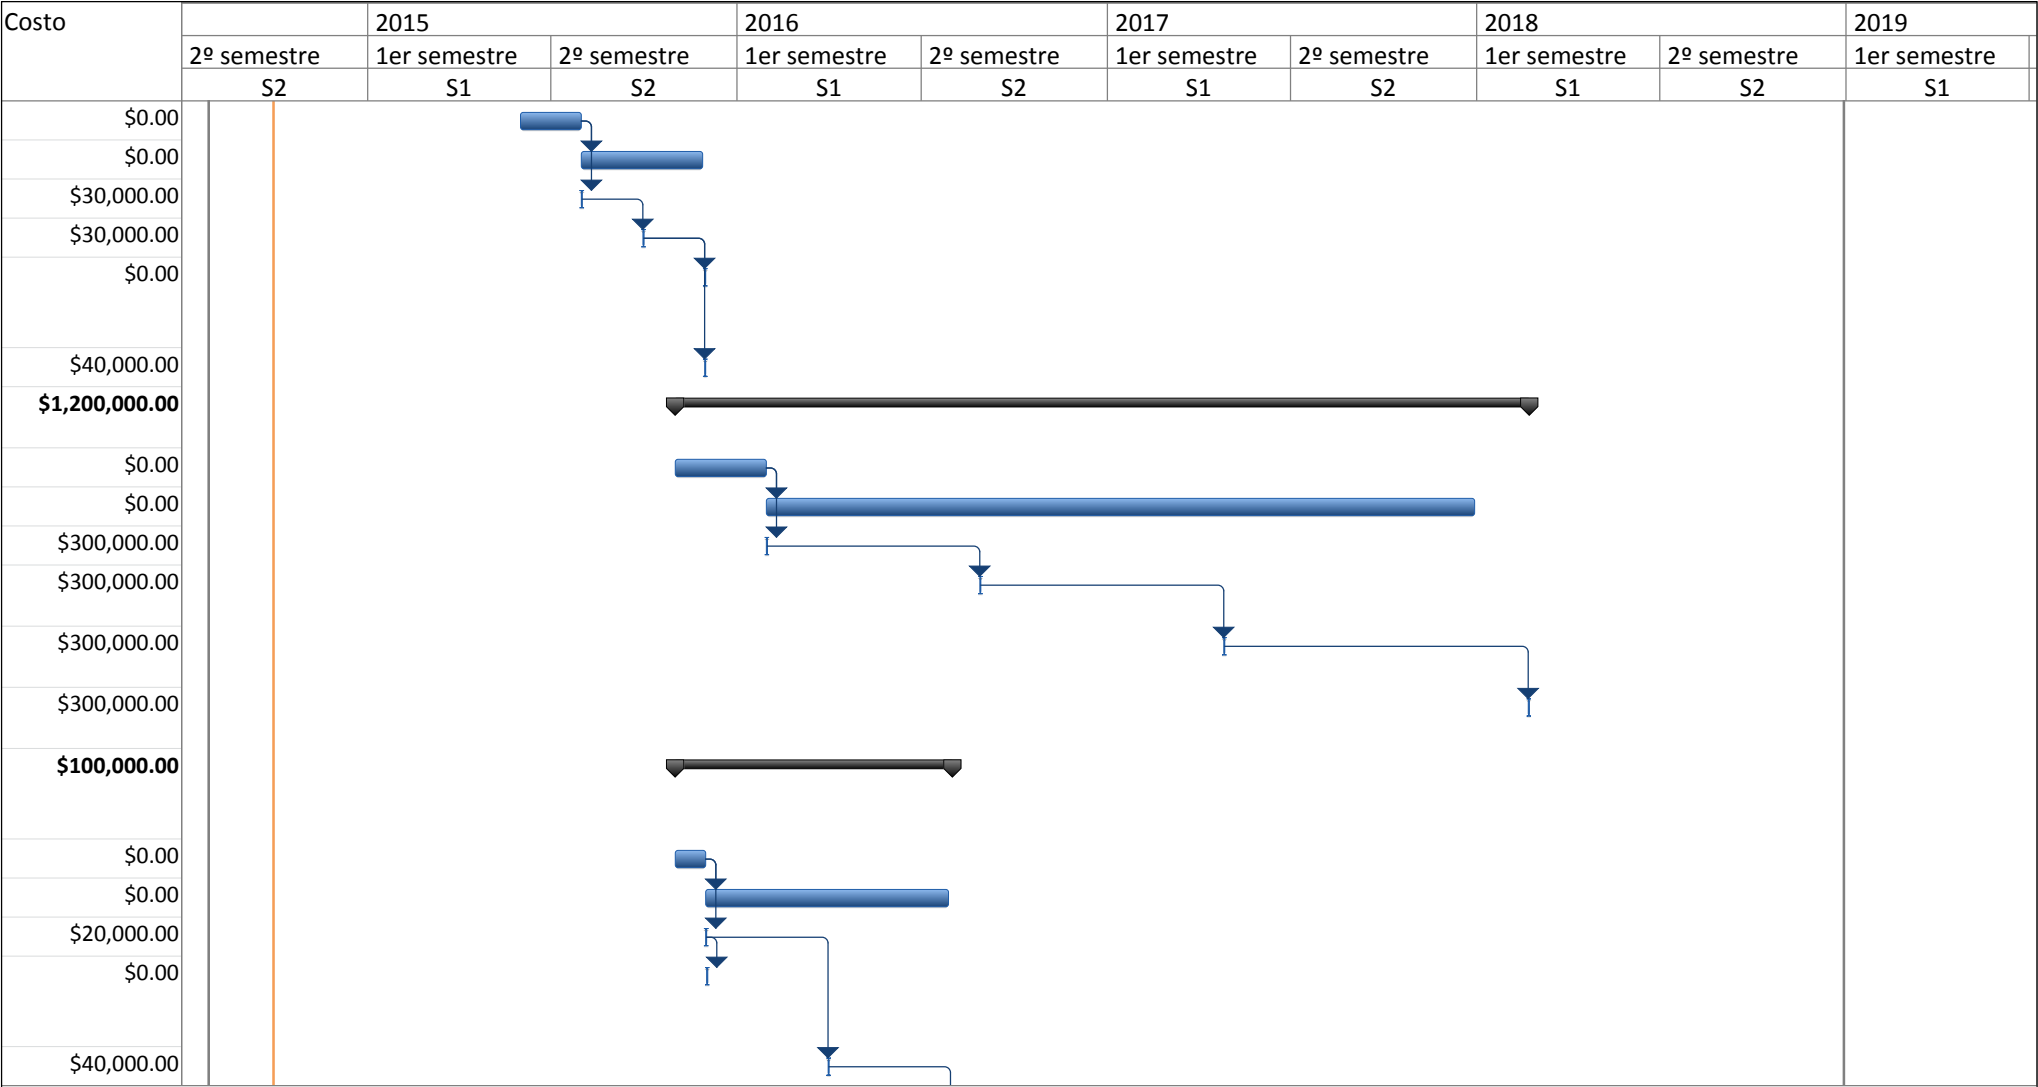

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual


Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 10

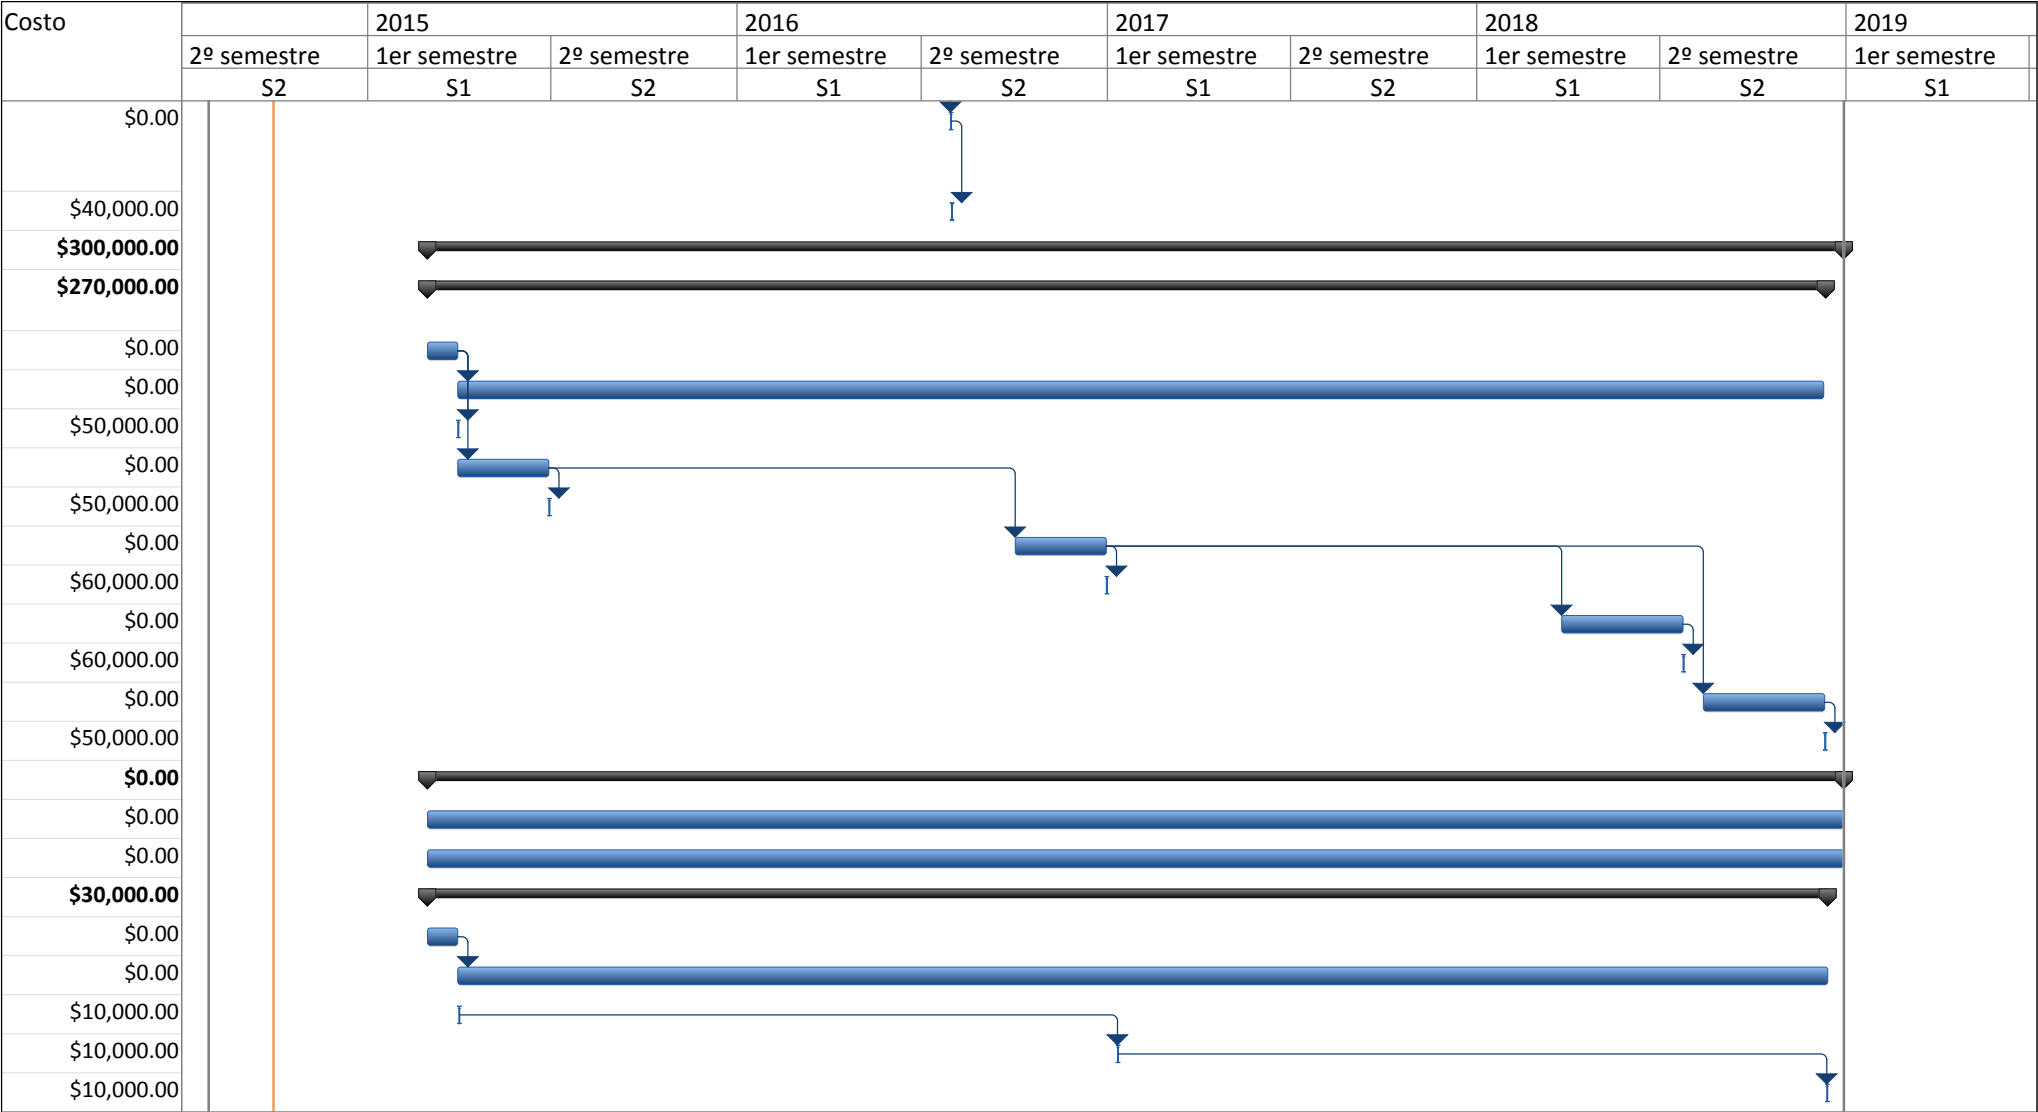

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

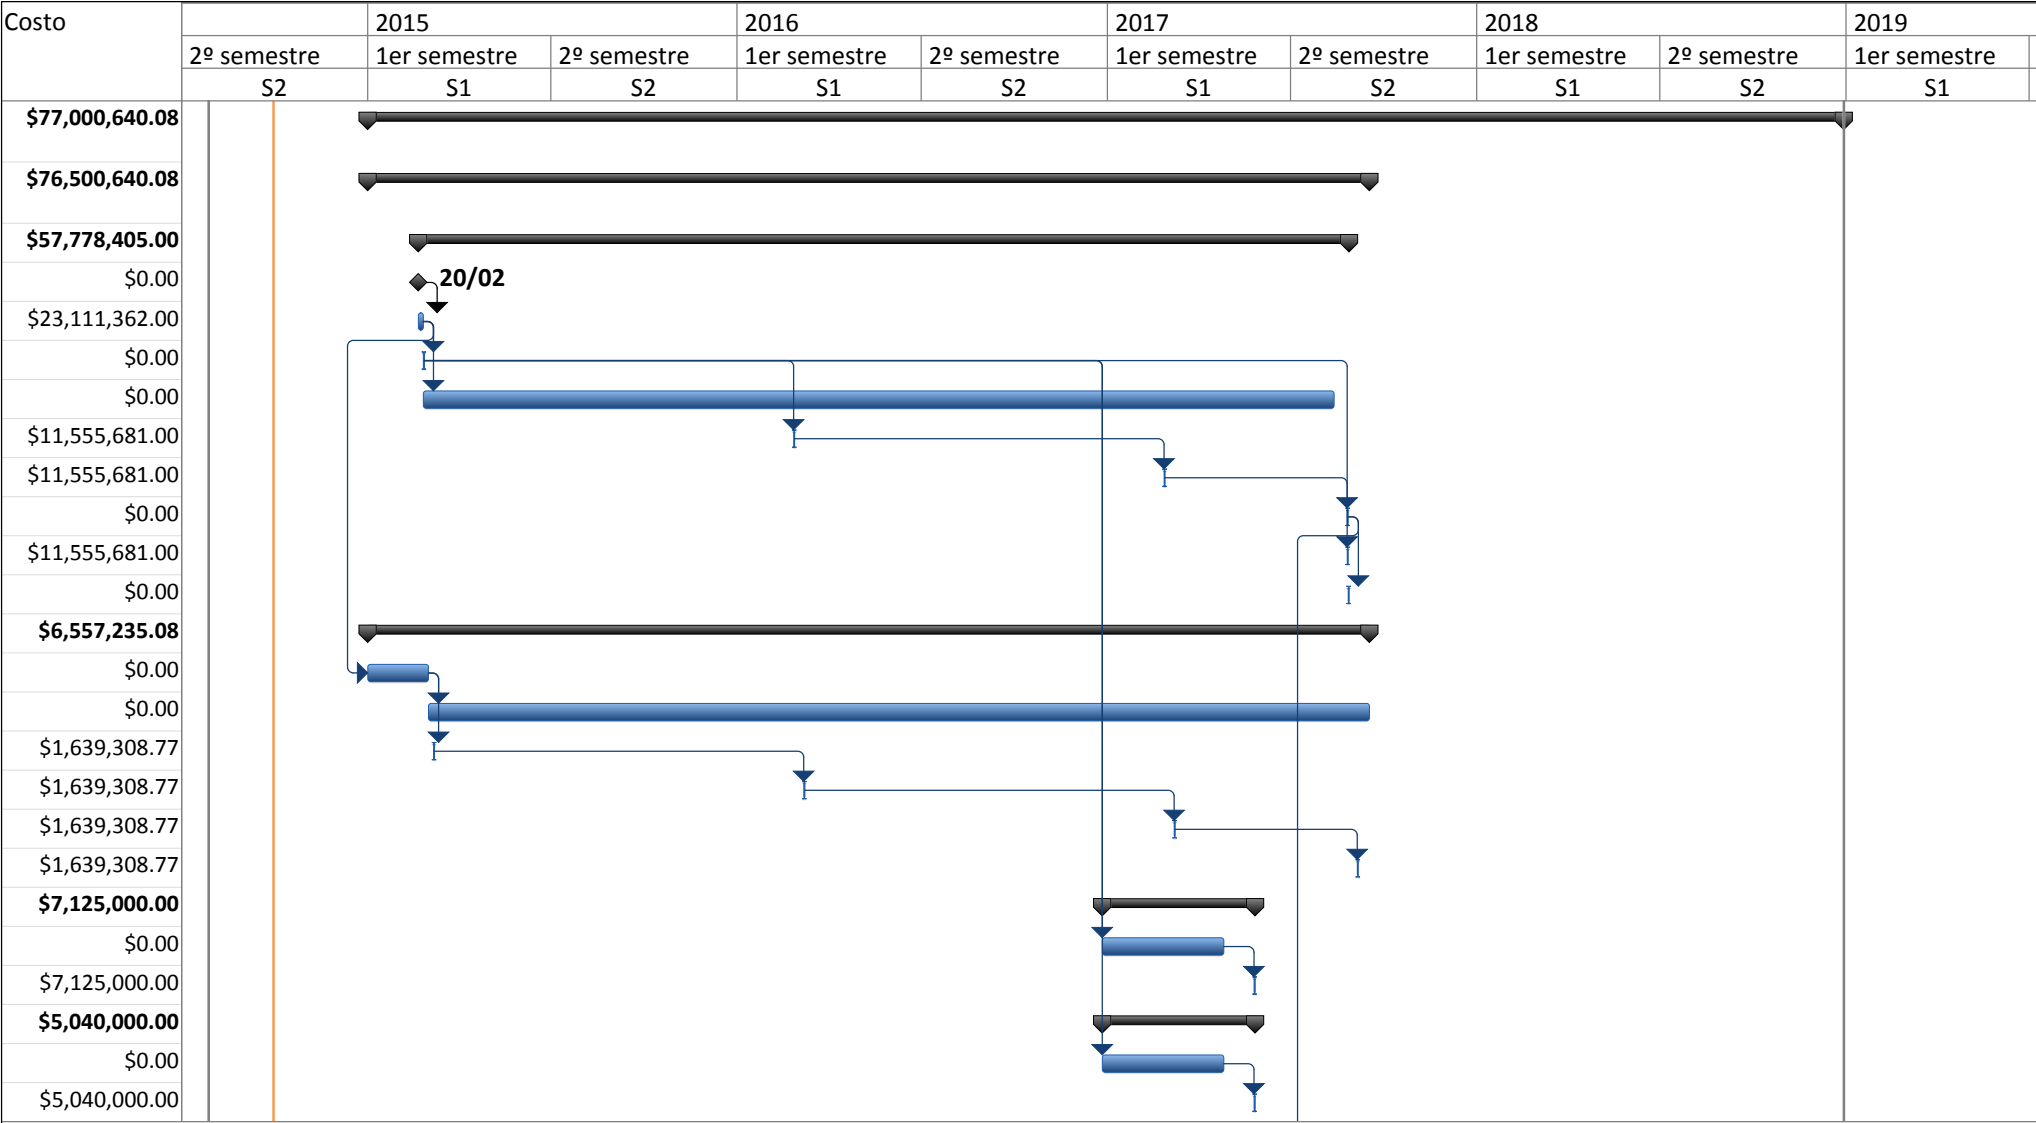

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual


Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 12

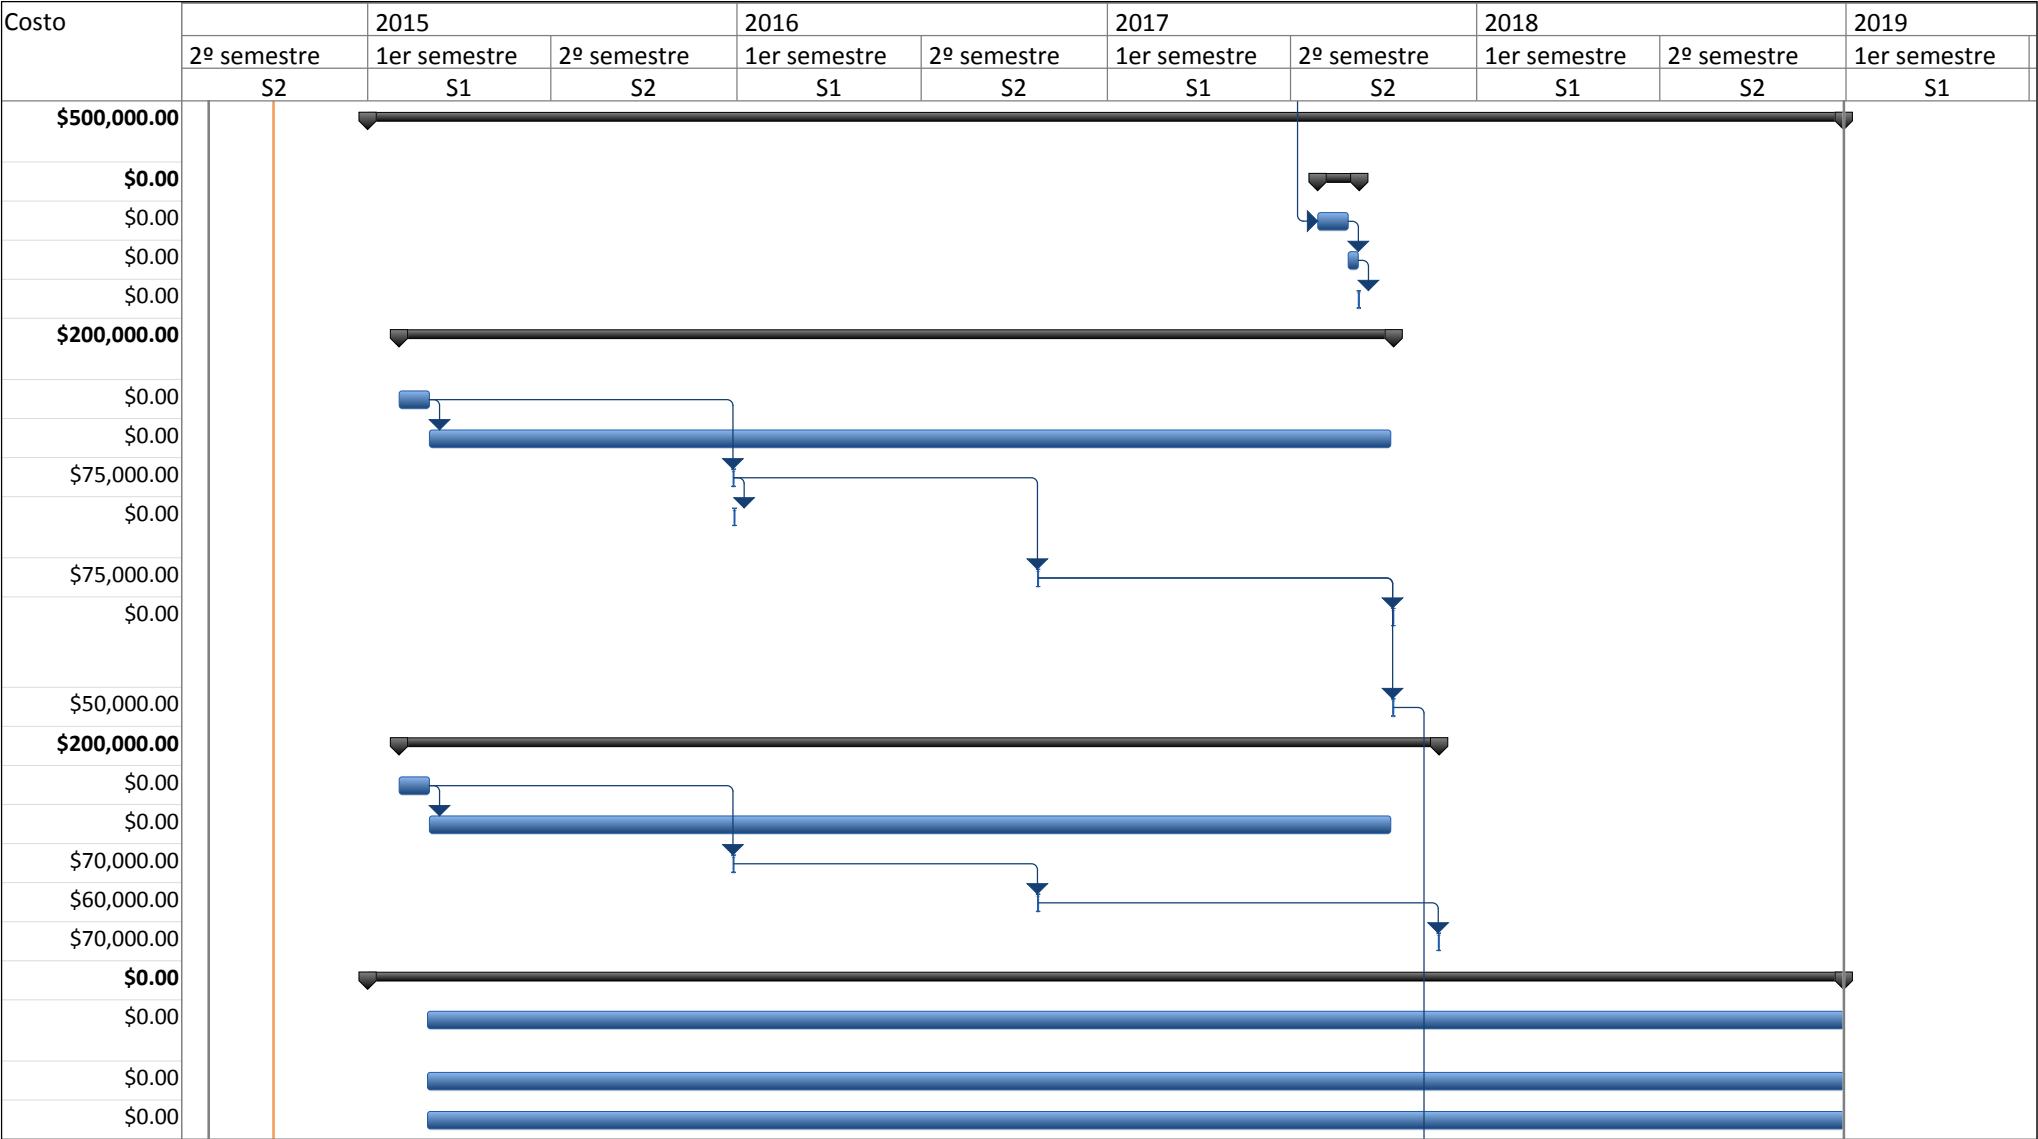

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen
Fecha: mar 30/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual


Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

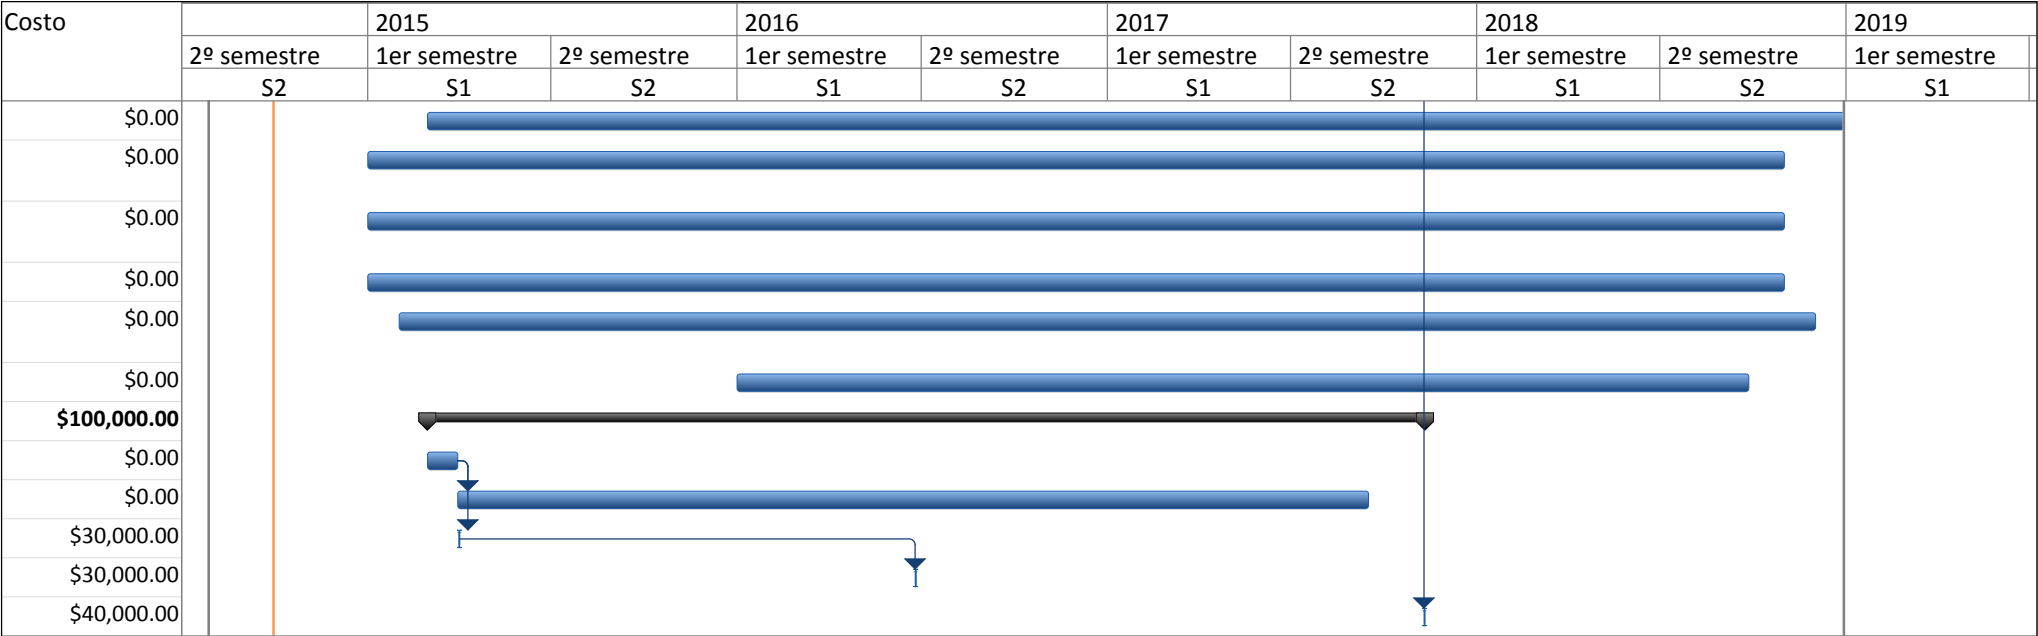

Proyecto: PEP_ECL1129Resumen Fecha: mar 30/09/14	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	
