



Operation Number: **AR-L1120**  
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
 Last Update: **3/29/2016**  
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**  
 Division Chief validation date: **04/13/2016**  
 Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Provincial Agricultural Services Program - PROSAP III	Loan Number:	2573/OC-AR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca		
Team Leader:	Quiroga, Ricardo E.	Sector/Subsector:	SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1120	\$230,000,000.00	\$230,000,000.00	\$57,500,000.00	\$0.00	\$287,500,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1120	\$230,000,000.00	\$215,694,780.73	93.78%	\$14,305,219.27


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Satisfactory

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

### Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

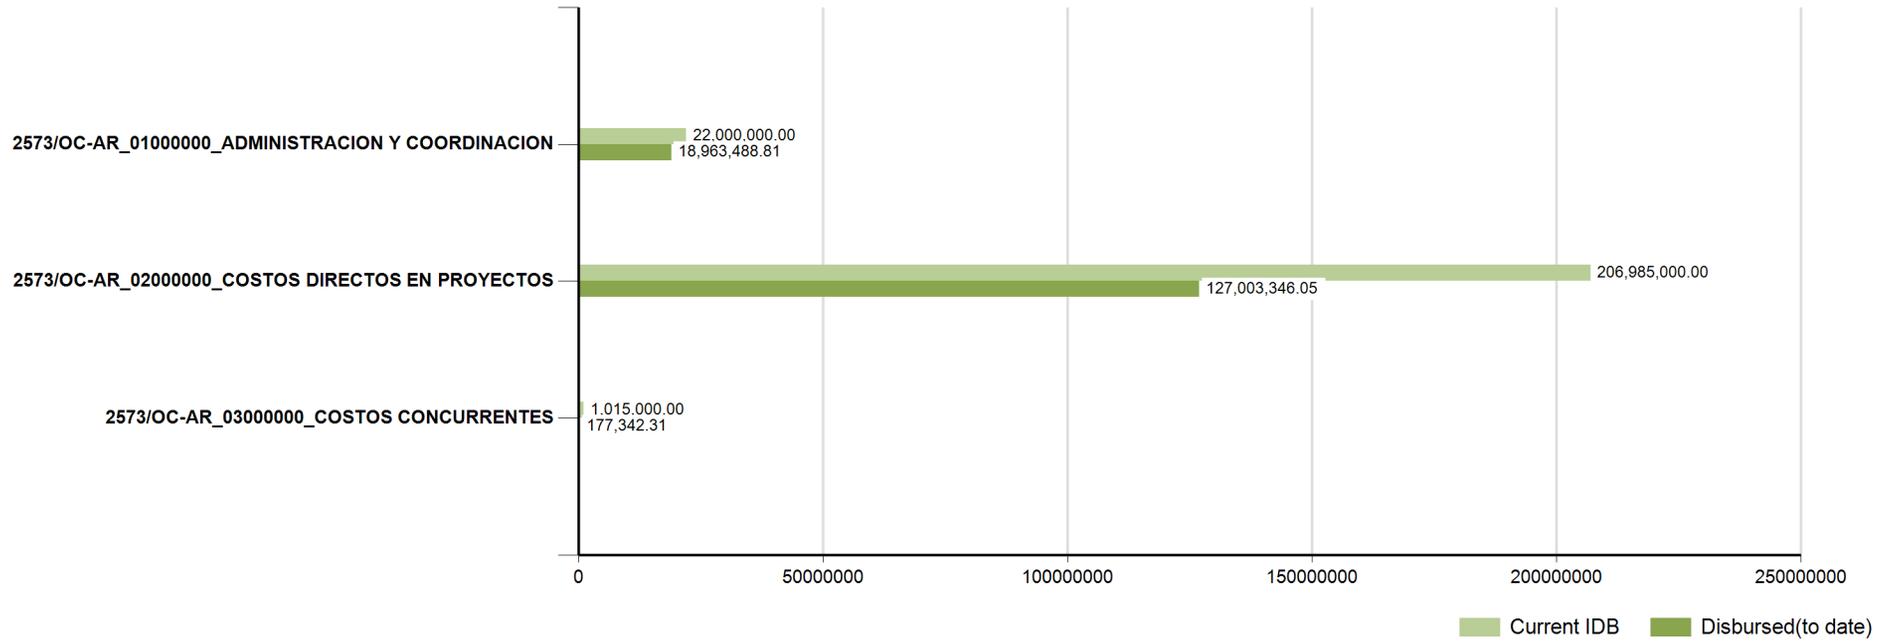

## Results Matrix

### Impacts

<b>Impact:</b>	1 Contribución al desarrollo de las economías rurales regionales lograda.							
<b>Observation:</b>								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Tasa de crecimiento medio anual de la Productividad total de los factores del sector agropecuario.		Tasa	3.80	2007		LB: 2001-2007. Basado en Ludena 2010	P	3.81
							P(a)	3.81
							A	
1.2 Coeficiente de exportaciones agroalimentarias sobre exportaciones totales.		Coeficiente	33.40	2006	Fuente: INDEC		P	33.41
							P(a)	33.41
							A	
1.3 Porcentaje de participación de las exportaciones regionales agropecuarias en el total de las exportaciones agropecuarias del país		Porcentaje	20.30	2009	LB: 2005-2009.	Fuente: INDEC	P	20.31
							P(a)	20.31
							A	

RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

### Outcomes

<b>Outcome:</b>	0 Mejora en las características físicas y operativas de las entidades institucionales del PROSAP a nivel provincial												
<b>Observation:</b>													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
0.0 Mejora en las características físicas y operativas de las entidades institucionales del PROSAP a nivel provincial		%	63.00	2010			P					90.00	
							P(a)					90.00	
							A						
<b>Outcome:</b>	1 Entidades de enlace fortalecidas en sus capacidades técnicas y operativas												
<b>Observation:</b>													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Entidades que completaron más del 90% de las actividades de sus planes de fortalecimiento.		Entidades	0.00	2011			P	3.00	3.00	6.00	6.00	18.00	
							P(a)	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	18.00
							A						
<b>Outcome:</b>	2 Rendimiento por hectárea incrementado para Mendoza (Red Terciaria) y San Juan (Red Secundaria)												
<b>Observation:</b>													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
2.0 Rendimiento por Ha. en Mendoza (Quinta Zona)		tn/ha	17.00	2012			P					19.40
							P(a)					19.40
							A					
2.1 Rendimiento por Ha. en San Juan (Red Secundaria)		tn/ha	21.00	2011			P					26.00
							P(a)					26.00
							A					

**Outcome:** 3 Eficiencia de conducción del sistema mejorada para Mendoza (Red Terciaria) y San Juan (Red Secundaria y Canal del Norte)

**Observation:**

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
3.0 Eficiencia de conducción del Sistema en Mendoza (Quinta Zona)		%	42.00	2012			P					57.00
							P(a)					57.00
							A					
3.1 Eficiencia de conducción del Sistema en San Juan (Red Secundaria)		%	48.00	2011			P					57.00
							P(a)					57.00
							A					

**Outcome:** 4 Accesibilidad rural mejorada a través de obras de infraestructura en caminos

**Observation:**

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
4.0 Días de intransitabilidad reducido		Dias	100.00	2011			P					0.00
							P(a)					0.00
							A					

**Outcome:** 5 Transito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado.

**Observation:**

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
5.0 Tránsito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado		transito medio	285.00	2012			P					356.00
							P(a)					356.00
							A					

**Outcome:** 6 Tiempo de atención de incendios reducido (Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos Rionegrinos)

**Observation:**

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
6.0 Tiempo de respuesta la atención de incendios		minutos	30.00	2012			P					16.00
							P(a)					16.00
							A					

**Outcome:** [7 Clusters consolidados con mejoras en su acceso a mercados](#)

**Observation:**

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
7.0 Producción del Cluster Quesero de Villa María		toneladas	95,173.00	2010			P					99,931.00
							P(a)					99,931.00
							A					
7.1 Producción del Cluster de Frutos Secos de Río Negro		toneladas	900.00	2010			P					945.00
							P(a)					945.00
							A					

**Outcome:** [8 Cobertura mejorada de servicios a agricultores](#)

**Observation:**

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
8.1 Beneficiarios directos del PROSAP, a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agropecuarias	RF	Agricultores	0.00	2012			P				17,000.00	17,000.00
							P(a)				0.00	18,000.00
							A					

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress**

Administración del Programa							
Infraestructura Hídrica		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Secundaria, Canal del Norte, San Juan.	Héctareas	P		19,671.00	P	521,539.00	6,379,823.00
		P(a)	0.00	19,671.00	P(a)	2,317,144.00	5,650,573.00
		A		19,671.00	A	956,752.00	5,019,430.00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Rincón Catamarca.	Hectáreas	P		450.00	P		3,434,487.00
		P(a)	226.00	450.00	P(a)	2,000,000.00	4,282,197.00
		A	314.00	436.00	A	1,034,079.00	2,201,957.00
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Quinta Zona	Hectáreas	P		28,650.00	P	5,500,000.00	55,000,000.00
		P(a)	12,034.00	28,937.00	P(a)	18,494,216.00	44,142,609.00
		A	11,174.00	25,213.00	A	19,804,221.00	37,363,504.00
Hectáreas de riego rehabilitadas en el Valle Bonaerense del Río Colorado - CORFO	Hectáreas	P		130,000.00	P		6,607,560.00
		P(a)	65,000.00	130,000.00	P(a)	4,523,137.00	8,137,686.00
		A	65,000.00	130,000.00	A	1,906,985.00	5,114,985.00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Andaluca Cerro Negro (2da etapa), Catamarca.	Hectáreas	P		1,146.00	P		2,687,500.00
		P(a)	700.00	0.00	P(a)	4,000,000.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Belén y Pomán, Catamarca.	Hectáreas	P		1,570.00	P		12,074,133.00
		P(a)	700.00	1,570.00	P(a)	6,037,066.00	15,215,089.00
		A	0.00	0.00	A	1,977,013.00	1,977,013.00
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona	Hectáreas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	3,688.00	9,219.00	P(a)	8,000,000.00	22,618,999.00
		A	8,112.00	8,112.00	A	13,575,907.00	13,575,907.00
Infraestructura Transporte		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Kilómetros de caminos de las redes secundarias y terciarias mejorados de la Zona VII C de Entre Ríos.	Kms	P		49.37	P	15,603,366.00	38,428,871.00
		P(a)	26.00	48.00	P(a)	13,000,000.00	45,595,375.00
		A	19.00	42.00	A	20,891,117.00	37,908,304.00
Servicios Agropecuarios. Desarrollo Productivo Integral. Río Negro.		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Frigoríficos construido y en funcionamiento.	Frigorífico	P		1.00	P	2,527,000.00	8,423,741.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Mataderos rurales nuevos y/o remodelados.	Matadero	P	2.00	7.00	P	1,479,000.00	4,930,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Plan de alimentación, sanidad y mejora genética implementado.	Plan	P		1.00	P	1,227,000.00	4,090,000.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Servicios Agropecuarios. Manejo de Recursos Naturales.		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Centrales construidas y remodeladas. Río Negro.	Centrales	P		3.00	P		3,801,986.00
		P(a)	4.00	4.00	P(a)	2,000,000.00	6,091,492.00
		A		0.00	A	3,077,068.00	3,115,978.00

Equipamiento para ataque inicial y combate adquirido. Chubut.	Equipamiento	P	1.00	1.00	P		2,733,934.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A			A		
<b>Desarrollo y Competitividad. Aportes No Reembolsables y Clusters.</b>		<b>Physical Progress</b>			<b>Financial Progress</b>		
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>		2015	EOP		2015	EOP
Emprendimientos agroalimentarios insertados en clusters o cadenas de valor	Planes de Negocios	P	50.00	150.00	P	4,500,000.00	13,500,000.00
		P(a)	300.00	300.00	P(a)	5,000,000.00	8,300,516.00
		A	76.00	76.00	A	1,128,064.00	1,312,726.00
Clusters agroalimentarios asistidos y consolidados	Clusters	P	3.00	9.00	P	2,500,000.00	7,500,000.00
		P(a)	10.00	28.00	P(a)	4,074,760.00	5,387,377.00
		A	7.00	18.00	A	2,097,022.00	2,815,447.00
<b>Costos Concurrentes.</b>							
<b>Proyectos sin asignar</b>							
<b>Proyectos de Emergencia</b>		<b>Physical Progress</b>			<b>Financial Progress</b>		
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>		2015	EOP		2015	EOP
Proyectos de Post-Emergencia ejecutados en las Provincias afectadas por el Volcán Peyehue	Proyectos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	8.00	15.00	P(a)	8,750,000.00	16,856,820.00
		A	2.00	2.00	A	10,638,591.00	11,894,008.00
Centro de mejoramiento genético ovino construido y equipado	Centro	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	450,000.00	1,150,037.00
		A	1.00	1.00	A	1,142,894.00	1,142,894.00
<b>Zonas Rurales con Acceso a Sistemas de Energía</b>		<b>Physical Progress</b>			<b>Financial Progress</b>		
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>		2015	EOP		2015	EOP
Kilómetros de cañerías del Gasoducto desarrollado en Areas Productivas de Entre Ríos instalados	Kilómetros de cañerías	P		31.00	P		4,652,406.00
		P(a)		34.10	P(a)	1,642,803.00	6,115,671.00
		A		34.10	A	84.00	4,472,952.00
Kilómetros de extendido eléctrico instalado en zonas rurales de la Provincia del Chaco	Kilómetros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	842.00	1,665.00	P(a)	18,000,000.00	16,507,405.00
		A	320.00	320.00	A	3,881,486.00	3,881,486.00
<b>Servicios Agropecuarios. Desarrollo Comercial.</b>		<b>Physical Progress</b>			<b>Financial Progress</b>		
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>		2015	EOP		2015	EOP
Empresas asesoradas en posicionamiento en mercados agroalimentarios externos - PROARGEX II	Empresa	P	90.00	300.00	P	3,550,290.00	11,834,300.00
		P(a)	200.00	1,380.00	P(a)	4,500,000.00	13,473,518.00
		A	315.00	1,305.00	A	3,554,852.00	12,946,386.00
Empresas asesoradas en adecuación de productos con valor agregado - PROCAL III	Empresa	P		0.00	P		0.00
		P(a)	120.00	1,914.00	P(a)	2,500,000.00	4,414,301.00
		A	320.00	1,034.00	A	2,779,731.00	2,934,244.00
Misiones comerciales permanentes del sector agroalimentario en el exterior instaladas y operando	Misiones	P		0.00	P		0.00
		P(a)	2.00	1.00	P(a)	2,000,000.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
<b>Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola. Chubut.</b>		<b>Physical Progress</b>			<b>Financial Progress</b>		
<b>Outputs</b>	<b>Unit of Measure</b>		2015	EOP		2015	EOP
Plataforma agroalimentaria construida. Chubut	Plataforma	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	6,096,582.00	14,975,553.00
		A		0.00	A	5,273,009.00	11,867,224.00

Obras Menores para el Desarrollo Rural		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Proyectos ejecutados	Proyecto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	6.00	15.00	P(a)	4,000,000.00	7,121,107.00
		A	2.00	4.00	A	3,371,984.00	3,693,772.00

Other Cost		2015	Cost
Unidad Ejecutora Central	P	\$2,725,000.00	\$11,075,000.00
	P(a)	\$1,944,204.00	\$19,614,768.00
	A	\$5,880,786.00	\$16,936,582.00
Auditorías	P	\$500,000.00	\$1,500,000.00
	P(a)	\$650,000.00	\$134,229.00
	A	\$32,309.00	\$75,765.00
Seguimiento y evaluación.	P	\$500,000.00	\$1,500,000.00
	P(a)	\$800,000.00	\$749,881.00
	A	\$145,611.00	\$567,169.00
Fortalecimiento Institucional	P	\$1,000,000.00	\$3,466,667.00
	P(a)	\$1,700,000.00	\$8,231,627.00
	A	\$2,422,229.00	\$7,438,775.00
Preparación de Proyectos	P	\$2,000,000.00	\$8,490,302.00
	P(a)	\$1,017,373.00	\$11,955,863.00
	A	\$2,821,718.00	\$10,304,612.00
<b>Total Cost</b>	P	\$44,133,195.00	\$212,110,710.00
	P(a)	\$123,497,285.00	\$285,079,974.00
	A	\$108,393,512.00	\$198,561,120.00

### Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Producción del Cluster de Frutos Secos de Río Negro	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Producción del Cluster Quesero de Villa María	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Tiempo de respuesta la atención de incendios	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Tránsito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Días de intransitabilidad reducido	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Eficiencia de conducción del Sistema en San Juan (Red Secundaria)	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015

Outcome	Eficiencia de conducción del Sistema en Mendoza (Quinta Zona)	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento por Ha. en San Juan (Red Secundaria)	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento por Ha. en Mendoza (Quinta Zona)	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Mejora en las características físicas y operativas de las entidades institucionales del PROSAP a nivel provincial	Modify EOP P	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/29/2016	9/14/2015
Outcome	Producción del Cluster de Frutos Secos de Río Negro	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/22/2016	9/14/2015
Outcome	Beneficiarios directos del PROSAP, a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agropecuarias	Modify EOP P(a)	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/22/2016	9/14/2015
Outcome	Producción del Cluster Quesero de Villa María	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/22/2016	9/14/2015
Outcome	Producción del Cluster Quesero de Villa María	Modify Unit of Measure	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/22/2016	9/14/2015
Outcome	Producción del Cluster Quesero de Villa María	Modify Indicator name	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/22/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento por Ha. en Mendoza (Quinta Zona)	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/22/2016	9/14/2015
Outcome	Volumen de ventas de los clusters apoyados por el proyecto	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Tiempo de respuesta la atención de incendios	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Beneficiarios directos del PROSAP, a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agropecuarias	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Beneficiarios directos del PROSAP, a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agropecuarias	Modify Indicator name	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Cobertura mejorada de servicios a agricultores	Modify Statement	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Tránsito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015

Outcome	Días de intransitabilidad reducido	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Eficiencia de conducción del Sistema en Mendoza (Quinta Zona)	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Eficiencia de conducción del Sistema en San Juan (Red Secundaria)	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento por Ha. en San Juan (Red Secundaria)	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento por Ha. en Mendoza (Quinta Zona)	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Mejora en las características físicas y operativas de las entidades institucionales del PROSAP a nivel provincial	Create Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Entidades que completaron más del 90% de las actividades de sus planes de fortalecimiento.	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/18/2016	9/14/2015
Outcome	Pérdidas por incendios evitadas.	Delete Outcome	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Competitividad comercial de la cadena de carne ovina provincial incrementada. Río Negro.	Delete Outcome	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Chubut - Tiempo de detección de focos de incendio y despacho de medios.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Río Negro - El Bolsón. Tiempo de respuesta.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Río Negro - Bariloche. Tiempo de respuesta.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Chubut - Tiempo de llegada al incendio.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Tiempo de atención de incendios reducido (Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos Rionegrinos)	Modify Statement	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento de la Cadena Frutícola.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento de la Cadena Láctea.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015

Outcome	Rendimiento de la Cadena Ganadera.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento de la Cadena Vitivinícola.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento de la Cadena Apícola.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Clusters consolidados con mejoras en su acceso a mercados	Modify Statement	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Inversiones realizadas	Delete Outcome	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Area con infraestructura de riego mejorada.	Delete Outcome	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Area con infraestructura de riego mejorada.	Delete Outcome	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad de la producción pecuaria provincial aumentada.	Delete Outcome	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Accesibilidad rural mejorada a través de obras de infraestructura en caminos	Modify Statement	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Coste de operación vehicular de ganadería.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Coste de operación vehicular de granos.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Eficiencia de conducción del sistema mejorada para Mendoza (Red Terciaria) y San Juan (Red Secundaria y Canal del Norte)	Modify Statement	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Uva Mosto	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Uva Mesa	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Uva Fina Vinificar	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015

Outcome	Productividad Hortalizas Verano Melón	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Hortalizas Verano Tomate	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Hortalizas Invierno Ajo	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Olivo para Aceite	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Pasturas	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Frutales Durazno	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Rendimiento por hectárea incrementado para Mendoza (Red Terciaria) y San Juan (Red Secundaria)	Modify Statement	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Vid Blancas A	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Vid Blancas B	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Vid Común	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Frutales de Carozo	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Olivo	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Zapallo	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Melón-Sandía	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Cebolla	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Ajo	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Tomate Industria	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015

Outcome	Productividad Vid Tintas B	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Productividad Vid tintas A	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Mejora en las características físicas y operativas de las entidades institucionales del PROSAP a nivel provincial	Modify Statement	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Déficits relativos a falencias en materia de conocimientos o destrezas del personal.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Déficits ocasionados por la insuficiencia o inexistencia de recursos humanos y materiales.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Déficits vinculados con debilidades de los esquemas organizativos.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Déficits debido a relaciones interinstitucionales disfuncionales.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Outcome	Déficit relacionados con las reglas de juego.	Delete Outcome Indicator	En la reunion del 14 de septiembre de 2014 se acordaron cambios en los indicadores de resultados del Programa de forma tal de que los mismos esten alineados con las acciones productos que el PROSAP esta ejecutando. Ver doc #40170153.	3/17/2016	9/14/2015
Output	Centro de mejoramiento genético ovino construido y equipado	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/14/2016	2/22/2016
Output	Proyectos de Post-Emergencia ejecutados en las Provincias afectadas por el Volcán Peyehue	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/14/2016	2/22/2016
Output	Misiones comerciales permanentes del sector agroalimentario en el exterior instaladas y operando	Inactivate Output	La UE informo al Banco que este producto no se va a realizar debido a cambio de prioridades del programa.	3/10/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas en Andaluca Cerro Negro (2da etapa), Catamarca.	Inactivate Output	La UE informo al Banco que este producto no se va a realizar debido a cambio de prioridades del programa.	3/2/2016	2/22/2016
Output	Plataforma agroalimentaria construida. Chubut	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Misiones comerciales permanentes del sector agroalimentario en el exterior instaladas y operando	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Empresas asesoradas en posicionamiento en mercados agroalimentarios externos - PROARGEX II	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Clusters agroalimentarios asistidos y consolidados	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Emprendimientos agroalimentarios insertados en clusters o cadenas de valor	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Centrales construidas y remodeladas. Río Negro.	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Kilómetros de caminos de las redes secundarias y terciarias mejorados de la Zona VII C de Entre Ríos.	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificacion financiera.	3/1/2016	2/22/2016

Output	Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificación financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas en Belén y Pomán, Catamarca.	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificación financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas en Andaluca Cerro Negro (2da etapa), Catamarca.	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificación financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas en el Valle Bonaerense del Río Colorado - CORFO	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificación financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Quinta Zona	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificación financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas en Rincón Catamarca.	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificación financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Secundaria, Canal del Norte, San Juan.	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con cambios en la planificación financiera.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Misiones comerciales permanentes del sector agroalimentario en el exterior instaladas y operando	Modify Physical P(a) value	Producto desactivado.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Empresas asesoradas en adecuación de productos con valor agregado - PROCAL III	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con lo informado por la UE, replanificación.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Empresas asesoradas en posicionamiento en mercados agroalimentarios externos - PROARGEX II	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con lo informado por la UE, replanificación.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Kilómetros de extendido eléctrico instalado en zonas rurales de la Provincia del Chaco	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con lo informado por la UE, replanificación.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Clusters agroalimentarios asistidos y consolidados	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con lo informado por la UE, replanificación.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Kilómetros de caminos de las redes secundarias y terciarias mejorados de la Zona VII C de Entre Ríos.	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con lo informado por la UE, replanificación.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con lo informado por la UE, replanificación.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas en Andaluca Cerro Negro (2da etapa), Catamarca.	Modify Physical P(a) value	Producto desactivado.	3/1/2016	2/22/2016
Output	Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Quinta Zona	Modify Physical P(a) value	De acuerdo con lo informado por la UE, replanificación.	3/1/2016	2/22/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
