





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Ministerio Coordinador de Patrimonio				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INFRASTRUCTURE AND HISTORIC SITES				
Loan Number(s):	2678/OC-EC	Current Approved Amount:	37.840.000,00	Original IDB:	37.840.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	37.840.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	95,00
Related Operation(s):		Balance:	37.840.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	37.840.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	27-abr-2012
		Validated by Country Representative:	30-abr-2012

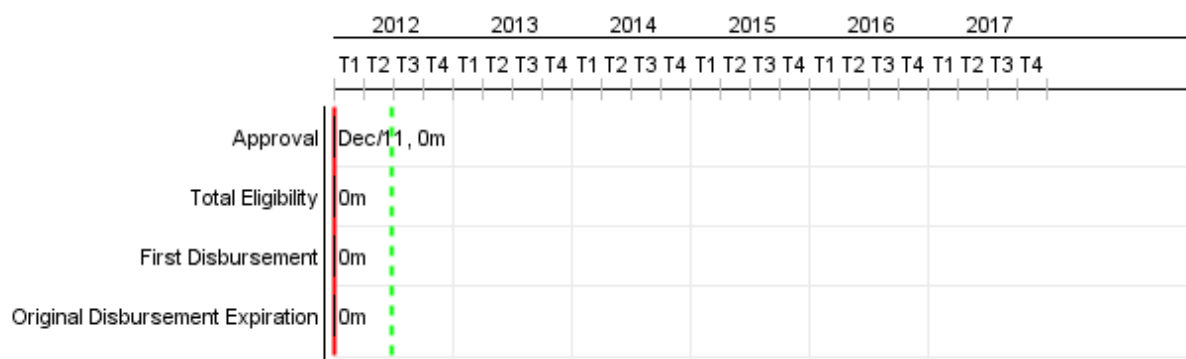

Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome: Conocimiento sobre BCP incrementado y sistematizado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Porcentaje de BCP registrados en el SNBCP.	Porcentaje	2.70	2011	P A			4.00			10.00
Consultas realizadas al SNBCP al año.	Consultas	90,000.00	2011	P A	100,000.00	140,000.00	180,000.00	220,000.00	270,000.00	270,000.00

Outcome: Valorización de los BCP de los proyectos demostrativos y las intervenciones emergentes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Inversiones conexas realizadas en Zaruma, Santa Elena y Pastaza-Puyo.	US\$		2010	P A			1,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00

Outcome: Modelos de gestión incorporados en los lineamientos de política del sector

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Modelos de gestión diseñados en base a mejores prácticas y aprobados	Modelos		2011	P A					2.00	2.00

Outcome: Capacidad del MCP para ejercer sus funciones de manera efectiva aumentada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Proyecto de Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP actualizada y presentada a la Presidencia de la República para ser remitida a la Asamblea Nacional.	Proyecto de Ley		2011	P A			1.00			1.00
Reglamento de coordinación inter-institucional sobre el patrimonio cultural aprobado	Reglamento		2011	P A					1.00	1.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento del registro y sistematización de los Bienes Culturales y Patrimoniales (BCP)									
Registros de BCP, ingresados y validados en el Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales	BCP				219.000,00				9.620.000,00
Software desarrollado y adquirido.	Software				5,00				658.000,00
Equipos para geo-referenciación y contingencia adquiridos	Equipos				2,00				242.000,00
Atlas de los BCP y mapa patrimonial del Ecuador, desarrollado	Atlas				1,00				100.000,00
Capacitación de profesionales para tareas de registro y sistematización de los BPC, implementada.	Personas				450,00				300.000,00
Implementar Proyectos demostrativos e intervenciones emergentes de recuperación patrimonial									
Estudios de definición de políticas de gestión por ámbito de BCP, realizados	Estudios				5,00				200.000,00
Estudios de sostenibilidad para el sistema integral de BCP en las intervenciones demostrativas	Estudios				3,00				1.000.000,00
Proyectos Demostrativos de BCP ejecutados.	Proyectos				25,00				17.520.000,00
Estudios e Intervenciones Emergentes de BCP Ejecutados.	Proyectos				5,00				5.000.000,00
Modelos de gestión sustentable									
Modelos de gestión diseñados y validados por el Ministerio Coordinador del Patrimonio y los Gobiernos Autonomos Descentralizados	Modelos				4,00				300.000,00
Entidades capacitadas en aspectos técnicos institucionales (Plan de transferencia realizado)	Entidades				15,00				500.000,00
Plan Estrategico de comunicación elaborado e implementado.	Plan				1,00				600.000,00
Fortalecer el Marco Juridico Institucional de los BCP									
Propuesta de marco normativo para la gestión de BCP desarrollada	Propuesta				2,00				70.000,00
Entidades usuarias del Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales - SNBCP	Entidades				10,00				350.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

EC-L1097 - Protection and Recovery of Cultural Heritage Assets program
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 14/03/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Unidad de gestión del conocimiento en el Ministerio de Coordinación del Patrimonio - MCP establecida	Unidad de Gestión				1,00				300.000,00
Intercambios para buenas practicas de los BCP con instituciones internacionales afines realizados	Intercambios				5,00				350.000,00
Administracionn del Programa y Fiscalizacion									
Evaluacion									
Auditorias									
TOTAL									37.110.000,00
