
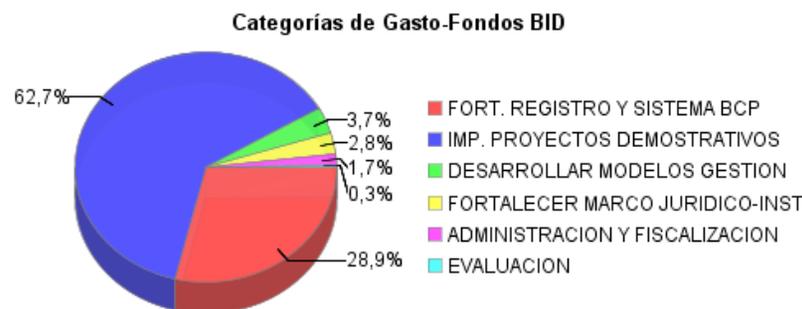
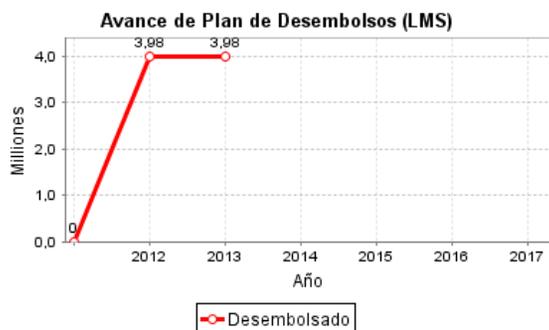



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Ministerio Coordinador de Patrimonio				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE				
Número(s) de Préstamo:	2678/OC-EC	Monto Aprobado Actual:	37.840.000,00	BID Original:	37.840.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	3.984.070,49	Actual BID:	37.840.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	10,53	Pari-passu:	95,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	33.855.929,51	Co-financiamiento/País:	2.160.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	40.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 12-abr-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013

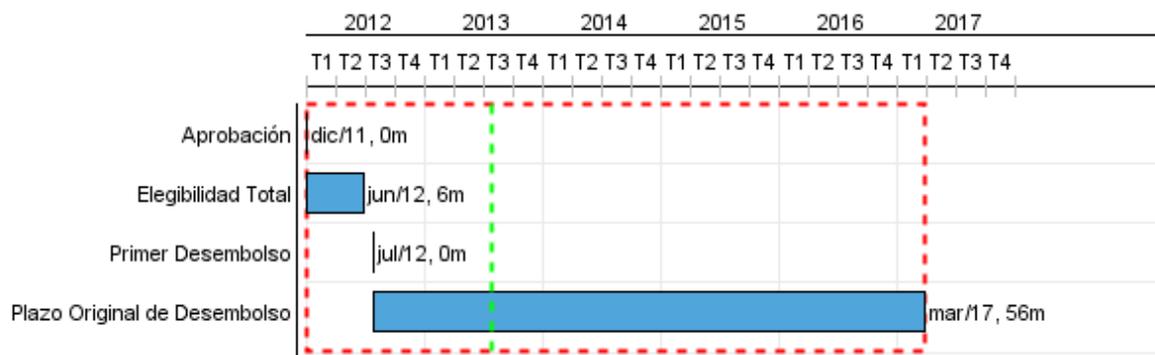

Progreso Acumulado al 2012

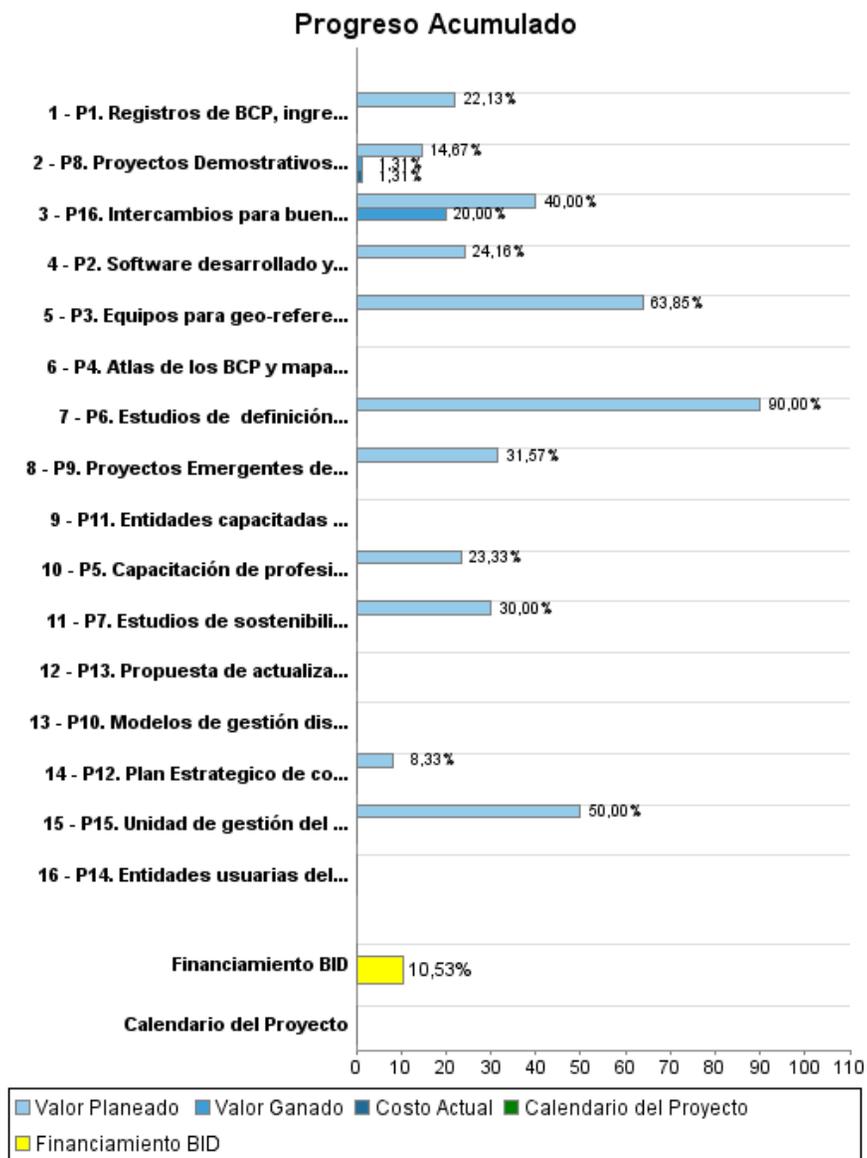

Resultados

Resultado: Conocimiento sobre BCP incrementado y sistematizado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Porcentaje de BCP registrados en el SNBCP.	Porcentaje	2,70	2011	P A			4,00			10,00
Consultas realizadas al SNBCP al año.	Consultas	90.000,00	2011	P A	100.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00

Resultado: Valorización de los BCP de los proyectos demostrativos y las intervenciones emergentes

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Inversiones conexas realizadas en Zaruma, Santa Elena y Pastaza-Puyo.	US\$		2010	P A			1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00
% de mujeres que participaron en actividades vinculadas a la rehabilitación de bienes culturales	Porcentaje		2011	P A						25,00

Resultado: Modelos de gestión incorporados en los lineamientos de política del sector

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Modelos de gestión diseñados en base a mejores prácticas y aprobados	Modelos		2011	P A					2,00	2,00

Resultado: Capacidad del MCP para ejercer sus funciones de manera efectiva aumentada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Proyecto de Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP actualizada y presentada a la Presidencia de la República para ser remitida a la Asamblea Nacional.	Proyecto de Ley		2011	P A			1,00			1,00
Reglamento de coordinación inter-institucional sobre el patrimonio cultural aprobado	Reglamento		2011	P A					1,00	1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
C1. FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS BCP									
P1. Registros de BCP, ingresados y validados en el Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales	BCP	12.000,00			219.000,00	527.123,00			9.620.000,00
P2. Software desarrollado y adquirido.	Software	2,00			8,00	68.000,00			540.840,00
P3. Equipos para geo-referenciación y contingencia adquiridos	Equipos	2,00			2,00	242.000,00			426.000,00
P4. Atlas de los BCP y mapa patrimonial del Ecuador, desarrollado	Atlas				1,00				100.000,00
P5. Capacitación de profesionales para tareas de registro y sistematización de los BCP, implementada.	Personas				450,00				300.000,00
C2. IMPLEMENTACION PROYECTOS DEMOSTRATIVOS E INTERVENCIONES EMERGENTES									
P6. Estudios de definición de políticas de gestión por ámbito de BCP, realizados	Estudios	2,00			5,00	80.000,00			200.000,00
P7. Estudios de sostenibilidad para el sistema integral de BCP en las intervenciones demostrativas	Estudios				3,00				1.000.000,00
P8. Proyectos Demostrativos de BCP ejecutados.	Proyectos				25,00		230.000,00		17.520.000,00
P9. Proyectos Emergentes de BCP Ejecutados.	Proyectos				5,00				4.953.160,00
C3. DESARROLLO DE MODELOS DE GESTION SUSTENTABLES									
P10. Modelos de gestión diseñados y validados por el MCP y GAD (demostrativo, emergente y dos ámbitos)	Modelos				4,00				300.000,00
P11. Entidades capacitadas en aspectos técnicos institucionales (Plan de transferencia realizado).	Entidades				15,00				500.000,00
P12. Plan Estratégico de comunicación elaborado e implementado.	Plan				1,00				600.000,00
C4. FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL DE LOS BCP									
P13. Propuesta de actualización de la Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP, elaborada	Propuesta				1,00				50.000,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
P14. Entidades usuarias del Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales - SNBCP, capacitadas	Entidades				10,00				350.000,00
P15. Unidad de gestión del conocimiento en el Ministerio de Coordinación del Patrimonio - MCP establecida	Unidad de Gestión				1,00	75.000,00			300.000,00
P16. Intercambios para buenas practicas de los BCP con instituciones internacionales afines realizados	Intercambios	1,00	1,00		5,00	70.000,00			350.000,00
C5. ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL PROGRAMA									
Administración del programa	N/A					208.000,00	303.000,00		1.960.000,00
Fiscalización	N/A								630.000,00
C6. EVALUACION									
Evaluación Intermedia y Final	N/A								100.000,00
C7. AUDITORIAS									
Auditorías Financieras	N/A								200.000,00
TOTAL						1.270.123,00	533.000,00		40.000.000,00
