



Operation Number: **ES-L1017**
 Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
 Last Update: **4/22/2016**
 PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/22/2016**
 Division Chief validation date: **04/22/2016**
 Country Representative validation date: **04/25/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Legislative Branch Modernization II	Loan Number:	2492/OC-ES
Executing Agency (EA):	ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Theinhardt,Jean Eric	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1017	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1017	\$5,000,000.00	\$4,702,259.17	94.05%	\$297,740.83


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

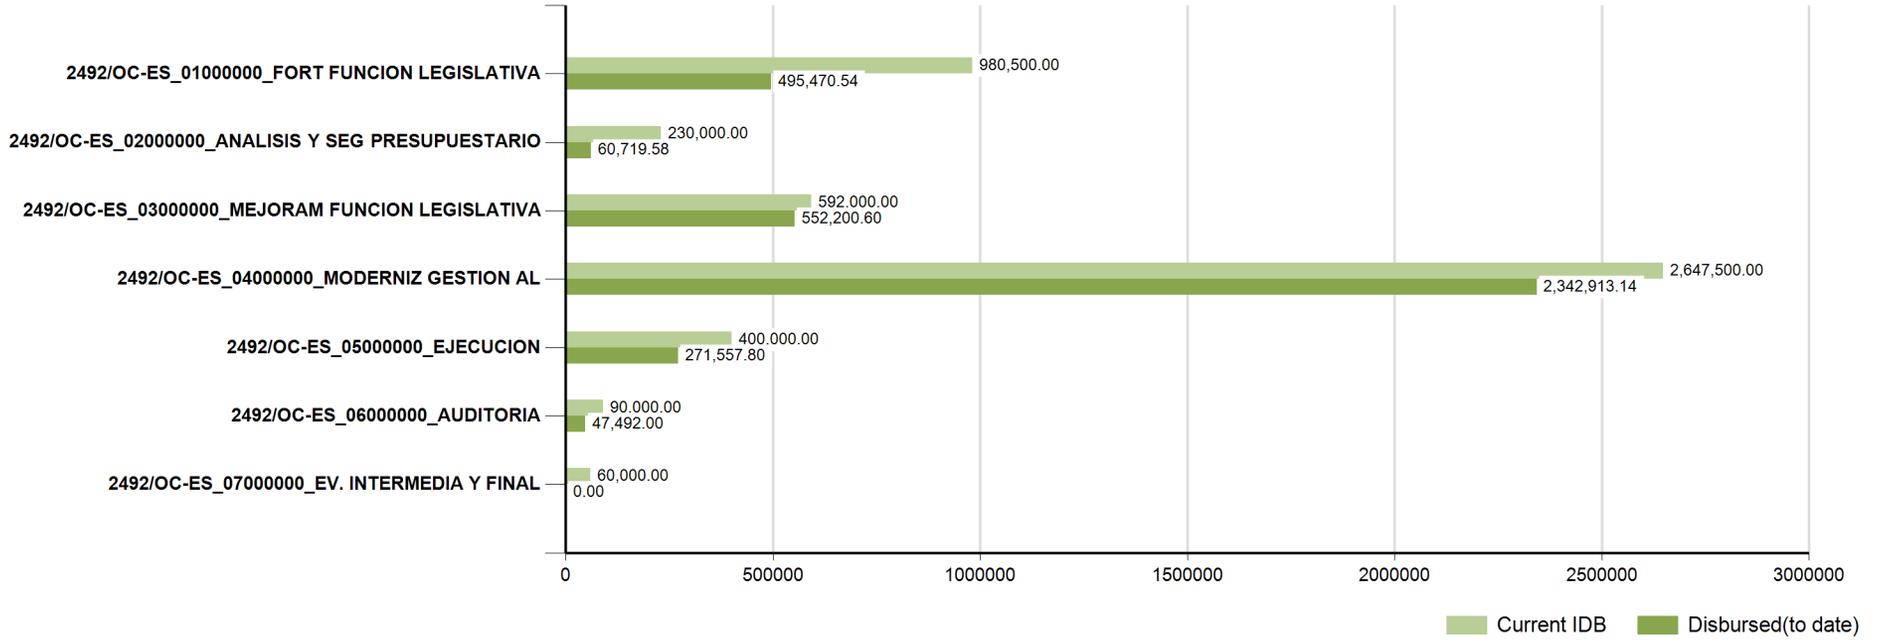

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Asamblea Legislativa fortalecida								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	EOP	
1.1 Índice de Capacidad de la Asamblea Legislativa		Índice	0.98	2005	Latinobarometro, World Economic Forum, Proyecto de Elites Latinoamericanas.	Índice creado por Berkman, Scartascini, Stein y Tommasi (2008, "Political Institutions, State Capabilities, and Public Policy: An International Dataset"), definido como un promedio simple entre los valores de 8 variables extraídas de las fuentes que se mencionan en la columna de " Fuentes/Medio de verificación", estandarizados bajo una escala de 0 a 3. El valor incluido como línea de base corresponde al año 2005, pero el equipo buscará actualizarlo en base a la última información disponible antes de la presentación de la propuesta de préstamo al Directorio.	P	1.50	1.50
							P(a)	1.50	1.50
							A	0.00	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Efectividad de los procesos legislativos incrementada
-----------------	---

Observation: Definido como un promedio simple entre los valores de 8 variables extraídas de las fuentes que se mencionan en la columna de ¿Fuentes/Medio de verificación¿, estandarizados bajo una escala de 0 a 3. El valor incluido como línea de base corresponde al año

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
1.1 Índice de efectividad de las entidades que formulan leyes		Índice	2.35	2008	Encuesta de Opinión del Foro Económico Mundial que es conducida por el Informe Global de Competitividad.		P	3.00
							P(a)	3.00
							A	
1.2 Grado de participación del legislativo en el análisis, debate y formulación del presupuesto.		Índice	31.00	2008	Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (Fundar).		P	36.00
							P(a)	36.00
							A	
1.3 Anteproyectos de Ley aprobados con relación a las Iniciativas presentadas.		%	32.00	2009	Gerencia de Operaciones Legislativas de la AL		P	40.00
							P(a)	40.00
							A	

Outcome: [2 Capacidad de seguimiento del desempeño sectorial fortalecida](#)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
2.1 Instituciones sobre las cuales la AL cuenta con información suficiente para hacerles seguimiento.		%	25.00	2009	Gerencia de Operaciones Legislativas de la AL		P	60.00
							P(a)	60.00
							A	

Outcome: [3 Acercamiento de las funciones legislativas a la ciudadanía mejorado](#)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
3.1 Dictámenes emitidos por las comisiones legislativas disponibles en el Portal Web.		%	0.00	2010	Portal Web de la AL		P	80.00
							P(a)	80.00
							A	

3.2 Anteproyectos de ley aprobados por el Pleno sobre los cuales se incluye información básica en el Portal Web.						P	60.00
						P(a)	60.00
		%	0.00	2010	Portal Web de la AL	A	
3.3 Informes de ejecución detallada del presupuesto de la AL disponibles en el Portal Web.						P	1.00
		Informes	0.00	2010	Portal Web de la AL	P(a)	1.00
						A	
3.4 Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de consulta pública.						P	4.00
		Anteproyectos	2.00	2010	Gerencia de Operaciones Legislativas de la AL	P(a)	4.00
						A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Índice Legislativo de leyes vigentes formulado	Índice	P		1.00	P		58,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	16,000.00	34,657.10
		A	1.00	1.00	A	6,377.10	6,377.10
Diputados capacitados	Diputados	P		320.00	P		609,000.00
		P(a)	84.00	520.00	P(a)	81,625.00	361,858.69
		A	100.00	536.00	A	24,749.88	361,858.69
Sistema Informático Técnico Legislativo (SITEL) implementado	Sistema	P		1.00	P		407,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	315,342.40	404,081.00
		A	0.00	0.00	A	172,267.40	239,156.00
Anteproyectos de Ley formulados	Anteproyectos de ley	P		1.00	P		400,000.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	102,685.48	163,563.27
		A	1.00	6.00	A	40,547.50	140,765.77
Proyectos de ley revisados	Proyectos de ley	P		1.00	P		407,000.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	46,769.40	138,956.60
		A	1.00	5.00	A	38,820.86	94,653.23
APOYO A LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO SECTORIAL Y PRESUPUESTARIO		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Proceso de Análisis del anteproyecto de ley de presupuesto fortalecido	Proceso	P		1.00	P		138,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,000.00	45,531.61
		A	0.00	0.00	A	25,039.54	29,685.54
Manual metodológico para la preparación y presentación de los informes sectoriales por parte de los ministerios elaborado	Manual	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	14,750.00	18,750.00
		A	1.00	1.00	A	7,500.00	18,750.00
Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario fortalecida	Unidad	P		1.00	P		92,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	55,400.00	51,137.23
		A	1.00	1.00	A	20,155.55	51,137.23
MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP	2015	EOP		
Encuestas de percepción ciudadana realizadas	Encuestas	P		2.00	P		184,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	18,000.00	57,770.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	16,950.00
Campaña de comunicación diseñada e implementada	Campaña	P		1.00	P		251,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	14,993.92	99,320.68
		A	0.00	1.00	A	687.68	58,206.76
Portal Web de la Asamblea Legislativa con nuevas funcionalidades	Portal	P		1.00	P		140,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	18,000.00	14,393.89
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Oficinas departamentales equipadas	Oficinas	P		5.00	P		122,000.00
		P(a)	2.00	13.00	P(a)	123,081.04	795,445.00
		A	2.00	11.00	A	74,240.61	445,445.00
Nuevos procesos implementados en las oficinas de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa	Consultas	P		721.00	P		73,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		69,045.08
		A	213.00	934.00	A	44,045.08	69,045.08

Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de participación ciudadana en su formulación incrementado	Anteproyectos	P		5.00	P		73,000.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	3,000.00	31,721.65
		A	1.00	7.00	A	0.00	29,200.15
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Módulos del Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) implementados	Sistema	P		1.00	P		934,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	59,000.00	232,102.52
		A	0.00	0.00	A	18,950.00	165,410.26
Salas de las Comisiones y Oficina Central equipadas	Salas	P		3.00	P		363,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	121,130.00	244,802.43
		A	1.00	4.00	A	115,414.60	215,180.43
Sistema de audio y video central para Salas de Comisiones adquirido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	200,000.00	200,000.00
		A	1.00	1.00	A	200,000.00	200,000.00
Sistema de Digitalización de Documentos de la Asamblea Legislativa	Sistema	P		1.00	P		173,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,000.00	64,308.35
		A	1.00	1.00	A	30,000.00	64,308.35
Estudios para diseño del nuevo Edificio de Asamblea Legislativa y mejora del edificio actual	Estudios	P		1.00	P		87,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		156,252.86
		A	1.00	4.00	A	1,130.00	156,252.86
Funcionarios administrativos y técnicos capacitados en sus funciones	Funcionarios	P		900.00	P		190,000.00
		P(a)	100.00	1,392.00	P(a)	44,000.00	160,277.04
		A	371.00	1,663.00	A	32,138.79	160,277.04
Sistema de Telefonía IP	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	48,000.00	183,432.42
		A	1.00	1.00	A	20,624.42	183,432.42
Radio Legislativa funcionando	Repetidoras	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	197,000.00	574,982.09
		A	0.00	2.00	A	6,666.00	568,314.09
Sistema de generación de energía solar para Edificio de Comisiones adquirido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	94,409.19	157,348.65
		A	1.00	1.00	A	94,409.19	157,348.65
Canal de Televisión Legislativa de Señal Abierta, adquirido	Canal	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	403,330.40	657,197.92
		A	1.00	1.00	A	125,359.92	657,197.92
Sistema de Votación Electrónica con equipo actualizado	Sist. actualizado	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	5,499.72	79,680.96
		A	1.00	1.00	A	5,499.72	79,680.96
Salón Azul con sistema de Iluminación modernizado	Salón	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		31,451.41
		A	1.00	2.00	A	7,119.00	31,451.41
Centro Cívico Cultural Legislativo equipado	Centro	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema de video para la Asamblea Legislativa adquirido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Administración							

Other Cost		2015	Cost
Ejecución, auditoría, evaluación e imprevistos	P	\$100,000.00	\$1,200,000.00
	P(a)	\$289,351.49	\$741,465.14
	A	\$112,074.00	\$625,508.39
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$100,000.00	\$6,001,000.00
	P(a)	\$2,331,368.04	\$5,969,533.59
	A	\$1,223,816.84	\$4,825,593.33

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Salón Azul con sistema de Iluminación modernizado	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/22/2016	2/5/2016
Output	Canal de Televisión Legislativa de Señal Abierta, adquirido	Modify Financial P(a) value	Se recibió una carta de la Unidad Ejecutora por medio de la cual se comunica al Banco que se ha emitido la caducidad del contrato de Adquisición de Equipo para la Televisión Legislativa Etapa II y que se han iniciado las gestiones con la compañía de seguros para recuperar el anticipo. Además, se cuenta con un Acuerdo de Junta Directiva de la AL mediante el cual se establece que es procedente la caducidad y terminación del contrato No. 19/2014, Adquisición de Equipo para la TV Legislativa Etapa II, por lo que se ha procedido a eliminar el monto de dicho contrato en el producto "Canal de Televisión Legislativa de Señal Abierta, adquirido".	4/22/2016	4/12/2016
Output	Sistema de Telefonía IP	Modify Financial P(a) value	El monto programado para 2016 es "0" (cero). Al ingresar "0" en lugar de "-", se actualizó el monto total P (a), ajustándose a lo realmente ejecutado en dicho producto.	4/22/2016	4/21/2016
Output	Funcionarios administrativos y técnicos capacitados en sus funciones	Modify Financial P(a) value	El monto programado para 2016 es "0" (cero). Al ingresar "0" en lugar de "-", se actualizó el monto total P (a), ajustándose a lo realmente ejecutado en dicho producto.	4/22/2016	4/21/2016
Output	Estudios para diseño del nuevo Edificio de Asamblea Legislativa y mejora del edificio actual	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/22/2016	2/5/2016
Output	Nuevos procesos implementados en las oficinas de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/22/2016	2/5/2016
Output	Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario fortalecida	Modify Financial P(a) value	El monto programado para 2016 es "0" (cero). Al ingresar "0" en lugar de "-", se actualizó el monto total P (a), ajustándose a lo realmente ejecutado en dicho producto.	4/22/2016	4/21/2016
Output	Manual metodológico para la preparación y presentación de los informes sectoriales por parte de los ministerios elaborado	Modify Financial P(a) value	El monto programado para 2016 es "0" (cero). Al ingresar "0" en lugar de "-", se actualizó el monto total P (a), ajustándose a lo realmente ejecutado en dicho producto.	4/22/2016	4/21/2016
Output	Diputados capacitados	Modify Financial P(a) value	El monto programado para 2016 es "0" (cero). Al ingresar "0" en lugar de "-", se actualizó el monto total P (a), ajustándose a lo realmente ejecutado en dicho producto.	4/22/2016	4/21/2016
Output	Sistema de Digitalización de Documentos de la Asamblea Legislativa	Modify Physical P value	Se corrigieron las cifras de planificación y avance históricas para sustituir las cifras decimales con las cifras correspondientes a las unidades físicas completamente planificadas / entregadas, según la metodología de PMR.	4/22/2016	4/14/2016
Output	Módulos del Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) implementados	Modify Physical P value	Se corrigieron las cifras de planificación y avance históricas para sustituir las cifras decimales con las cifras correspondientes a las unidades físicas completamente planificadas / entregadas, según la metodología de PMR.	4/22/2016	4/14/2016
Output	Portal Web de la Asamblea Legislativa con nuevas funcionalidades	Modify Physical P value	Se corrigieron las cifras de planificación y avance históricas para sustituir las cifras decimales con las cifras correspondientes a las unidades físicas completamente planificadas / entregadas, según la metodología de PMR.	4/22/2016	4/14/2016
Output	Campaña de comunicación diseñada e implementada	Modify Physical P value	Se corrigieron las cifras de planificación y avance históricas para sustituir las cifras decimales con las cifras correspondientes a las unidades físicas completamente planificadas / entregadas, según la metodología de PMR.	4/22/2016	4/14/2016

Output	Sistema Informático Técnico Legislativo (SITEL) implementado	Modify Physical P value	Se corrigieron las cifras de planificación y avance históricas para sustituir las cifras decimales con las cifras correspondientes a las unidades físicas completamente planificadas / entregadas, según la metodología de PMR.	4/22/2016	4/14/2016
Output	Proceso de Análisis del anteproyecto de ley de presupuesto fortalecido	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/21/2016	2/5/2016
Output	Oficinas departamentales equipadas	Modify Financial P(a) value	Monto corresponde a provisiones.	4/21/2016	2/5/2016
Output	Proyectos de ley revisados	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/21/2016	2/5/2016
Output	Sistema de video para la Asamblea Legislativa adquirido	Modify Output name	Nuevo producto generado de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/19/2016	4/13/2016
Output	Salas de las Comisiones y Oficina Central equipadas	Modify Financial P(a) value	Se agrega el equipamiento para la Oficina Central, de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/15/2016	4/13/2016
Output	Encuestas de percepción ciudadana realizadas	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/15/2016	2/29/2016
Output	Índice Legislativo de leyes vigentes formulado	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/15/2016	2/29/2016
Output	Sistema de video vigilancia para la Asamblea Legislativa adquirido	Create Output	Nuevo producto generado de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/15/2016	4/13/2016
Output	Centro Cívico Cultural Legislativo equipado	Create Output	Nuevo producto generado de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/15/2016	4/13/2016
Output	Salas de las Comisiones y Oficina Central equipadas	Modify Physical P(a) value	Se agrega el equipamiento para la Oficina Central, de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/15/2016	4/13/2016
Output	Salas de las Comisiones y Oficina Central equipadas	Modify Output name	Se agrega el equipamiento para la Oficina Central, de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/15/2016	4/13/2016
Output	Oficinas departamentales equipadas	Modify Physical P(a) value	Se agrega el equipamiento para dos oficinas departamentales adicionales, de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/15/2016	4/13/2016
Output	Encuestas de percepción ciudadana realizadas	Modify Physical P(a) value	Se agregan dos encuestas a realizarse en 2016, de acuerdo a plan de acción para el cierre del Programa, propuesto por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.	4/15/2016	4/13/2016
Output	Proyectos de ley revisados	Modify Physical P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/15/2016	2/29/2016
Output	Anteproyectos de Ley formulados	Modify Physical P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	4/15/2016	2/29/2016
Output	Radio Legislativa funcionando	Modify Financial P(a) value	Se recibió una carta de la Unidad Ejecutora por medio de la cual se comunica al Banco que se ha emitido la caducidad del contrato y que se han iniciado las gestiones con la compañía de seguros para recuperar el anticipo. Además, se cuenta con un Acuerdo de Junta Directiva de la AL mediante el cual se establece que es procedente la caducidad y terminación del contrato No. 20/2014, Adquisición de Equipo para la Radio Legislativa Etapa III, por lo que se ha procedido a eliminar el monto de dicho contrato en el producto. El monto programado en 2016, corresponde a costo por mantenimiento del equipo previamente adquirido.	4/12/2016	2/12/2016
Output	Módulos del Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) implementados	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	3/10/2016	2/5/2016
Output	Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de participación ciudadana en su formulación incrementado	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	3/10/2016	2/5/2016
Output	Portal Web de la Asamblea Legislativa con nuevas funcionalidades	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	3/10/2016	2/5/2016

Output	Campaña de comunicación diseñada e implementada	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	3/10/2016	2/5/2016
Output	Anteproyectos de Ley formulados	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	3/10/2016	2/5/2016
Output	Sistema Informático Técnico Legislativo (SITEL) implementado	Modify Financial P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	3/10/2016	2/5/2016
Output	Nuevos procesos implementados en las oficinas de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa	Modify Physical P(a) value	En diciembre 2015 se otorgó una prórroga al plazo de último desembolso; los productos que no se finalizaron en 2015, se replanifican para 2016 (meta física y financiera).	3/1/2016	2/5/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
