



Operation Number: **CO-L1098**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/16/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/19/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **10/29/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthen the Office of the Attorney General - Phase Two	Loan Number:	2249/OC-CO
Executing Agency (EA):	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		
Team Leader:	Arisi,Diego	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1098	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1098	\$10,000,000.00	\$7,236,025.42	72.36%	\$2,763,974.58


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

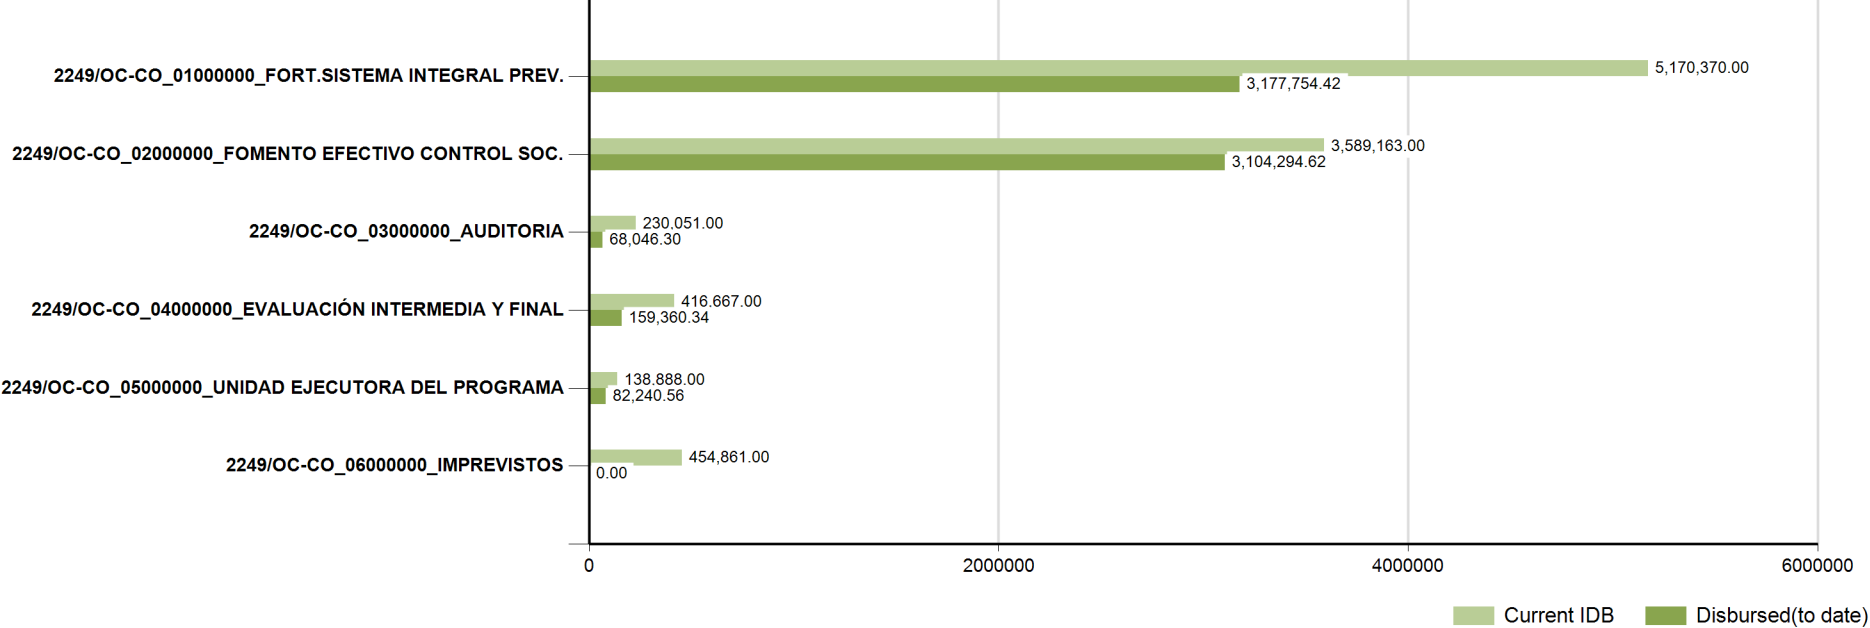

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejoramiento de la transparencia en la gestión pública							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Índice de Transparencia Internacional		Indice	3.50	2010	Índice de Transparencia Internacional		P	4.00
							P(a)	4.00
							A	
1.2 Indice de Corrupción		Percentil	25.00	2009	World Governance Indicators. The World Bank Group	línea de base 25th - 50th, se pretende llegar a 10th - 25th	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Mayor cumplimiento integral de las normas relativas a la gestión pública en seis entidades territoriales y dos nacionales escogidas como pilotos.									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
1.1 El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Santander se aumenta en 10 puntos porcentuales								P	72.00	77.00
								P(a)	72.00	77.00
								A		
1.2 El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Puerto Wilches se aumenta en 10 puntos porcentuales								P	50.00	55.00
								P(a)	50.00	55.00
								A		
1.3 El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Bolívar se aumenta en 10 puntos porcentuales								P	59.00	64.00
								P(a)	59.00	64.00
								A		
1.4 El índice de cumplimiento normativo del Distrito de Cartagena e aumenta en 10 puntos porcentuales								P	58.00	63.00
								P(a)	58.00	63.00
								A		

1.5 El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Casanare se aumenta en 10 puntos porcentuales		Porcentaje	42.00	2008	Informe Desempeño Fiscal - DNP		P	47.00	52.00
							P(a)	47.00	52.00
							A		
1.6 El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Yopal se aumenta en 10 puntos porcentuales		porcentaje	27.00	2008	Informe Desempeño Fiscal - DNP		P	32.00	37.00
							P(a)	32.00	37.00
							A		
1.7 El índice de cumplimiento normativo del Ministerio de Protección Social se aumenta en 10 puntos porcentuales		porcentaje	67.40	2007	Índice de Transparencia Nacional		P	72.40	77.40
							P(a)	72.40	77.40
							A		
1.8 El índice de cumplimiento normativo del Instituto Nacional de Vías - Invías se aumenta en 10 puntos porcentuales		porcentaje	70.60	2007	Índice de Transparencia Nacional		P	75.60	80.60
							P(a)	75.60	80.60
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado	Plan	P		1.00	P	0.00	833,334.00
		P(a)		1.00	P(a)	327,446.00	868,910.00
		A		1.00	A	75,716.00	581,604.00
Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado	Sistema de Información	P		1.00	P	114,319.00	1,993,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	889,639.00	2,638,459.00
		A		0.00	A	503,009.00	1,606,970.00
Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado	Protocolo	P	1.00	1.00	P		444,444.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	115,397.00	444,444.00
		A		1.00	A	0.00	329,047.00
Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría Aplicada	Guía	P	1.00	1.00	P		166,665.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	166,665.00	166,665.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	Proyecto de Capacitación	P	1.00	1.00	P	0.00	974,999.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	103,896.00	1,461,197.00
		A		0.00	A	11,038.00	882,141.00
Fomento de un efectivo control social de la corrupción		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada	Metodología	P	1.00	1.00	P	265,100.00	1,619,444.00
		P(a)		1.00	P(a)	128,373.00	1,625,593.00
		A		1.00	A	35,618.00	1,526,689.00
Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos	Mecanismos de Participación	P	3.00	3.00	P	302,675.00	1,188,159.00
		P(a)		3.00	P(a)	833,607.00	1,188,159.00
		A		3.00	A	77,527.00	432,079.00
Estrategia de Cambio Cultural Aplicada	Estrategia	P		1.00	P	0.00	1,538,888.00
		P(a)		1.00	P(a)	374,751.00	1,870,487.00
		A		1.00	A		1,164,137.00
Auditoria, Evaluacion, Unidad Coordinadora e Imprevistos							
Other Cost					2015		Cost
Auditoria, Evaluación, Unidad Coordinadora e Imprevistos				P	\$0.00		\$1,240,467.00
				P(a)	\$903,898.00		\$2,140,101.00
				A	\$4,568.00		\$341,137.00
Total Cost					2015		Total Cost
				P	\$682,094.00		\$9,999,400.00
				P(a)	\$3,843,672.00		\$9,267,819.00
				A	\$707,476.00		\$6,863,804.00

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Estrategia de Cambio Cultural Aplicada		Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto y su distribución teniendo en cuenta la Extensión en la Fecha de Último Desembolso otorgada al Programa por un plazo de 18 meses.	9/28/2015	9/16/2015
Output	Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada		Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto y su distribución teniendo en cuenta la Extensión en la Fecha de Último Desembolso otorgada al Programa por un plazo de 18 meses.	9/28/2015	9/16/2015

Output	Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto y su distribución teniendo en cuenta la Extensión en la Fecha de Último Desembolso otorgada al Programa por un plazo de 18 meses.	9/28/2015	9/16/2015
Output	Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto y su distribución teniendo en cuenta la Extensión en la Fecha de Último Desembolso otorgada al Programa por un plazo de 18 meses.	9/28/2015	9/16/2015
Output	Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto y su distribución teniendo en cuenta la Extensión en la Fecha de Último Desembolso otorgada al Programa por un plazo de 18 meses.	9/28/2015	9/16/2015
Output	Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	Modify Physical P(a) value	Se ajusta el monto y su distribución teniendo en cuenta la Extensión en la Fecha de Último Desembolso otorgada al Programa por un plazo de 18 meses.	9/28/2015	9/16/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
