




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Registro de Información Catastral				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY				
Número(s) de Préstamo:	2149/BL-GU	Monto Aprobado Actual:	22.000.000,00	BID Original:	22.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	22.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	GU-P1043	Saldo:	22.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	22.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 14, 2011 Validado por Representante de País: Sep 28, 2011

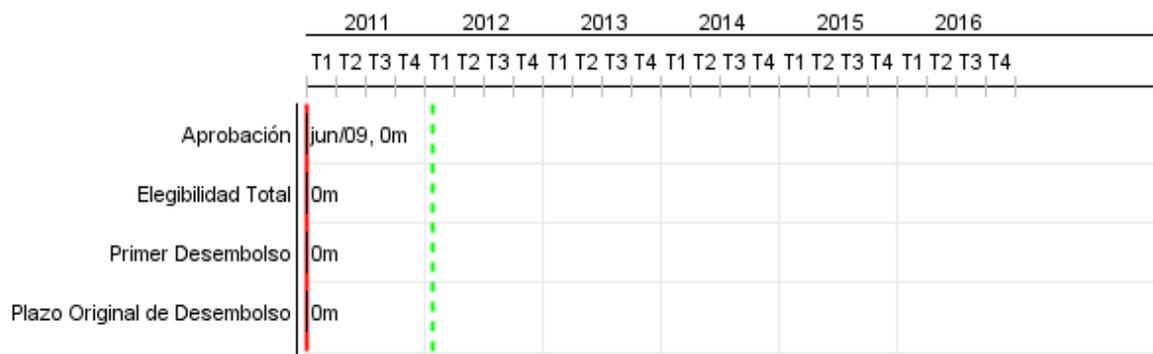

Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Áreas protegidas de gestión nacional tienen cuentan con establecimiento catastral

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Áreas protegidas del SIGAP cuentan con catastro	Área Protegida		2008	P A	92,00

Resultado: Conflictividad social resultado de la implementación del proceso catastral se reduce
Supuestos: No existen otros eventos que resulten en conflictividad social

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Número de conflictos registrados	Conflictos		2008	P A	0,00

Resultado: Se consolida la certeza jurídica de las áreas protegidas del SIGAP
Supuestos: No se añaden más áreas protegidas a las reportadas durante el diseño (92 áreas protegidas)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Áreas protegidas registradas en el RGP	Porcentaje		2008	P A	92,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Catastro en áreas protegidas									
Diagnósticos territoriales de áreas protegidas con información estratégica disponible para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto realizados	Diagnóstico	10,00			92,00	187.000,00			803.030,00
Áreas protegidas cuentan con información registral para el análisis catastral de las fincas dentro de sus límites	Áreas protegida				92,00	226.000,00			990.230,00
Áreas protegidas con estrategia de comunicación implementada	Área protegida				92,00	200.000,00			1.179.244,00
Áreas protegidas con demarcación física y registro de sus límites, incluyendo límites de zonificación interna establecidos por ley	Proyectos				92,00	100.000,00			13.820.231,00
Instancia de coordinación interinstitucional organizada y operando con capacidad para el manejo de conflictos asociados al catastro y registro de tierras dentro de las áreas protegidas	Instancia	1,00			1,00	12.000,00			112.000,00
Base de datos de monitoreo de conflictos	Base de datos	1,00			1,00	32.000,00			696.000,00
Consolidación de la certeza jurídica de las áreas protegidas									
Áreas protegidas cuentan con proceso de procuración legal para el registro, adscripción y anotaciones al final del proyecto	Área Protegida				92,00				696.000,00
Apoyo técnico, coordinación interinstitucional y uso de la información catastral y registral									
Sistema de seguimiento e información de catastro y registro, tenencia y uso de la tierra en áreas protegidas interconectando RIC / RGP / CONAP en operación	Sistema				1,00				409.182,00
Convenios interinstitucionales suscritos en el marco del proyecto	Convenio				8,00				1.737.111,00
Unidades de apoyo implementadas y con apoyo técnico en instituciones socias del proyecto a partir del segundo año	Unidades				7,00	97.000,00			457.038,00
Administración y seguimiento									
TOTAL						854.000,00			20.900.066,00
