
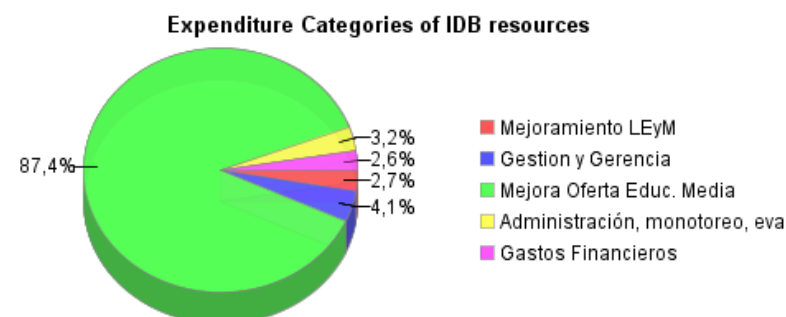




## Summary Report

| Basic Data             |                                                                           | Available Funds (US\$)    |               | Total Cost and Source         |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | Secretaría de Estado de Educación                                         |                           |               |                               |               |
| Sector:                | EDUCATION-SECONDARY EDUCATION                                             |                           |               |                               |               |
| Loan Number(s):        | 2293/OC-DR                                                                | Current Approved Amount:  | 50.000.000,00 | Original IDB:                 | 50.000.000,00 |
| Stage:                 | Approved                                                                  | Disbursed Amount to Date: | 16.500.000,00 | Current IDB:                  | 50.000.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment                                                          | % Disbursed:              | 33,00         | Pari-passu:                   | 100,00        |
| Related Operation(s):  | DR-X1004, DR-P1077                                                        | Balance:                  | 33.500.000,00 | Co-Financing/Country:         | 10.000.000,00 |
| Operation Subtype:     | CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects) |                           |               | Original Estimate:            | 60.000.000,00 |
|                        |                                                                           |                           |               | Amortization Period (months): | 235           |

| Project Environmental and Social Impact Category    | Reformulation                                          | Validation                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project Environmental and Social Impact Category: B | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: Apr 15, 2011<br>Validated by Country Representative: Apr 26, 2011 |

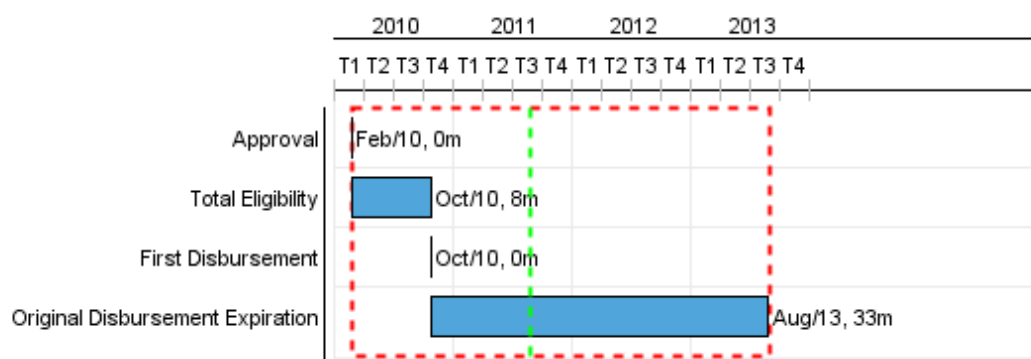

## Accumulated Progress as of 2010

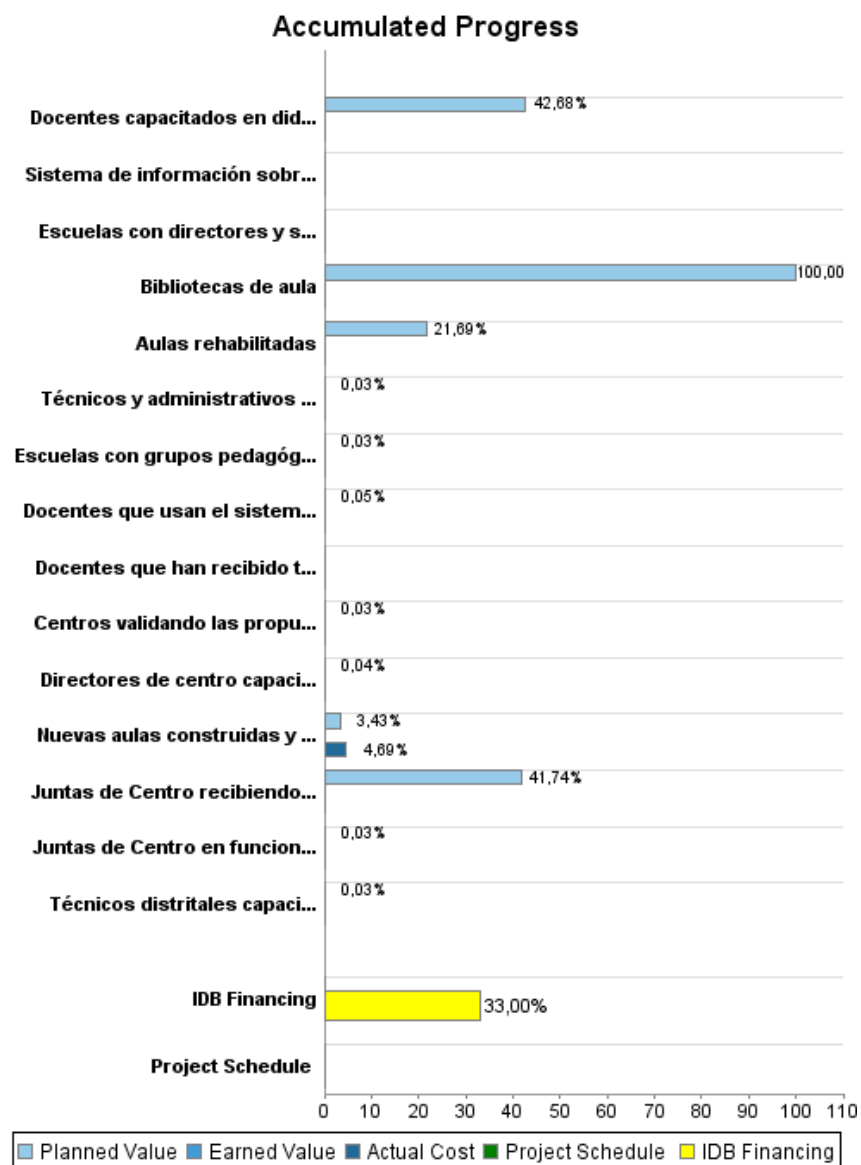

## Outcomes

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outcome:</b>      | Aprendizaje de lecto escritura y matemática del primer ciclo de educación básica incrementado                      |
| <b>Suppositions:</b> | Se asume que se realizarán Pruebas Estandarizadas de 4 grado entre agosto y septiembre de 2010                     |
| <b>Comments:</b>     | No se conoce aún la línea de base pues ésta se levantará en septiembre 2010 y se conocerá un par de meses después. |

| Indicator                                                           | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| Prueba estandarizada en lecto escritura y matemáticas en el 4 grado | Puntaje         |          | 2010          | P<br>A | 0,00           |

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outcome:</b>  | Promoción efectiva de los grados 1,2 y 3 de educación básica incrementada                                                                     |
| <b>Comments:</b> | La base está calculada utilizando datos de 2007-2008, que será recalculada cuando los datos matriculares del año 2009-2010 estén disponibles. |

| Indicator                                 | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| Tasa de promoción efectiva del 1er. grado | Porcentaje      | 70,00    | 2010          | P<br>A | 73,50          |
| Tasa de promoción efectiva del 2do. grado | Porcentaje      | 68,00    | 2010          | P<br>A | 71,40          |
| Tasa de promoción efectiva 3er. grado     | Porcentaje      | 67,00    | 2010          | P<br>A | 70,30          |

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outcome:</b>  | Jornada escolar en los centros del nivel básico beneficiados por el programa incrementada          |
| <b>Comments:</b> | La base es el promedio nacional para el 2008. Se estima que no hay diferencia para el año 1 (2010) |

| Indicator                                                                                      | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| Cantidad de horas de instrucción en los centros del nivel básico beneficiados por el programa. | Horas           | 2,50     | 2008          | P<br>A | 3,15           |

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Outcome:</b> | Número de Centros funcionando en tandas nocturnas se ha reducido |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|

| Indicator                                           | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| Número de centros que funcionan en tandas nocturnas | Centros         | 41,00    | 2008          | P<br>A | 34,00          |

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Outcome:</b> | Cantidad de alumnos por sección ha disminuido |
|-----------------|-----------------------------------------------|

| Indicator           | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|---------------------|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| Alumnos por sección | alumnos         | 45,00    | 2008          | P<br>A | 40,00          |

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outcome:</b> | La promoción de los centros de educación media descongestionados ha mejorado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|

# PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1032 - Support for the 10-year Education Plan  
2010 2° period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 15/04/2011

| Indicator                                                                                                 | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | End of project |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---|----------------|
| Tasa de promoción efectiva de los centros que envían al menos 25 alumnos a los nuevos centros construidos | %               |          | 2010          | P | 0,00           |
|                                                                                                           |                 |          |               | A |                |

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outcome:</b> | Descongestionamiento de los planteles de educación básica con población mayor a 500 alumnos |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicator                                                                                              | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | End of project |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---|----------------|
| Estudiantes beneficiados con la construcción de nuevos planteles de media y nuevas bibliotecas de aula | Estudiantes     |          |               | P | 27.240,00      |
|                                                                                                        |                 |          |               | A |                |

**Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010**

| Description                                                                                                                    | Unit of Measure            | Physical |        |                   |           | Financial    |              |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                |                            | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned      | Actual       | Accumulated costs | EOP costs     |
| <b>Componente 1. Mejoramiento de la lectoescritura y matemáticas en el primer ciclo de educación básica</b>                    |                            |          |        |                   |           |              |              |                   |               |
| Docentes capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemática y educación inicial                               | Docentes                   | 2.025,00 |        |                   | 10.000,00 | 1.623.000,13 |              |                   | 3.802.890,00  |
| Técnicos distritales capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemática y educación inicial y acompañamiento. | Técnicos                   | 435,00   |        |                   | 435,00    | 28,60        |              |                   | 101.495,00    |
| Directores de centro capacitados en didáctica para la alfabetización inicial, matemáticas y educación inicial y acompañamiento | Directores                 | 667,00   |        |                   | 667,00    | 39,49        |              |                   | 101.495,00    |
| Docentes que han recibido tres visitas de acompañamiento al año, durante dos años, por parte del técnico distrital             | docentes                   |          |        |                   | 6.015,00  | 63,37        |              |                   | 1.134.262,00  |
| Escuelas con grupos pedagógicos en funcionamiento                                                                              | Escuelas                   | 135,00   |        |                   | 667,00    | 190,99       |              |                   | 586.434,00    |
| Bibliotecas de aula                                                                                                            | Bibliotecas                | 1.000,00 |        |                   | 3.000,00  | 1.050.000,00 |              |                   | 1.050.000,00  |
| Docentes que usan el sistema de evaluación formativa de alumnos en funcionamiento                                              | Docentes                   | 2.025,00 |        |                   | 10.000,00 | 152,37       |              |                   | 293.858,00    |
| <b>Componente 2. Gestión escolar y gerencia educativa. Subcomponente 2.1 Gestión escolar</b>                                   |                            |          |        |                   |           |              |              |                   |               |
| Escuelas con directores y sub-directores capacitados en gestión escolar                                                        | Escuelas                   | 667,00   |        |                   | 667,00    | 105,88       |              |                   | 828.850,00    |
| Juntas de Centro en funcionamiento                                                                                             | Juntas                     | 667,00   |        |                   | 667,00    | 23,76        |              |                   | 71.310,00     |
| Juntas de Centro recibiendo transferencias anuales de recursos                                                                 | Juntas                     | 667,00   |        |                   | 667,00    | 846.000,20   |              |                   | 2.026.902,00  |
| <b>Componente 2. Gestión escolar y gerencia educativa. Subcomponente 2.2 Gerencia educativa</b>                                |                            |          |        |                   |           |              |              |                   |               |
| Técnicos y administrativos departamentales y distritales capacitados y con recursos para la gerencia educativa                 | Técnicos y administrativos | 1.000,00 |        |                   | 3.500,00  | 187,18       |              |                   | 573.779,00    |
| Sistema de información sobre la gestión de centros escolares con información escolar auditada                                  | Sistema de información     |          |        |                   | 1,00      |              |              |                   | 118.650,00    |
| <b>Componente 3. Mejora de la oferta de la educación media. Subcomponente 3.1. Infraestructura escolar en media</b>            |                            |          |        |                   |           |              |              |                   |               |
| Nuevas aulas construidas y con mobiliario                                                                                      | Nuevas aulas               | 238,00   |        |                   | 476,00    | 1.456.500,73 | 1.993.473,55 |                   | 42.464.513,00 |
| Aulas rehabilitadas                                                                                                            | Aulas                      | 100,00   |        |                   | 219,00    | 766.000,67   |              |                   | 3.530.852,00  |

# PROGRESS MONITORING REPORT

DR-L1032 - Support for the 10-year Education Plan  
2010 2° period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 15/04/2011

| Description                                                                                                                 | Unit of Measure | Physical |        |                   |           | Financial           |                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                             |                 | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned             | Actual              | Accumulated costs | EOP costs            |
| <b>Componente 3. Mejora de la oferta de la educación media. Subcomponente 3.2. Modalidades flexibles de educación media</b> |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Centros validando las propuestas para la transformación de la educación media                                               | Centros         |          |        |                   | 5,00      | 140,00              |                     |                   | 420.000,00           |
| <b>Componente 4. Administración y Gastos Financieros</b>                                                                    |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                |                 |          |        |                   |           | <b>5.742.433,37</b> | <b>1.993.473,55</b> |                   | <b>57.105.290,00</b> |
