



Operation Number: **ME-L1033**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/24/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/30/2014**
Division Chief validation date: **11/06/2014**
Country Representative validation date: **11/06/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Community Education Program-Phase II: Social Equity Builders	Loan Number:	2285/OC-ME
Executing Agency (EA):	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO		
Team Leader:	Martinez,Ernesto	Sector/Subsector:	COMPENSATORY EDUCATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1033	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$66,700,000.00	\$0.00	\$166,700,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1033	\$100,000,000.00	\$81,656,821.69	81.66%	\$18,343,178.31


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

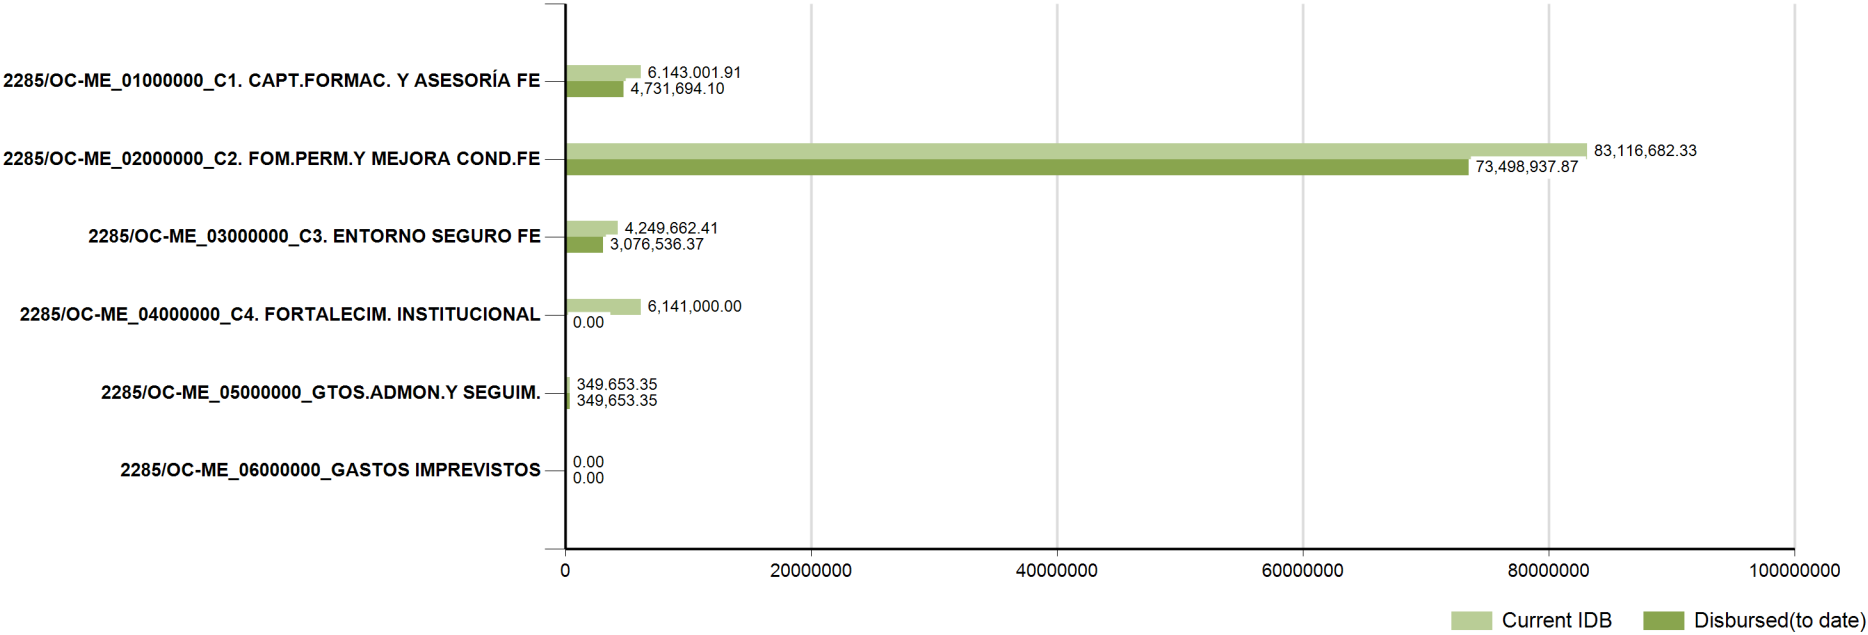

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 El aprendizaje de los alumnos de los cursos comunitarios en los 172 municipios de mas alto rezago mejora en un 5% con respecto a la linea de base, segun los resultados de ENLACE de matematicas y lenguaje.											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2010	2011	2012	2013	EOP
1.1 Resultados de la prueba ENLACE de español en los 172 municipios prioritarios.		Puntaje promedio	394.09	2009	Prueba ENLACE	Línea de Base Ciclo Escolar 2009-2010.	P	403.90	413.80	423.60	433.50	433.50
							P(a)	403.90	413.80	423.60	433.50	433.50
							A	418.70	420.00	433.10	435.82	
1.2 Resultados de la prueba ENLACE de matemáticas en los 172 bmunicipios prioritarios.		Puntaje promedio	392.80	2009	Prueba ENLACE	Línea de Base Ciclo Escolar 2009-2010.	P	400.16	407.53	414.90	422.26	422.26
							P(a)	400.16	407.53	414.90	422.26	422.26
							A	406.97	408.00	458.43	471.74	
1.3 Instructores comunitarios que abandonan el servicio social durante el ciclo escolar a nivel nacional.		Proporción	22.00	2009	Sistema de Información del CONAFE	Este indicador se ha integrado como resultado de la revisión del marco de resultados del Programa efectuado durante 2012.	P			20.40	19.70	19.70
							P(a)			20.00	19.70	19.70
							A			22.20		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Perfil y competencias de las figuras educativas mejorado.												
Observation:	Con énfasis en las áreas de lectura, escritura y matemáticas.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	EOP	
1.1 Instructores comunitarios con bachillerato o más en los 172 municipios focalizados.		Proporción	48.10	2009	Sistema de información del CONAFE	Cambio el año y la cifra de la línea de base. La meta al final del proyecto es un porcentaje, no miles.	P	49.60	52.80	56.10	59.40		59.40
						P(a)	49.60	52.80	56.10	59.40		59.40	
						A	60.00	64.80	67.20				

1.2 Instructores comunitarios de habla indígena en los 172 municipios focalizados.					Sistema de información del CONAFE	Se reportan cambios en la cifra de la línea de base, cambios en las metas anuales y en el avance logrado para los dos primeros años de ejecución. La meta al final del proyecto es un porcentaje, no miles.	P	47.80	48.30	48.80	49.30		49.30
							P(a)	47.80	48.30	48.80	49.30		49.30
							A	50.80	50.50	49.10	45.60		
1.3 Estudiantes (niñas, varones) que se benefician de proyectos educativos en los 31 Estados	 RF	Estudiantes	300,000.00	2009	Sistemas de Información de CONAFE		P	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00
							P(a)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,200,000.00
	A	328,652.00	336,069.00	335,669.00	329,091.00								
Outcome:	2 Permanencia de las figuras educativas incrementada.												
Observation:													

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011		2012		2013		2014		EOP	
2.1 Instructores comunitarios que permanecen un segundo año en los municipios prioritarios			Proporción	27.10	2009	Sistema de información del CONAFE	Se reportan cambios en el año que se toma de la línea de base, cambios en las metas anuales para los años 2012 y 2013, por lo cual cambia la meta para el final del proyecto. La meta al final del proyecto es un porcentaje, no miles. El avance para el 2012	P	29.00	29.60	30.30	30.90						30.90	
								P(a)	29.00	29.60	30.30	30.90				30.90			
								A	28.70	30.90	29.30	26.90							
2.2 Instructores comunitarios que abandonan el servicio social durante el año lectivo en las localidades de los municipios prioritarios			Proporción	21.60	2010	Sistema de información CONAFE	El avance de este indicador se reportar a hasta el periodo siguiente con información del periodo académico 2012-2013.	P	21.60	21.00	19.50	19.00						19.00	
								P(a)	21.60	21.00	19.50	19.00				19.00			
								A	21.50	17.80	19.50								
Outcome:	3 Disminucion de la exposición de las figuras educativas a situaciones de riesgo y mejora en su capacidad de respuesta.																		
Observation:																			

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	EOP
3.1 Fallecimientos de Figuras Educativas.		Fallecimientos	46.00	2009	Registros.	Este indicador es PROXI, debido a la complejidad de variables que intervienen en los posibles fallecimientos. Se reportan cambios en el año que se toma de línea de base, por lo cual cambia la cifra tomada como línea de base. También se reportan cambios en	P	45.00	43.00	40.00	38.00		39.00
	P(a)						45.00	43.00	12.00	12.00		12.00	
	A						44.00	71.00	12.00	50.00			
3.2 Instructores que desertan por causas atribuibles a las condiciones de servicio.		Porcentaje	14.70	2010	Reporte de causas de baja concentrado por la Dirección de Apoyo a la Operación del Conafe.	Indicador ingresado en el periodo 2012 (1)	P	14.70	14.50	14.00	13.50		13.00
	P(a)						14.70	14.50	14.00	13.50		13.50	
	A						14.70	15.20	11.00	7.60			
Outcome:	4 Sistemas de información, planeación, gestión y seguimiento de figuras educativas fortalecido.												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	EOP	
4.1 Número de Delegaciones con Sistema en operación.		Delegaciones	0.00	2009	- Registro de No. de Delegaciones Capacitadas - No. de Sistemas en operación de modo local - Consolidación de información a Nivel Central	Se ingresó este nuevo indicador como parte de la reformulación del Componente 4. por CONAFE. El avance al 2012 se reportará en el próximo ejercicio del PMR ya que CONAFE comenzará a ejecutar las acciones para la implementación del Sistema en los próximos	P	0.00		31.00	31.00		31.00
						P(a)	0.00		31.00	31.00		31.00	
						A			0.00	20.00			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Captacion, formacion y asesoria de las figuras educativas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Número de figuras educativas que reciben materiales y apoyos para la formación e intervención pedagógica en los 31 Estados.	Docentes	P	40,000.00	40,000.00	P	4,726,569.53	17,734,037.23
		P(a)	40,000.00	122,466.00	P(a)	3,400,000.00	15,500,263.00
		A	40,217.00	167,118.00	A	322,854.09	12,423,117.09
Componente 2: Fomento a la permanencia y mejora de las condiciones de servicio de las figuras educativas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Apoyos económicos para el fomento a la permanencia y mejora de condiciones de servicio en los 12 Estados prioritarios del proyecto.	Beneficiarios	P	14,050.00	14,050.00	P	34,204,299.63	141,636,047.63
		P(a)	14,000.00	41,885.00	P(a)	35,000,000.00	180,337,137.39
		A	13,880.00	53,850.00	A	14,147,528.05	159,484,665.44
Componente 3: Entorno seguro		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Delegaciones con planes de entorno seguro para las figuras educativas en implementación	Delegaciones	P	31.00	31.00	P	2,993,205.69	8,265,647.06
		P(a)	31.00	93.00	P(a)	2,200,000.00	8,619,516.33
		A	31.00	93.00	A	90,055.36	6,509,571.69
Componente 4: Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Número de delegaciones con servicios administrados de red voz y datos (RPV-MPLS)	Delegaciones	P	12.00	12.00	P	0.00	0.00
		P(a)	12.00	12.00	P(a)	0.00	0.00
		A	12.00	0.00	A		0.00
Número de delegaciones que opera el Sistema de Gestión Educativa (SIGE)	Delegaciones	P	31.00	31.00	P	0.00	0.00
		P(a)	31.00	82.00	P(a)	0.00	0.00
		A	31.00	51.00	A		0.00
Componente 5: Gastos de Administración y Seguimiento							

Other Cost		2014	Cost
Administración y Seguimiento	P	\$0.00	\$0.00
	P(a)	\$0.00	\$398,176.47
	A		\$398,176.47
Imprevistos	P	\$1,283,397.33	\$1,865,160.29
	P(a)	\$0.00	\$0.00
	A		\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$43,207,472.18	\$169,500,892.21
	P(a)	\$40,600,000.00	\$178,815,530.69
	A	\$14,560,437.50	\$178,815,530.69

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
