



Operation Number: **AR-L1032**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/6/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/17/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)	Loan Number:	1950/OC-AR
Executing Agency (EA):	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL		
Team Leader:	Alva Hart,Viviana del Carmen	Sector/Subsector:	AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1032	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$43,000,000.00		\$143,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1032	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	CONCLUSIONES: Se constato un avance substancial de la gestión ambiental por parte del ejecutor como consecuencia de los acuerdos entre el BID y BM, y se continua ajustando el Manual Ambiental y Social que es parte integrante del Reglamento Operativo de la operación; además se continua fortaleciendo la capacidad de la unidad de gestión ambiental y entidades participantes en el programa; Los problemas detectados son fácilmente superables mediante el establecimiento de procedimientos y mecanismos de aplicación de las políticas de salvaguarda y la capacitación de los profesionales involucrados; RECOMENDACIONES: Se recomienda avanzar en las actividades de fortalecimiento institucional y coordinación que permitan avanzar hacia la institucionalización del PROSAP en sus diversos ámbitos. En particular realizar desde el ámbito central las gestiones necesarias para asegurar la estabilidad institucional de los recursos humanos capacitados con recursos del programa. Realizar auditorías socio-ambientales anuales independientes a los proyectos en ejecución para asegurarse del cumplimiento de la aplicación de la normativa nacional y las salvaguardas. Esto en vista de la diversidad y magnitud de los proyectos (camino, riego y drenaje, titulación de tierras, sanidad agropecuaria, promoción de exportaciones, uso de biomasa para energía, generación y transferencia de tecnología, centros de salud, escuelas, electrificación rural, etc.) así como la participación de diferentes entidades públicas en el proceso de gestión ambiental;

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

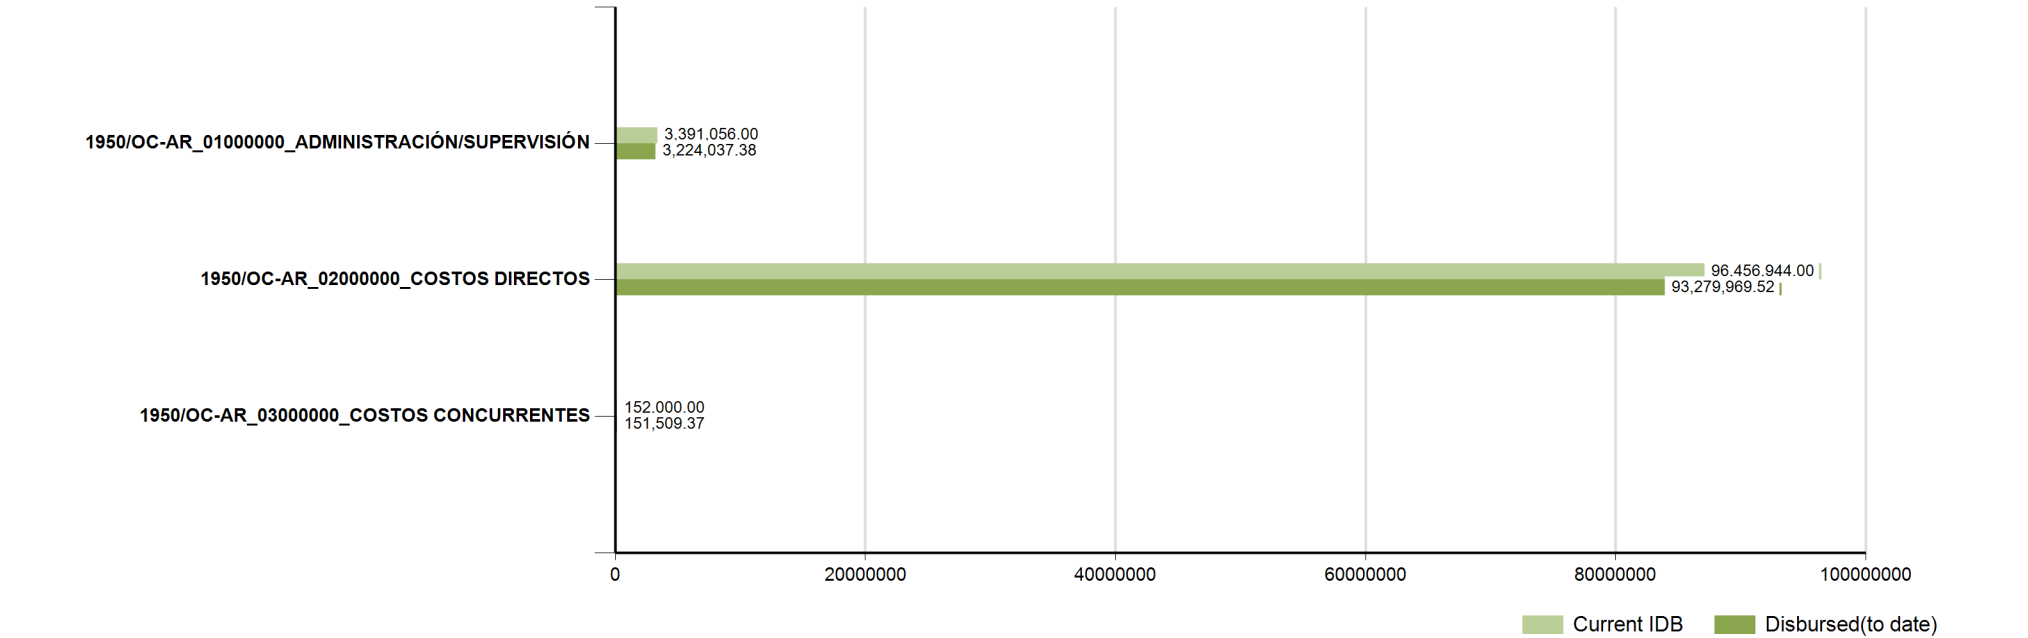

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mercados de exportación de productos de origen agropecuario se mantiene o aumentan						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP
1.1 Penetración comercial del mercado argentino se mantiene o aumenta		# de mercados de exportación	90.00	2007	Informes de comercio exterior		P 90.00
							P(a) 90.00
							A 54.00

- RF - Contribution
- RF - Alignment
- RF - Strategic Alignment
- RF - Strategic Alignment during Execution
- SI - Sector Indicator
- CI - Country Indicator
- PG - Pro-Gender
- PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Estado de sanidad animal de la República Argentina fortalecido.									
Observation:	Según estándares internacionales de la OIE									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2016	EOP
1.1 Enfermedades se mantienen erradicadas		Enfermedades	8.00	2007	Informes de la OIE	Reconocimiento internacional de la condición de País Libre de Enfermedades Erradicadas y Exóticas de Alto Riesgo	P			8.00
	P(a)								8.00	
	A								8.00	
1.2 Resolución de la Organización Internacional de Sanidad Animal en reconocimiento al Sistema de Sanidad Animal con enfoque de gestión de calidad		Resolución	1.00	2007	Informes de la OIE		P			1.00
	P(a)								1.00	
	A								1.00	
1.3 Prevalencia de Brucelosis (enfermedad endémica) disminuida		%	3.00	2007	Informes de la DNSA a la terminación del Programa		P			1.00
	P(a)								1.00	
	A								0.80	
1.4 Prevalencia de Tuberculosis Bovina (enfermedad endémica) disminuida		%	5.00	2007	Informes de la DNSA a la terminación del Programa		P			2.00
	P(a)								2.00	
	A								0.30	
1.5 Prevalencia de Aujesky (enfermedad endémica) disminuida		%	2.00	2007	Informes de la DNSA a la terminación del Programa		P			1.00
	P(a)								1.00	
	A								3.00	
1.6 Prevalencia de Triquinosis (enfermedad endémica) disminuida		%	4.00	2007	Informes de la DNSA a la terminación del Programa		P			2.00
	P(a)								2.00	
	A								1.20	
1.7 Tambos lecheros libres de brucelosis y tuberculosis bovina		%	85.00	2007	Informes de la DNSA a la terminación del Programa		P			90.00
	P(a)								90.00	
	A								84.00	

1.8 Productores pecuarios que acceden a mejores servicios de sanidad animal	 RF-C	Farmers (#)	0.00	2007	Informes de cierre del Componente de Sanidad Animal del Programa	Productores ganaderos.				
							P			
	P(a)						270,000.00		270,000.00	
	A								454,161.00	
Outcome:	2 Estado de sanidad y protección vegetal de la República Argentina fortalecido.									
Observation:	Según nuevos conceptos y estándares internacionales de la OMC y la FAO									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2016	EOP
2.1 Reclamos de Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria de otros países por interceptaciones de plagas reducidos		%	0.40	2007	Informes de OPNFs	Porcentaje de reclamos anuales	P			0.10
							P(a)			0.10
							A			0.06
2.2 Area con incidencia de la Mosca de la Fruta en la Región del NEA reducida		%	13.00	2008	Informe de la DNPV a la terminación del Programa	Porcentaje del área con presencia de la plaga	P			0.50
							P(a)			0.50
							A			2.40
2.3 Area productiva con infestación de Carpocapsa en frutales de pepita reducida		%	6.20	2008	Informes de la DNPV a la terminación del Programa	Porcentaje de área productiva con infestación de la plaga	P			0.10
							P(a)			0.10
							A			0.40
2.4 Area nogalera con infestación de Carpocapsa reducida		%	30.00	2008	Informes de la DNPV a la terminación del Programa	Porcentaje de área nogalera con infestación	P			0.50
							P(a)			0.50
							A			2.00
2.5 Area productiva de cítricos con afectación por enfermedades disminuida		%	20.00	2006	Informes de la DNPV a la terminación del Programa	Porcentaje de área citrícola afectada	P			10.00
							P(a)			10.00
							A			15.00
2.6 Riesgo de ingreso de Plagas y enfermedades exóticas reducido		%	20.00	2007	Informes de la DNPV a la terminación del Programa	Porcentaje de riesgo de ingreso de plagas	P			5.00
							P(a)			5.00
							A			0.00
2.7 Capacidad de detección y manejo de focos de enfermedades cuarentenarias incrementada		%	75.00	2007	Informes de la DNPV a la terminación del Programa	Porcentaje de capacidad de detección del riesgo	P			95.00
							P(a)			95.00
							A			98.00

2.8 Agricultores que acceden a mejores servicios de sanidad vegetal	 RF-C	Farmers (#)	0.00	2007	Informe de cierre del Componente de Sanidad Vegetal del Programa		P			
							P(a)	30,000.00		30,000.00
							A			297,190.00

Outcome:

3 Estado de inocuidad y fiscalización agroalimentaria de la República Argentina fortalecido.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2016	EOP
3.1 Eventos anuales de productos agroalimentarios de exportación en mercados de destino reducidos		Eventos	47.00	2007	Comunicaciones de OPNFs de países con mercado destino	Eventos: rechazos, detenciones o alertas	P		20.00
							P(a)		20.00
							A		35.00

Outcome:

4 Capacidad de Gestión Institucional del SENASA mejorada.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2016	EOP
4.1 Índice de desempeño institucional del SENASA mejorado.		Índice	3.16	2007	Evaluación independiente	Según la metodología del DVE	P		4.42
							P(a)		4.42
							A		3.51

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Modernización de la Gestión Institucional		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Digesto integrado con normas reglamentarias actualizadas, sistematizadas e integradas.	Digesto	P	0.00	P	1,341,792.00
		P(a)	1.00	P(a)	488,318.50
		A	1.00	A	493,528.69
Laboratorios de referencia regional construidos y/o remodelados, equipados, acreditados y certificados (ISO 9001, 14001 y acreditación 17025).	Laboratorios	P	5.00	P	3,128,529.00
		P(a)	3.00	P(a)	3,999,612.26
		A	3.00	A	5,280,568.27
Unidades del SENASA Central y Regionales conectadas en tiempo real a través del Sistema Informático de Gestión Institucional Integrado.	Unidades	P	300.00	P	10,051,282.00
		P(a)	788.00	P(a)	6,135,432.08
		A	985.00	A	5,196,305.48
Sedes regionales y locales construidas y/o remodeladas y equipadas	Sedes	P	21.00	P	4,743,340.00
		P(a)	20.00	P(a)	23,807,837.56
		A	14.00	A	22,792,941.01
Recursos humanos capacitados (técnica y operativa)	Funcionarios	P	4,825.00	P	2,551,163.00
		P(a)	12,687.00	P(a)	3,857,199.49
		A	10,048.00	A	3,737,880.16
Eventos de Integración Sanitaria Regional en los que se participo.	Eventos	P	4.00	P	1,358,000.00
		P(a)	2.00	P(a)	594,263.61
		A	4.00	A	202,697.17
Laboratorio de Alimentos de Martinez construido y equipado acreditado y certificado (ISO 9001, 1401 y acreditación 17025)	Laboratorio	P	0.00	P	0.00
		P(a)	1.00	P(a)	21,884,437.52
		A	1.00	A	24,839,607.63
Consolidación del Sistema de Sanidad Animal		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Sistema cuarentenario de sanidad animal actualizado y fortalecido	Sistema	P	1.00	P	6,026,550.00
		P(a)	1.00	P(a)	735,647.38
		A	1.00	A	367,647.38
Sistema de Vigilancia y Monitoreo Zoosanitario actualizado y fortalecido	Sistema	P	1.00	P	2,616,836.00
		P(a)	1.00	P(a)	1,999,833.93
		A	1.00	A	793,106.78
Sistema de Contingencias y Emergencias Zoosanitarios consolidado	Sistema	P	1.00	P	2,564,247.00
		P(a)	1.00	P(a)	1,552,003.63
		A	1.00	A	1,176,003.63
Sistema de Intervenciones Zoosanitarias seguro y confiable	Sistema	P	1.00	P	4,516,878.00
		P(a)	1.00	P(a)	11,707,652.52
		A	1.00	A	11,470,209.93
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal.		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Sistema Cuarentenario Fitosanitario actualizado y fortalecido	Sistema	P	1.00	P	8,992,877.00
		P(a)	1.00	P(a)	181,902.61
		A	1.00	A	159,902.61
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria actualizado y fortalecido	Sistema	P	1.00	P	5,458,775.00
		P(a)	1.00	P(a)	4,153,878.14
		A	1.00	A	3,284,615.01

Programas de control de Plagas Claves ampliado y fortalecido	Programas	P	6.00	P	44,937,808.00
		P(a)	6.00	P(a)	36,833,254.70
		A	7.00	A	35,020,766.13
Sistema de Fiscalización Fitosanitaria Incrementado y Fortalecido	Sistema	P	1.00	P	1,741,096.00
		P(a)	1.00	P(a)	1,213,781.53
		A	1.00	A	406,781.53
Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización de Inocuidad Agroalimentaria		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria fortalecido	Sistema	P	1.00	P	423,247.00
		P(a)	1.00	P(a)	991,381.16
		A	1.00	A	965,956.06
Sistema de Fiscalización de Higiene y Sanidad de Productos de la Pesca y Acuicultura fortalecido	Sistema	P	1.00	P	1,971,680.00
		P(a)	1.00	P(a)	590,040.96
		A	1.00	A	575,040.96
Sistema de Fiscalización de la Producción Orgánica modernizado y fortalecido	Sistema	P	1.00	P	1,009,572.00
		P(a)	1.00	P(a)	599,956.06
		A	1.00	A	530,179.60
Sistema de Fiscalización de Productos de origen vegetal fortalecido	Sistema	P	1.00	P	2,112,980.00
		P(a)	1.00	P(a)	388,968.28
		A	1.00	A	149,968.28
Unidad de Evaluación de Riesgos establecida y funcionando	Unidad	P	1.00	P	1,518,348.00
		P(a)	1.00	P(a)	56,019.00
		A	1.00	A	47,890.13
Productores registrados en el Registro Nacional Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA).	Productores	P	785,000.00	P	993,791.00
		P(a)	133,937.00	P(a)	1,573,344.82
		A	377,104.00	A	1,438,590.62
Administración y gastos concurrentes		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Unidad de Gestión del Programa, evaluación y seguimiento y auditoría	Global	P	0.00	P	2,942,440.00
		P(a)		P(a)	1,140,554.00
		A		A	1,140,554.00

Other Cost		
Gastos financieros	P	\$18,826,230.00
	P(a)	\$16,378,969.37
	A	\$6,701,109.49
Unidad de Gestión del Programa, evaluación y seguimiento y auditoría	P	\$723,914.00
	P(a)	\$5,134,506.57
	A	\$4,929,258.93
Total Cost		
	P	\$130,551,375.00
	P(a)	\$143,000,000.87
	A	\$131,701,109.48

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
