



Operation Number: **AR-L1064**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/2/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/19/2015**
Division Chief validation date: **10/30/2015**
Country Representative validation date: **11/10/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthen the Agricultural Innovation System	Loan Number:	2412/OC-AR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca		
Team Leader:	Alva Hart,Viviana del Carmen	Sector/Subsector:	AGRICULTURAL RESEARCH AND INNOVATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1064	\$170,000,000.00	\$170,000,000.00	\$43,000,000.00	\$0.00	\$213,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1064	\$170,000,000.00	\$74,004,593.82	43.53%	\$95,995,406.18


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

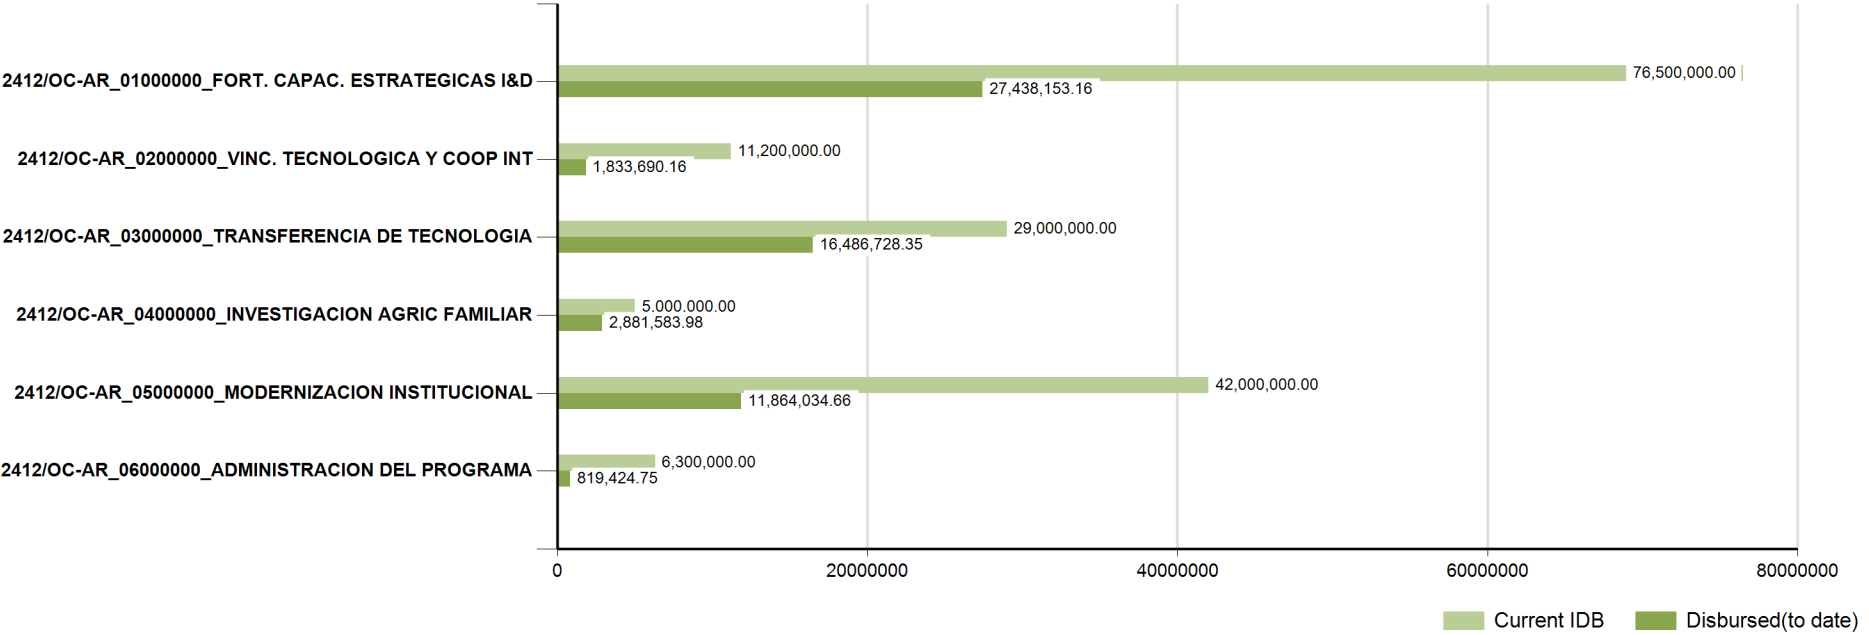

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Niveles de competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad socioeconómica del sistema agroalimentario de Argentina mejorados.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Crecimiento promedio anual de la productividad total de factores del sector agropecuario se mantiene o aumenta		%	3.80	2007	Estudio del IES y del INTA.		P	3.80
							P(a)	3.80
							A	
1.2 Superficie agrícola trabajada con métodos conservacionistas		%	35.00	2010	Estudios del INTA		P	40.00
							P(a)	40.00
							A	
1.3 Participación de la Pequeña Agricultura Familiar (PAF) en el Producto Bruto Interno Agropecuario (PIBA) incrementada		%	20.00	2010	Datos del MAGyP		P	21.00
							P(a)	21.00
							A	
1.4 Producción promedio de granos incrementada		Millones de toneladas	90.00	2010	Datos del MAGyP.		P	148.00
							P(a)	148.00
							A	
1.5 Producción promedio de carne vacuna incrementada		Millones de toneladas	3.00	2010	Datos del MAGyP.		P	3.50
							P(a)	3.50
							A	
1.6 Producción promedio de carne aviar incrementada		Millones de toneladas	1.20	2010	Datos del MAGyP.		P	2.10
							P(a)	2.10
							A	
1.7 Producción promedio de carne porcina incrementada		Millones de toneladas	260.00	2010	Datos del MAGyP.		P	730.00
							P(a)	730.00
							A	
1.8 Producción promedio de leche incrementada		Millones de litros	10.00	2010	Datos del MAGyP.		P	13.00
							P(a)	13.00
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Sistema de innovación agropecuario fortalecido.											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP
1.1 Agricultores de soja en el estrato de nivel tecnológico bajo		%	21.00	2008	Fuente IES	Porcentaje promedio	P					17.00
							P(a)				0.00	17.00
							A	0.00		0.00	0.00	0.00
1.2 Agricultores de maíz en el estrato de nivel tecnológico bajo		%	31.00	2008	Fuente IES	Porcentaje promedio	P					20.00
							P(a)				0.00	20.00
							A		0.00	0.00	0.00	0.00

1.3 Agricultores de trigo en el estrato de nivel tecnológico bajo		%	25.00	2008	Fuente IES	Porcent aje promedi o	P						20.00
							P(a)					0.00	20.00
							A				0.00	0.00	0.00
1.4 Agricultores de girasol en el estrato de nivel tecnológico bajo		%	21.00	2008	Fuente IES	Porcent aje promedi o	P						17.00
							P(a)					0.00	17.00
							A				0.00	0.00	0.00
1.5 Agricultores de algodón en el estrato de nivel tecnológico bajo		%	72.00	2008	Fuente IES	Porcent aje promedi o	P						58.00
							P(a)					0.00	58.00
							A				0.00	0.00	0.00
1.6 Productores agropecuarios que acceden a mejores tecnologías promovidas por el INTA	 RF	Agricultore s	0.00	2010	Informe de cierre del Programa y sus component es		P					100,000.00	100,000.00
							P(a)					100,000.00	100,000.00
							A				0.00	0.00	0.00

Outco me:	2 Capacidad estratégica de Investigación y Desarrollo fortalecida.
Observ ation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
2.1 Publicaciones en revistas indexadas incrementadas.		Publicaciones	334.00	2010	Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del INTA, y datos del MINCyT y del CONICET.	Diferencia entre investigadores INTA y controles.	P				30.00	10.00	40.00
	P(a)									434.00	468.00	468.00	
	A									371.00	0.00	0.00	
2.2 Citas en revistas indexadas incrementadas.		Publicaciones	251.00	2010	Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del INTA, y datos del MINCyT y del CONICET.	Diferencia entre investigadores INTA y controles.	P				30.00	10.00	40.00
	P(a)									326.00	351.00	351.00	
	A									378.00	0.00	0.00	

Outco me:	3 Vinculación tecnológica y cooperación internacional mejorada
Observ ation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
3.1 Publicaciones en revistas indexadas en coautoría con investigadores internacionales incrementadas.			Publicaciones	119.00	2010	Datos del sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE), del MINCYT y del CONICET.	Doble diferencia entre investigadores INTA y controles.	P				30.00	10.00	40.00
								P(a)				155.00	167.00	167.00
								A				289.00	0.00	0.00
		3.2 Patentes obtenidas en el marco de convenios de vinculación tecnológica			Patentes	0.00	2010	Documentación de registro de patentes. Informes de la Unidad de Seguimiento de la UEP.		P				2.00
P(a)												3.00	3.00	6.00
A												0.00	0.00	0.00
Outcome:	4 Transferencia de Tecnología y Extensión incrementada.													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
4.1 Producción por hectárea incrementada.			%	0.00	2010	Encuestas. Diferencia entre beneficiarios y grupos de control.		P					20.00	20.00
								P(a)					20.00	20.00
		A				0.00	0.00	0.00						
4.2 Productores agropecuarios que adoptan tecnologías promovidas por el INTA			%	0.00	2010	Informe de cierre del Componente de Transferencia de Tecnología y Extensión.	A través de encuestas se establecerá la diferencia de los porcentajes de adopción entre beneficiarios y grupos de control.	P					50.00	50.00
								P(a)					50.00	50.00
		A				0.00	0.00							
4.3 Productores integrados en asociaciones formales.			%	0.00	2010	Encuestas. Diferencia entre beneficiarios y grupos de control.		P					50.00	50.00
								P(a)					50.00	50.00
		A				0.00	0.00	0.00						
Outcome:	5 Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (PAF) incrementada.													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011		2012	2013	2014	2015	EOP
5.1 Valor de la producción por hectárea de los PAF incrementado.		%	0.00	2010	Encuesta específica. Diferencia entre beneficiarios y controles.		P					20.00	20.00
	P(a)										20.00	20.00	
	A									0.00	0.00	0.00	
5.2 Productores de Agricultura Familiar (PAF) utilizando tecnologías desarrolladas por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF).		%	0.00	2010	Encuesta específica. Diferencia entre beneficiarios y controles.		P					50.00	50.00
	P(a)										50.00	50.00	
	A									0.00	0.00	0.00	
5.3 Prototipos terminados de maquinarias o equipos de agroindustria apropiados para la PAF desarrollados.		Prototipos	0.00	2010			P			5.00	5.00	10.00	20.00
	P(a)									10.00	10.00	20.00	
	A									0.00	0.00	0.00	
5.4 Alternativas de comercialización y financiamiento generadas específicamente para la PAF.		Alternativas	0.00	2010	10 productos de la PAF estudiados en sus circuitos de comercialización y 10 estrategias específicas desarrolladas en forma participativa.		P		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
	P(a)							5.00	1.00	9.00	10.00	20.00	
	A									0.00	0.00	0.00	

5.5 Variedades autóctonas utilizadas por la PAF conservadas en las regiones NEA y NOA en bancos germoplasma in situ y ex situ.		Variedades	0.00	2010	Registro de materiales genéticos conservados en los bancos ex situ e in situ por parte de los IPAFs NEA y NOA, junto con organizaciones involucradas.		P		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
							P(a)		25.00		50.00	50.00	100.00
							A				0.00	0.00	0.00
5.6 Desarrollos tecnológicos para el uso de energía alternativas obtenidos.		Desarrollos	0.00	2010	Prototipos de equipos agroindustriales a base de energías alternativas.		P		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00
							P(a)		3.00	0.00	7.00	8.00	15.00
							A				0.00	0.00	0.00

Outcome:	6 Capacidad de Gestión Institucional del INTA modernizada y fortalecida.
Observation:	
Outcome:	7 Producción científico-tecnológica del INTA mejorada.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP
7.1 Trabajos científico-técnicos incrementados.		Trabajos	2,542.00	2010	Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE)		P			2,796.00		2,923.00
							P(a)			2,796.00	2,796.00	2,923.00
							A			0.00	0.00	0.00
7.2 Desarrollo de tecnología, productos y procesos incrementados.		Desarrollo	59.00	2010	Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE)		P			65.00		67.00
							P(a)			65.00	65.00	67.00
							A			0.00	0.00	0.00

Outcome:	8 Sistema de Metrología gestionado centralmente y ejecutado regionalmente para mantener equipos críticos bajo control, desarrollado.
Observation:	El indicador 8.1 tiene un avance de 369 equipos en 2013 y 253 en 2014, que al no haberse cargado en 2013 se suman y se reportan en 2014. El indicador 8.2 tiene un avance de 186 laboratorios en 2013 y 20 en 2014 que se están cargando todos al 2014. De la misma forma los 11 laboratorios del indicador 8.3 fueron logrados en 2013 de acuerdo con el informe semestral al 30 de junio de 2014.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP
8.1 Equipos calibrados, verificados, mantenidos y/o validados.		Equipos	0.00	2010	Certificados.		P		250.00			500.00
							P(a)		250.00		0.00	500.00
							A			622.00	0.00	0.00

8.2 Laboratorios asistidos en calibración confirme a las Normas ISO.		Laboratorio s	0.00	2010	Estado de avance de los sistemas de calidad de la Gerencia de Procesos y Calidad		P			70.00			150.00																																															
							P(a)			70.00		0.00	150.00																																															
							A				206.00	0.00	0.00																																															
8.3 Laboratorios/se rvicios adicionales con certificación/acr editación		Laboratorio s	7.00	2010	Certificado s.		P			10.00			12.00																																															
							P(a)			10.00		0.00	12.00																																															
							A				11.00	0.00	0.00																																															
Outcome:	9 Producción científico-tecnológica de la Red de laboratorios de biotecnología mejorada.																																																											
Observation:																																																												
<table><tr><th>Indicators</th><th>Flags*</th><th>Unit of Measure</th><th>Baseline</th><th>Baseline Year</th><th>Means of verification</th><th>Observations</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>EOP</th></tr><tr><td rowspan="4">9.1 Eventos biotecnológicos disponibles.</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">Eventos</td><td rowspan="4">7.00</td><td rowspan="4">2010</td><td rowspan="4">Doc. de registro de patentes. Informes de la Unidad de Seguimiento de la UGP.</td><td rowspan="4"></td><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td>15.00</td><td>5.00</td><td>20.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td></td><td></td><td></td><td>15.00</td><td>5.00</td><td>20.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>														Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	9.1 Eventos biotecnológicos disponibles.		Eventos	7.00	2010	Doc. de registro de patentes. Informes de la Unidad de Seguimiento de la UGP.		P				15.00	5.00	20.00	P(a)				15.00	5.00	20.00	A				0.00	0.00	0.00						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP																																																
9.1 Eventos biotecnológicos disponibles.		Eventos	7.00	2010	Doc. de registro de patentes. Informes de la Unidad de Seguimiento de la UGP.		P				15.00	5.00	20.00																																															
							P(a)				15.00	5.00	20.00																																															
	A									0.00	0.00	0.00																																																
Outcome:	10 Papel del INTA como socio estratégico del sistema nacional de innovación agropecuario en Áreas prioritarias mejorado.																																																											
Observation:																																																												
<table><tr><th>Indicators</th><th>Flags*</th><th>Unit of Measure</th><th>Baseline</th><th>Baseline Year</th><th>Means of verification</th><th>Observations</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>EOP</th></tr><tr><td rowspan="4">10.1 Programas cooperativos fortalecidos o en ejecución.</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">Programas</td><td rowspan="4">0.00</td><td rowspan="4">2010</td><td rowspan="4">Informes UGP.</td><td rowspan="4"></td><td>P</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>4.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>4.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>														Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	10.1 Programas cooperativos fortalecidos o en ejecución.		Programas	0.00	2010	Informes UGP.		P	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00	P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	A			1.00	0.00	0.00	0.00						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP																																																
10.1 Programas cooperativos fortalecidos o en ejecución.		Programas	0.00	2010	Informes UGP.		P	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00																																															
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00																																															
	A								1.00	0.00	0.00	0.00																																																
Outcome:	11 Presencia y liderazgo de Argentina en problemas y oportunidades internacionales de investigación agropecuaria incrementada.																																																											
Observation:	De acuerdo con el informe semestral al 30 de junio 3 de los proyectos reportados como ejecutados en PMR en 2014 fueron logrados en 2013.																																																											
<table><tr><th>Indicators</th><th>Flags*</th><th>Unit of Measure</th><th>Baseline</th><th>Baseline Year</th><th>Means of verification</th><th>Observations</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>EOP</th></tr><tr><td rowspan="4">11.1 Proyectos de investigación a partir de convenios internacionales (LABINTEX) elaborados.</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">Proyectos</td><td rowspan="4">0.00</td><td rowspan="4">2010</td><td rowspan="4">Convenios internacionales suscritos y resoluciones.</td><td rowspan="4"></td><td>P</td><td></td><td></td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>30.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td></td><td></td><td>5.00</td><td>10.00</td><td>15.00</td><td>30.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td>4.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>														Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	11.1 Proyectos de investigación a partir de convenios internacionales (LABINTEX) elaborados.		Proyectos	0.00	2010	Convenios internacionales suscritos y resoluciones.		P			10.00	10.00	10.00	30.00	P(a)			5.00	10.00	15.00	30.00	A				4.00	0.00	0.00						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP																																																
11.1 Proyectos de investigación a partir de convenios internacionales (LABINTEX) elaborados.		Proyectos	0.00	2010	Convenios internacionales suscritos y resoluciones.		P			10.00	10.00	10.00	30.00																																															
							P(a)			5.00	10.00	15.00	30.00																																															
	A									4.00	0.00	0.00																																																
Outcome:	12 INCUINTA creada																																																											
Observation:	Para el desarrollo y producción a escala piloto de instrumentos biotecnológicos y la creación de empresas de base agrobiotecnológica.																																																											

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
12.1 Convenios de desarrollo experimental suscriptos con empresas nacionales, instituciones públicas o privadas de investigación.		Convenios	0.00	2010			P	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
							P(a)	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	
	A								0.00	0.00	0.00		
Outcome:	13 Presencia y liderazgo de Argentina en problemas y oportunidades de investigación agropecuaria en el marco de FONTAGRO incrementada.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
13.1 Proyectos de investigación elaborados a partir de convenios internacionales (FONTAGRO)		Convenios	0.00	2010	Resolucion es del Consejo Directivo del INTA.		P	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	10.00
							P(a)	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	10.00
	A						1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
13.2 Contribución al capital del FONTAGRO para la financiación de proyectos regionales de investigación realizada (USD 5 millones)		Contribució n	0.00	2010	Informes de auditoria financiera		P	1.00				1.00	
							P(a)	1.00				1.00	1.00
	A						1.00			0.00	0.00	0.00	
Outcome:	14 Eficiencia económica y técnico-administrativa de la sede central del Organismo mejorada.												
Observation:	Imagen institucional también mejorada.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
14.1 Funciones directivas y de la alta gerencia concentradas en un solo edificio.		Funciones	0.00	2010			P				1.00	1.00	
							P(a)				1.00	1.00	
	A								0.00	0.00	0.00		
14.2 Ahorro anual de costos de alquiler de inmuebles		USD	0.00	2011	Informes de la Unidad Ejecutora u otras auditorías técnicas del INTA.		P				145,000.00	145,000.00	
							P(a)				145,000.00	145,000.00	
	A								0.00	0.00	0.00		

14.3 Porcentaje de ahorro en gastos de energía eléctrica.		%	0.00	2011	Informes de la Unidad Ejecutora u otras auditorías técnicas del INTA.		P					30.00	30.00
	P(a)										30.00	30.00	
	A									0.00	0.00	0.00	
Outcome:	15 Sistemas integrados de información y comunicación interna y externa incorporadas a la gestión de las Áreas de dirección y de las unidades operativas del INTA.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
15.1 Sistemas de gestión integrados.		Sistemas	29.00	2010	Informes de la UE.		P		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
							P(a)		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
							A		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
15.2 Ahorro de costos de comunicaciones y traslado por mejoras en la accesibilidad de la información.		Millones de USD	0.00	2011	Informes UGP		P			0.80	0.70	1.50	
							P(a)			0.80	0.70	1.50	
							A			0.00	0.00	0.00	
Outcome:	16 Capacidades y gestión institucional en Planificación, Seguimiento y Evaluación (PSyE) fortalecidas para orientar la acción hacia resultados e impactos en el Sistema Nacional de Innovación (SNI).												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
16.1 Centros Regionales y de Investigación gestionando el sistema de PSyE descentralizado y utilizandolo para la toma de decisiones.		Centros	0.00	2010	Informes y auditorías técnicas.		P		5.00	9.00	5.00		19.00
							P(a)		5.00	5.00	7.00	7.00	19.00
							A			0.00	0.00	0.00	
Outcome:	17 Capacidad del INTA en el análisis socio-económico de los temas vinculados al desarrollo y adopción de tecnología, ampliada.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
17.1 Estudios socio-económicos publicados en revistas indexadas incrementados.		%	0.00	2010			P			10.00	20.00	10.00	40.00
							P(a)			20.00	20.00	40.00	
							A			0.00	0.00	0.00	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de la Capacidad Estratégica de Investigación y Desarrollo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE) de Córdoba construido y funcionando	Instituto	P		1.00	P		1,680,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estación Experimental Agropecuaria Juárez de Formosa construida y funcionando	Estación	P		1.00	P		1,857,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	2,443,816.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	2,443,816.00
Obras menores de reacondicionamiento de Estaciones Experimentales y Centros de investigación realizadas.	Obras	P	13.00	40.00	P	6,230,000.00	24,076,000.00
		P(a)	4.00	41.00	P(a)	13,552,000.00	27,920,374.00
		A	1.00	2.00	A	2,682,220.00	12,050,594.00
Estaciones Experimentales con Equipamiento de maquinaria agrícola adquirido, entregado y operando.	Estaciones	P		40.00	P	2,736,000.00	9,780,000.00
		P(a)	0.00	40.00	P(a)	373,894.00	8,945,088.00
		A	0.00	40.00	A	230,064.00	6,801,258.00
Auxiliares técnicos y profesionales capacitados en el uso y mantenimiento del equipo adquirido.	Auxiliares	P	25.00	100.00	P	10,000.00	50,000.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	20,000.00	20,000.00
		A	0.00	50.00	A	0.00	0.00
Laboratorio Principal de Metrología (LPM) construido.	Laboratorio	P		1.00	P		152,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	65,966.00	175,909.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Laboratorio de Metrología con Equipamiento adquirido, entregado y operando.	Laboratorio	P		1.00	P	115,000.00	532,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	41,497.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	41,497.00
Eventos regionales del Programa de capacitación y entrenamiento básico y especializado realizados.	Eventos	P	1.00	5.00	P	16,000.00	95,000.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	42,500.00	141,033.70
		A	0.00	6.00	A	10,005.00	77,288.70
Laboratorios de biotecnología construidos.	Laboratorios	P	4.00	12.00	P	1,050,000.00	3,148,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Instituto de Genética (Laboratorio de Biología Molecular del IGEAF) construido	Instituto	P		1.00	P		1,284,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Box de bioseguridad NBS3 Ag construido	Box	P		1.00	P		5,160,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	5,160,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Bioterio de experimentación construido	Bioterio	P		1.00	P		2,400,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	89,827.00	2,389,827.00
		A	0.00	0.00	A	62,333.00	62,333.00
Bioterios refaccionados	Bioterios	P		2.00	P		600,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Invernaderos construidos	Invernaderos	P	1.00	11.00	P	132,000.00	1,132,000.00
		P(a)	130.00	130.00	P(a)	1,742,232.00	1,901,669.00
		A	0.00	0.00	A	1,418,300.00	1,577,737.00

Invernaderos refaccionados	Invernaderos	P		2.00	P		140,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Laboratorios de biotecnología equipados.	Laboratorios	P		29.00	P	1,418,000.00	4,939,000.00
		P(a)	0.00	29.00	P(a)	341,816.00	4,591,871.00
		A	0.00	13.00	A	1,128.00	651,183.00
Cuartos climatizados-cámaras de cría-incubadoras comprados.	Cuartos	P		30.00	P		1,221,000.00
		P(a)	6.00	30.00	P(a)	0.00	1,200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Profesionales capacitados en el exterior.	Profesionales	P	10.00	25.00	P	100,000.00	492,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Consultorías técnicas contratadas	Consultorías	P	5.00	20.00	P	20,000.00	90,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Becarios profesionales incorporados.	Becarios	P		6.00	P	20,000.00	108,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Cursos a profesionales, técnicos y personal de apoyo en uso de técnicas de biotecnologías brindados.	Cursos	P	5.00	20.00	P	15,000.00	155,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Red de laboratorios de biotecnología con insumos y servicios especializados adquiridos.	Red	P	8.00	8.00	P	538,000.00	2,477,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plataformas Tecnológicas (PTs) organizadas y operando	Plataformas	P		4.00	P	2,628,000.00	9,980,000.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	617,500.00	9,622,025.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	4,525.00
Laboratorios con equipamiento adquirido, entregado y funcionando.	Laboratorios	P		40.00	P	3,372,000.00	16,345,000.00
		P(a)	0.00	52.00	P(a)	2,477,990.00	15,610,458.60
		A	0.00	52.00	A	289,051.00	5,421,519.60
Vinculación Tecnológica y Cooperación Internacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Profesionales de la Coordinación de Vinculación Tecnológica capacitados en bioprocesos, valorización de la propiedad intelectual y gestión de empresas de base tecnológica	Profesionales	P	1.00	4.00	P	99,000.00	254,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,208.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	3,208.00
Laboratorios externos del INTA (LABINTEX) implementados.	Laboratorios	P		3.00	P	1,810,000.00	8,028,090.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	650,000.00	3,770,315.30
		A	0.00	1.00	A	118,442.00	1,238,757.30
Planta de INCUINTA para el desarrollo y producción a escala piloto de insumos biotecnológicos relacionados con salud animal, funcionando.	Planta	P		1.00	P	416,000.00	1,298,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
División Incubación de Empresas (INCUINTA) de base tecnológica Start Up de productos tecnológicos en salud animal a escala industrial montada	División	P		1.00	P	632,000.00	2,032,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	464,826.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	464,826.00
Contribución al capital del FONTAGRO para la financiación de proyectos regionales de investigación realizada (USD 5 millones)	Contribución	P		1.00	P		5,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	7,000,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	7,000,000.00

Apoyo a la Transferencia de Tecnología y Extensión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Unidades de Exesión refaccionadas	Unidades	P	30.00	108.00	P	172,000.00	9,375,000.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	0.00	2,854,445.50
		A	0.00	5.00	A	0.00	2,854,445.50
Unidades de extensión (UE) construidas	Unidades	P	14.00	50.00	P	305,000.00	7,042,000.00
		P(a)	4.00	50.00	P(a)	10,500,000.00	32,655,976.50
		A	1.00	14.00	A	1,592,756.00	12,646,990.50
Centros de Capacitación Integral construidos	Centros	P	2.00	10.00	P	76,000.00	1,095,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Viviendas para el personal construidas	Viviendas	P	7.00	34.00	P	755,000.00	4,377,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	0.00
Unidades de Extensión con Equipamiento adquirido, entregado y operando	Unidades	P		125.00	P	719,000.00	1,422,000.00
		P(a)	0.00	125.00	P(a)	0.00	101,770.00
		A	0.00	125.00	A	0.00	101,770.00
Vehículos adquiridos	Vehículos	P		100.00	P		4,962,000.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	0.00	3,505,216.00
		A	0.00	100.00	A	0.00	3,505,216.00
Modelo de gestión ya conceptualizado, implementado	Modelo	P		1.00	P	138,232.00	1,450,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	48,961.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	48,961.00
Profesionales capacitados	Profesionales	P	150.00	600.00	P	1,599,000.00	5,360,000.00
		P(a)	0.00	4,564.00	P(a)	0.00	221,857.00
		A	0.00	4,564.00	A	0.00	221,857.00
Apoyo a la Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (PAF)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Proyectos de investigación y desarrollo formulados acerca de la problemática de la PAF, en ejecución por los actores de la red	Proyectos	P	10.00	50.00	P	56,000.00	200,000.00
		P(a)	1.00	13.00	P(a)	0.00	20,159.50
		A	0.00	12.00	A	0.00	20,159.50
Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar construidos	Institutos	P		3.00	P	1,080,000.00	4,810,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	4,201,720.00	8,485,166.50
		A	0.00	1.00	A	255,463.00	2,913,106.50
Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAFs) equipados.	Institutos	P		3.00	P		1,720,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	61,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	61,000.00
Equipos necesarios para el desarrollo de las investigaciones del Nodo Tecnológico, adquiridos.	Equipos	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Red de investigación y desarrollo tecnológico para la PAF, a través del CIPAF e IPAFs, conformada	Red	P		1.00	P	14,000.00	50,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Laboratorio para el Desarrollo de Prototipos de Maquinarias Agrícolas y Equipamientos de AIR apropiados para la PAF (Nodo tecnológico), construidos	Laboratorio	P		1.00	P		139,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Equipos multidisciplinarios capacitados en investigación acción participativa y comunicación popular, con abordaje interdisciplinario, conformados	Equipos	P	1.00	5.00	P	80,000.00	360,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	91,321.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	91,321.00
Técnicos de Investigación y de Programas de Desarrollo Rural capacitados en las tecnologías apropiadas	Técnicos	P	200.00	800.00	P	70,000.00	420,000.00
		P(a)	0.00	200.00	P(a)	0.00	10,000.00
		A	0.00	200.00	A	0.00	10,000.00
Modernización y Fortalecimiento Institucional del INTA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Edificio Central Sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria construido	Edificio	P	1.00	1.00	P	3,800,000.00	19,800,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Investigadores capacitados en economía de los recursos naturales, propiedad intelectual, normativas de calidad, análisis de sustentabilidad, estructura agraria.	Investigadores	P	10.00	46.00	P		153,000.00
		P(a)	0.00	12.00	P(a)	0.00	1,000.00
		A	0.00	12.00	A	0.00	1,000.00
Unidades con equipamiento e infraestructura para redes internas de información y conectividad instaladas.	Unidades	P	0.00	26.00	P	3,148,170.00	17,327,100.00
		P(a)	0.00	26.00	P(a)	4,133,929.00	16,066,116.00
		A	0.00	26.00	A	1,274,280.00	9,206,467.00
Sistemas Integrados y procesos (Planificación, Administración, Recursos Humanos y Convenios Institucionales y Vinculación) desarrollados y en funcionamiento	Sistemas	P		5.00	P	0.00	1,150,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	0.00	593,456.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	593,456.00
Unidad de Soporte y Digitalización implementada	Unidad	P		1.00	P	0.00	152,581.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	81,452.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	81,452.00
Sistema de Seguridad Informática implementado	Sistema	P		1.00	P	0.00	102,500.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	691,888.40
		A	0.00	1.00	A	0.00	691,888.40
Portal institucional (Web) y Respuesta Telefónica Integrada (RTI), actualizados	Portal	P		1.00	P		252,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	49,499.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	49,499.00
Intranet implementada y en funcionamiento	Intranet	P		1.00	P		849,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	832,142.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	32,142.00
Red de Información Agropecuaria Nacional (RIAN) implementada y puesta en marcha	Red	P		1.00	P		3,373,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	260,861.30
		A	0.00	1.00	A	39,485.00	300,346.30
Centros documentales re equipados y funcionando bajo sistemas de gestión documental en formato digital	Centros	P	15.00	55.00	P		813,000.00
		P(a)	0.00	55.00	P(a)	0.00	186,372.00
		A	0.00	0.00	A	7,187.00	193,559.00
Plataforma de comunicación interna funcionando	Plataforma	P		1.00	P	555,000.00	1,960,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	357,714.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	357,714.00
Plan Estratégico de comunicación institucional implementado	Plan	P		1.00	P		4,385,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	137,252.40
		A	0.00	0.00	A	0.00	137,252.40
Red de comunicadores en funcionamiento	Red	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	81,905.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	81,905.00

Diseño de un sistema mejorado de PSyE concluido	Diseño	P		1.00	P	261,000.00	957,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	97,099.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	97,099.00
Profesionales por Centro Regional/Centro de Investigación con formación conceptual, metodológica y operativa en PSyE y capacitados para la gestión en su ámbito	Profesionales	P		57.00	P	400,000.00	1,202,000.00
		P(a)	0.00	15.00	P(a)	0.00	183,137.00
		A	0.00	15.00	A	0.00	183,137.00
Estudios realizados (de los principales mercados de productos exportables, de mercados bioenergéticos, de impacto de cambio climático, de derechos de propiedad, de competitividad, de uso de la tierra, de financiación de la producción)	Estudios	P	2.00	10.00	P	22,000.00	204,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Modelos de simulación para analizar la sustentabilidad económica y social de los principales sistemas de producción identificados	Modelos	P		2.00	P		62,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluaciones de impacto (cadenas o tecnologías o proyectos o región) realizadas	Evaluaciones	P	4.00	10.00	P	266,000.00	1,140,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Base de datos completada con información georeferenciada en sistemas de producción y cadenas de valor; incluyendo los perfiles económico, tecnológico, social y agroecológico iniciado	Base	P		1.00	P	3,000.00	66,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de consulta, en base a interfase web, para el acceso a las bases de datos de Economía y Sociología, operativo	Sistema	P		1.00	P	3,000.00	57,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de gestión de la calidad del Instituto de Economía y Sociología según norma IRAM ISO 9001:2000; para el seguimiento de la atención de las demandas recibidas, implementado	Sistema	P		1.00	P	4,000.00	76,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluaciones inicial y final de indicadores de producción y calidad de los servicios institucionales realizadas	Evaluaciones	P	1.00	2.00	P	697,163.00	1,200,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	445,000.00	908,199.50
		A	0.00	0.00	A	0.00	28,199.50
Investigadores capacitados en análisis de prospectiva y metodología de escenarios futuros de los mercado	Investigadores	P	2.00	10.00	P		22,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	1,554.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	1,554.00
Estudios sobre la competitividad de las cadenas agroalimentarias y su sustentabilidad en el mediano y largo plazo realizados	Estudios	P		3.00	P	6,000.00	60,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	20,000.00	29,870.20
		A	0.00	0.00	A	0.00	9,870.20
Administración y Gastos Concurrentes							

Other Cost		2015	Cost
Unidad de Gestión del Programa	P	\$133,000.00	\$2,000,265.00
	P(a)	\$356,793.00	\$1,725,121.00
	A	\$92,311.00	\$1,256,462.00
Auditorías	P	\$250,000.00	\$1,000,000.00
	P(a)	\$163,299.00	\$373,299.00
	A	\$163,299.00	\$163,299.00
Imprevistos	P	\$6,800,000.00	\$6,800,000.00
	P(a)	\$0.00	\$6,448,807.60
	A	\$0.00	\$0.00

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$42,769,565.00	\$213,000,536.00
	P(a)	\$39,794,466.00	\$137,006,394.00
	A	\$8,236,324.00	\$73,779,671.40

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de gestión de la calidad del Instituto de Economía y Sociología según norma IRAM ISO 9001:2000; para el seguimiento de la atención de las demandas recibidas, implementado	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Sistema de consulta, en base a interfase web, para el acceso a las bases de datos de Economía y Sociología, operativo	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Base de datos completada con información georeferenciada en sistemas de producción y cadenas de valor; incluyendo los perfiles económico, tecnológico, social y agroecológico iniciado	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Investigadores capacitados en economía de los recursos naturales, propiedad intelectual, normativas de calidad, análisis de sustentabilidad, estructura agraria.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Modelos de simulación para analizar la sustentabilidad económica y social de los principales sistemas de producción identificados	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Investigadores capacitados en análisis de prospectiva y metodología de escenarios futuros de los mercado	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Estudios realizados (de los principales mercados de productos exportables, de mercados bioenergéticos, de impacto de cambio climático, de derechos de propiedad, de competitividad, de uso de la tierra, de financiación de la producción)	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Profesionales por Centro Regional/Centro de Investigación con formación conceptual, metodológica y operativa en PSyE y capacitados para la gestión en su ámbito	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Red de comunicadores en funcionamiento	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Red de investigación y desarrollo tecnológico para la PAF, a través del CIPAF e IPAFs, conformada	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Proyectos de investigación y desarrollo formulados acerca de la problemática de la PAF, en ejecución por los actores de la red	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Técnicos de Investigación y de Programas de Desarrollo Rural capacitados en las tecnologías apropiadas	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015

Output	Equipos multidisciplinarios capacitados en investigación acción participativa y comunicación popular, con abordaje interdisciplinario, conformados	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Equipos necesarios para el desarrollo de las investigaciones del Nodo Tecnológico, adquiridos.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAFs) equipados.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Unidades de Extesión refaccionadas	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Viviendas para el personal construidas	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Centros de Capacitación Integral construidos	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Profesionales de la Coordinación de Vinculación Tecnológica capacitados en bioprocesos, valorización de la propiedad intelectual y gestión de empresas de base tecnológica	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	División Incubación de Empresas (INCUINTA) de base tecnológica Start Up de productos tecnológicos en salud animal a escala industrial montada	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Planta de INCUINTA para el desarrollo y producción a escala piloto de insumos biotecnológicos relacionados con salud animal, funcionando.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Red de laboratorios de biotecnología con insumos y servicios especializados adquiridos.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Cursos a profesionales, técnicos y personal de apoyo en uso de técnicas de biotecnologías brindados.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Becarios profesionales incorporados.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Consultorías técnicas contratadas	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Profesionales capacitados en el exterior.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Invernaderos refaccionados	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Invernaderos construidos	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Bioterios refaccionados	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Instituto de Genética (Laboratorio de Biología Molecular del IGEAF) construido	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015

Output	Laboratorios de biotecnología construidos.	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE) de Córdoba construido y funcionando	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Edificio Central Sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria construido	Inactivate Output	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015
Output	Edificio Central Sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria construido	Modify Physical P(a) value	Producto no prioritario para el INTA de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Ayuda Memoria del Taller de Evaluación Intermedia del Programa realizada en marzo 2015. (IDBDOCS #39856556)	9/29/2015	3/26/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
