



Operation Number: **EC-L1097**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/19/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/19/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Protection and Recovery of Cultural Heritage Assets program	Loan Number:	2678/OC-EC
Executing Agency (EA):	Ministerio Coordinador de Patrimonio		
Team Leader:	Lopez-Lamia,Alejandro J.	Sector/Subsector:	URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1097	\$37,840,000.00	\$37,840,000.00	\$2,160,000.00		\$40,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1097	\$37,840,000.00	\$18,360,837.84	48.52%	\$19,479,162.16


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

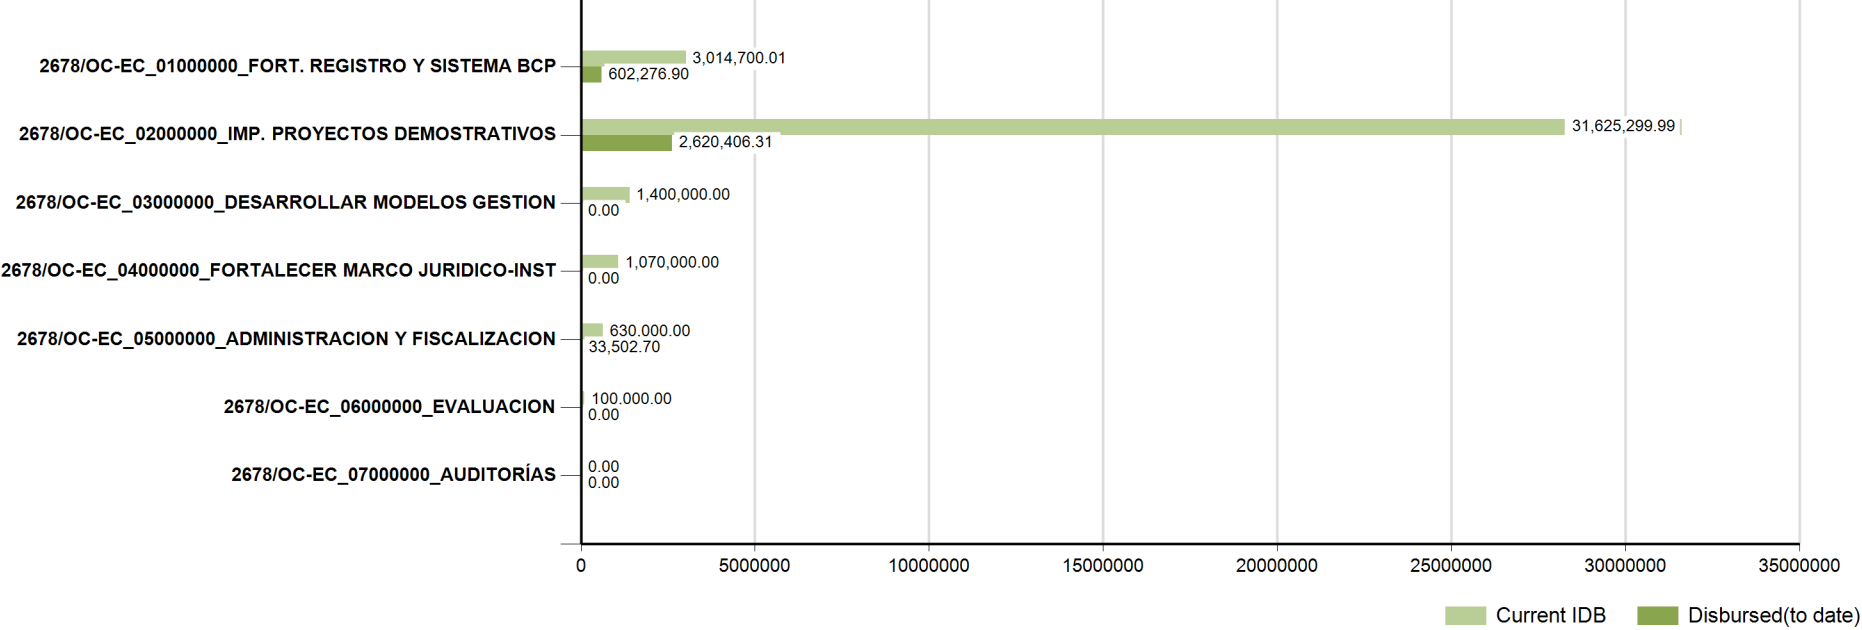

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Impulsar el desarrollo de las economías locales mediante la revitalización social, cultural y económica de los BCP y posicionar el País como referente de conocimiento en la gestión patrimonial								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		EOP
1.1 Matriz de producción y contribución económica a las localidades intervenidas		Moneda	0.00	2012	Informe de Evaluación de Impacto	Requiere el levantamiento de una línea de base. Existen datos duros disponibles (CENSO económico). Meta al final de programa por definir.	P	1.00	1.00
							P(a)	1.00	1.00
							A		
1.2 Análisis de incorporación y uso de los BCP (Bienes Culturales Patrimoniales).		Porcentaje	0.00	2012	Informe de Evaluación de Impacto.	Requiere el levantamiento de una línea de base. Existen datos duros en el sistema (ABACO). Pendiente definición de meta y unidad de medida.	P	1.00	1.00
							P(a)	1.00	1.00
							A		
1.3 Posicionamiento del Ecuador en relación al gestión del conocimiento y gestión patrimonial		Ubicacion en listado	0.00	2012	Informe de Evaluación de Impacto.	Se requiere la definición de los grupos de interés y el levantamiento de la línea de base. Meta a ser medida un año despues de finalizado el proyecto.	P		1.00
							P(a)		1.00
							A		
1.4 Publicaciones indexadas especializadas a nivel internacional		Publicaciones	0.00	2011	Copias de publicaciones en archivos del Programa.		P		2.00
							P(a)		2.00
							A		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Conocimiento sobre BCP incrementado y sistematizado
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
1.1 Porcentaje de BCP registrados en el SNBCP.			Porcentaje	2.70	2011	Reportes del SNBCP		P			4.00			10.00	
								P(a)				4.00		10.00	
								A							
1.2 Consultas realizadas al SNBCP al año.			Consultas	90,000.00	2011	Reportes del SNBCP	Este indicador se utilizará como proxy para estimar la utilización efectiva del sistema por funcionarios públicos y público en general. En la actualidad, se ha estimado un promedio de 90 mil consultas anuales, las cuales se utilizará como línea de base. L	P	100,000.00	140,000.00	180,000.00	220,000.00	270,000.00		270,000.00
								P(a)	100,000.00	140,000.00		150,000.00	270,000.00		270,000.00
								A							
Outcome:	2 Valorización de los BCP de los proyectos demostrativos y las intervenciones emergentes														
Observation:															

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP		
2.1 Inversiones conexas realizadas en Zaruma, Santa Elena y Pastaza-Puyo.		US\$	0.00	2010	MCP. Municipios de Zaruma, Santa Elena y Puyo	Antes de realizar cada proyecto demostrativo, se levantará una línea de base de con la totalidad de los BCP en el área de intervención a través del SNBCP. Esta línea de base servirá para comparar si debido a las intervenciones realizadas se registran nuevos	P			1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00	
							P(a)				1,000,000.00	1,000,000.00			2,000,000.00
							A								
2.2 % de mujeres que participaron en actividades vinculadas a la rehabilitación de bienes culturales		Porcentaje	0.00	2011	Informes de evaluación y de impacto	Indicador incorporado a pedido de FMM	P						25.00		
							P(a)					25.00			25.00
							A								
Outcome:	3 Modelos de gestión incorporados en los lineamientos de política del sector														
Observation:															

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
3.1 Modelos de gestión diseñados en base a mejores prácticas y aprobados			Modelos	0.00	2011	Resolución de aprobación del Ministerio de Cultura y Patrimonio	Estos modelos serán desarrollados por el programa en base al aprendizaje obtenido en los proyectos demostrativos y en las intervenciones emergentes, así como del PEPC. Dichos modelos deberán parametrizar los potenciales costos-beneficios de los proyectos,	P					2.00		2.00
		P(a)									2.00		2.00		
		A													
Outcome:	4 Capacidad del MCP para ejercer sus funciones de manera efectiva aumentada														
Observation:															

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
4.1 Proyecto de Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP actualizada y presentada a la Presidencia de la República para ser remitida a la Asamblea Nacional.		Proyecto de Ley	0.00	2011	Oficio de presentación del Proyecto de Ley a la Presidencia de la República.	Existe una iniciativa legal que debe ser actualizada y estructurada en un proyecto de Ley. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional es tomada como proxy dado que la misma depende, en gran medida, del grado de éxito que el MCP tenga en la elaboración	P		1.00				1.00
							P(a)				1.00		1.00
							A						

4.2 Reglamento de coordinación inter-institucional sobre el patrimonio cultural aprobado						Su aprobación por parte del Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural es tomada como proxy dado que la misma depende, en gran medida, del grado de éxito que el MCyP tenga en la preparación y promoción del reglamento.	P					1.00		1.00
							P(a)					1.00		1.00
							A							
		Reglamento	0.00	2011	Resolución del Ministerio de Cultura y Patrimonio.									

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1. FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS BCP		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
P1. Registros de BCP, ingresados y validados en el Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales	BCP	P	70,000.00	219,000.00	P	1,767,990.00	9,620,000.00
		P(a)	3,000.00	102,000.00	P(a)	62,294.59	639,270.31
		A		12,000.00	A		576,975.72
P2. Software desarrollado y adquirido.	Software	P		5.00	P		540,840.00
		P(a)		1.00	P(a)		150,000.00
		A		0.00	A		0.00
P3. Equipos para geo-referenciación y contingencia adquiridos	Equipos	P		2.00	P		426,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		330,000.00
		A		1.00	A		30,000.00
P4. Atlas de los BCP y mapa patrimonial del Ecuador, desarrollado	Atlas	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
P5. Capacitación de profesionales para tareas de registro y sistematización de los BPC, implementada.	Personas	P	90.00	450.00	P	60,000.00	300,000.00
		P(a)	131.00	131.00	P(a)		54,000.00
		A		0.00	A		0.00
C2. IMPLEMENTACION PROYECTOS DEMOSTRATIVOS E INTERVENCIONES EMERGENTES		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
P6. Estudios de definición de políticas de gestión por ámbito de BCP, realizados	Estudios	P		5.00	P		200,000.00
		P(a)		5.00	P(a)		743,607.02
		A		0.00	A		36,850.00
P7. Estudios de sostenibilidad para el sistema integral de BCP en las intervenciones demostrativas	Estudios	P		3.00	P		1,000,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	47,330.36	568,292.36
		A		1.00	A		520,962.00
P8. Proyectos Demostrativos de BCP ejecutados.	Proyectos	P	6.00	25.00	P	3,210,000.00	17,520,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	401,527.49	1,425,585.25
		A		0.00	A		1,024,057.76
P9. Proyectos Emergentes de BCP Ejecutados.	Proyectos	P		5.00	P		4,953,160.00
		P(a)	7.00	17.00	P(a)	5,732,426.46	11,667,118.31
		A		0.00	A		1,520,821.73
C3. DESARROLLO DE MODELOS DE GESTION SUSTENTABLES		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
P10. Modelos de gestión diseñados y validados por el MCP.	Modelos	P	2.00	4.00	P	150,000.00	300,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
P11. Entidades capacitadas en aspectos técnicos institucionales (Plan de transferencia realizado).	Entidades	P		15.00	P		500,000.00
		P(a)		5.00	P(a)		533,273.46
		A		0.00	A		0.00
P12. Plan Estrategico de comunicación elaborado e implementado.	Plan	P	1.00	1.00	P	550,000.00	600,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		50,000.00
		A		0.00	A		0.00
C4. FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL DE LOS BCP		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP

P13. Propuesta de actualizacion de la Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP, elaborada	Propuesta	P	1.00	1.00	P	25,000.00	50,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
P14. Mejoras al Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales - SNBCP implementado	Sistema	P	10.00	10.00	P	350,000.00	350,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	152,727.27	240,000.00
		A		0.00	A		0.00
P15. Unidad de gestión del conocimiento en el Ministerio de Coordinación del Patrimonio - MCP establecida	Unidad de Gestion	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		40,000.00
		A		0.00	A		0.00
P16. Intercambios para buenas practicas de los BCP con instituciones internacionales afines realizados	Intercambios	P		5.00	P		350,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		15,000.00
		A		2.00	A		4,773.30
C5. ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL PROGRAMA							
C6. EVALUACION							
C7. AUDITORIAS							

Other Cost		2016	Cost
Administracion del programa	P	\$586,000.00	\$2,590,000.00
	P(a)	\$800,216.60	\$2,422,206.83
	A		\$1,271,990.23
Evaluacion Intermedia y Final	P		\$100,000.00
	P(a)		\$50,000.00
	A		\$0.00
Auditorias Financieras	P	\$40,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$15,307.00	\$80,457.00
	A		\$45,150.00
Fiscalización	P		\$0.00
	P(a)	\$42,276.00	\$88,942.68
	A		\$46,666.68
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$6,738,990.00	\$40,000,000.00
	P(a)	\$7,254,105.77	\$17,253,496.04
	A		\$5,078,247.42

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
