



Operation Number: **ME-L1115**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/6/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/12/2014**
Division Chief validation date: **06/24/2014**
Country Representative validation date: **07/03/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Management and Investment Strengthening Project 3x1 for Migrants, Phase II	Loan Number:	2782/OC-ME
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Team Leader:	Pineda Mannheim,Carlos R.	Sector/Subsector:	MIGRATION & MIGRANTS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1115	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$51,775,000.00	\$0.00	\$72,775,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1115	\$21,000,000.00	\$3,854,916.17	18.36%	\$17,145,083.83


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

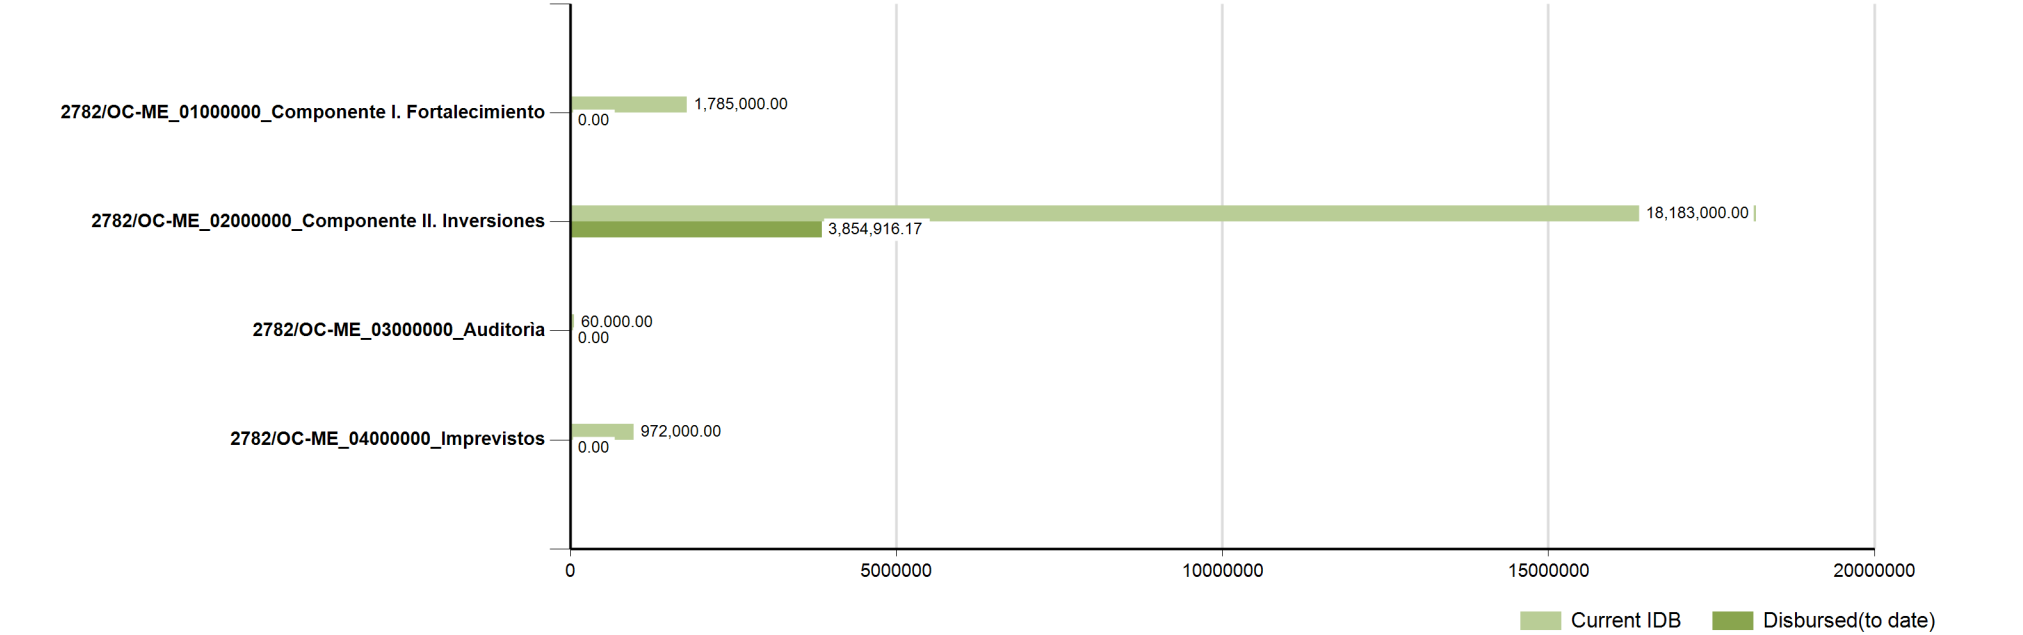

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Indicadores de Cobertura									
Observation:	1.4 Este indicador no aplica. Conforme a la propuesta de cambio de matriz presentada y autorizada por el Banco DOCS: 38671852									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
1.1 Porcentaje de municipios cuyo grado de intensidad migratoria es muy alto, alto o medio, con proyectos financiados por el P3x1			%	34.00	2012	UMR-SIG-P3x1	Esta información es censal por lo que el denominador se mantendrá constante hasta el próximo censo.	P	37.00	40.00
								P(a)	37.00	40.00
								A	36.00	
1.2 Porcentaje de municipios que participan por primera vez en el P3x1 con proyectos financiados			%	0.00	2011	Reporte anual del SIIPSO		P	2.50	5.00
								P(a)	2.50	5.00
								A		
1.3 Número de beneficiarios de las inversiones en infraestructura social del P3x1			Beneficiarios	1,724,000.00	2011	Reportes SIG-P3x1/ SIIPSO		P	1,724,000.00	1,724,000.00
								P(a)	1,724,000.00	1,724,000.00
								A	2,886,600.00	
1.4 Número de personas ocupadas en los Proyectos Productivos			Personas	279.00	2009	Registros llevados en las Delegaciones y reportados en SIIPSO.	La línea de base se encuentra en proceso de levantamiento. La meta final se establecerá una vez conocida la línea de base.	P	0.00	0.00
								P(a)	0.00	0.00
								A	0.00	0.00
Outcome:	2 Indicador coordinación interinstitucional									
Observation:	2.1 Este indicador no aplica. Conforme a la propuesta de cambio de matriz presentada y autorizada por el Banco DOCS: 38671852									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
2.1 Porcentaje de Proyectos Productivos individuales financiados por el P3X1 con permanencia después del segundo año de haber recibido el financiamiento		%	70.00	2009	Informe de evaluación de Procesos (bienes y servicios)	La línea de base se encuentra en proceso de levantamiento. La meta final se establecerá una vez conocida la línea de base.	P	0.00	0.00
	P(a)						0.00	0.00	
	A						0.00	0.00	
2.2 Porcentaje de proyectos de infraestructura social aprobados cuya mezcla financiera incluye la participación federal, estatal, municipal y de los migrantes.		%	67.50	2011	Reporte SIG-P3x1/SIIPSO		P	70.00	75.00
	P(a)						70.00	75.00	
	A						73.79		
2.3 Porcentaje de Proyectos Productivos Comunitarios aprobados cuya mezcla financiera incluye la participación federal, estatal, municipal y de los migrantes.		%	70.00	2011	Reporte SIG-P3x1/SIIPSO		P	70.00	70.00
	P(a)						70.00	70.00	
	A						70.97		
2.4 Número de nuevos clubes y organizaciones de migrantes que participan por primera vez con iniciativas de inversión aprobadas en el Programa 3x1 para Migrantes.		Nuevos clubes	0.00	2011	Reporte del SIG-P3x1/SIIPSO		P	100.00	200.00
	P(a)						100.00	200.00	
	A						508.00		
Outcome:	3 Indicador de transparencia								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
3.1 Porcentaje de propuesta de proyectos de los clubes u organizaciones de migrantes presentadas a los COVAM a través del SIG-P3x1		%	0.00	2011	Reporte del SIG-P3x1		P	30.00	90.00
							P(a)	30.00	90.00
							A	0.00	
Outcome:	4 Indicador de rendición de cuentas								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
4.1 Número de clubes espejo o comités de contraloría social integradas por el Programa		Clubes	1,016.00	2011	Reporte del Sistema Informatico de la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública		P	2,128.00	2,128.00
							P(a)	2,128.00	2,128.00
							A	2,136.00	
4.2 Porcentaje de proyectos de infraestructura social en operación y mantenimiento despues de 2 años completos de finalizada la obra.		%	0.00	2011	Reporte de la Dirección General de Seguimiento		P	90.00	95.00
							P(a)	90.00	95.00
							A	0.00	
Outcome:	5 Indicador transversal de inclusión								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
5.1 Porcentaje de municipios predominantem ente indígenas con proyectos de infraestructura social financiados por el P3x1		%	10.00	2011	Reporte del Sistema. Fuente: UMR-SIG-P3x1		P	10.00	10.00
							P(a)	10.00	10.00
							A	8.66	

5.2 Porcentaje de proyectos productivos financiados por el P3x1 con mujeres titulares en México		%	21.00	2011	Reportes SIG-P3x1/SIIPS O		P	23.00	25.00
							P(a)	23.00	25.00
							A	23.65	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Sistema de información y gestión del Programa 3x1 para Migrantes	Sistema	P		1.00	P		1,357,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,357,000.00
		A	0.00	0.00	A	38,190.00	38,190.00
Número de Delegaciones de SEDESOL apoyadas con provisión de equipos de cómputo para la implementación del SIG-P3x1	Delegaciones	P	16.00	29.00	P	147,309.00	1,049,400.00
		P(a)	16.00	28.00	P(a)	147,309.00	1,049,400.00
		A	0.00	0.00	A		
Número de eventos de promoción del programa dirigidos a federaciones y clubes de migrantes.	Eventos	P	2.00	9.00	P	28,636.00	204,000.00
		P(a)	2.00	9.00	P(a)	28,636.00	204,000.00
		A	1.00	1.00	A		
Número de encuentros de federaciones y clubes de migrantes con presidentes municipales.	Encuentros	P	2.00	9.00	P		
		P(a)	2.00	9.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		
Número de eventos de promoción y capacitación del programa para presidentes y servidores públicos municipales.	Eventos	P	3.00	15.00	P	114,573.00	816,200.00
		P(a)	3.00	15.00	P(a)	114,573.00	816,200.00
		A	0.00	0.00	A		
Número de eventos de promoción y capacitación del programa para clubes espejo.	Eventos	P	3.00	15.00	P	65,470.00	466,400.00
		P(a)	3.00	15.00	P(a)	65,470.00	466,400.00
		A	5.00	5.00	A		
Número de talleres de coordinación previos al COVAM entre municipios y federaciones/clubes de migrantes.	Talleres	P	1.00	6.00	P	11,089.00	79,000.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	11,089.00	79,000.00
		A	0.00	0.00	A		
Inversiones		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Proyectos de infraestructura social financiados por el P3x1	Proyectos	P	1,291.00	6,384.00	P	6,584,125.00	46,905,550.00
		P(a)	1,291.00	6,384.00	P(a)	6,584,125.00	46,905,550.00
		A	1,782.00	1,782.00	A	4,926,609.00	4,926,609.00
Número de proyectos de infraestructura social con planes de mantenimiento presentados al Club Espejo.	Proyectos	P	319.00	4,256.00	P	1,857,014.00	13,229,000.00
		P(a)	319.00	4,246.00	P(a)	1,857,014.00	13,229,000.00
		A	0.00	0.00	A	1,715,324.00	1,715,324.00
Número de Proyectos Productivos Individuales financiados por el P3x1	Proyectos	P	143.00	819.00	P	707,487.00	5,040,000.00
		P(a)	143.00	819.00	P(a)	707,487.00	5,040,000.00
		A	179.00	179.00	A	866,789.00	866,789.00
Número de Proyectos Productivos Comunitarios financiados por el P3x1	Proyectos	P	13.00	75.00	P	353,744.00	2,520,000.00
		P(a)	13.00	112.00	P(a)	353,744.00	2,520,000.00
		A	62.00	62.00	A		
Número de proyectos productivos que recibieron asesoría y asistencia técnica durante su implementación.	Proyectos	P	52.00	551.00	P		
		P(a)	52.00	551.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		
Número de talleres de capacitación en administración de proyectos para emprendedores locales que ejecutarán proyectos productivos	Talleres	P	11.00	60.00	P		
		P(a)	11.00	60.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		
Total Cost					2013	Total Cost	
				P	\$9,869,447.00	\$71,666,550.00	
				P(a)	\$9,869,447.00	\$23,664,906.00	
				A	\$7,546,912.00	\$7,546,912.00	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
