

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Número da Operação:	GRT/FM-11375-GU
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	GEF - GEF
Operação Relacionada:	GU-L1002
Subtipo de Operação:	IGR - Empréstimos de inversão

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	3.660.000,00
Desembolsado:	2.022.633,71
% Desembolsado:	55,26
Saldo:	1.637.366,29

Custo Total e Fonte

Original BID:	3.660.000,00
Corrente BID:	3.660.000,00
Pari-passu:	100,00
Cofinanciamento/País:	
Original Estimado:	3.660.000,00
Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 08-oct-2013
Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013

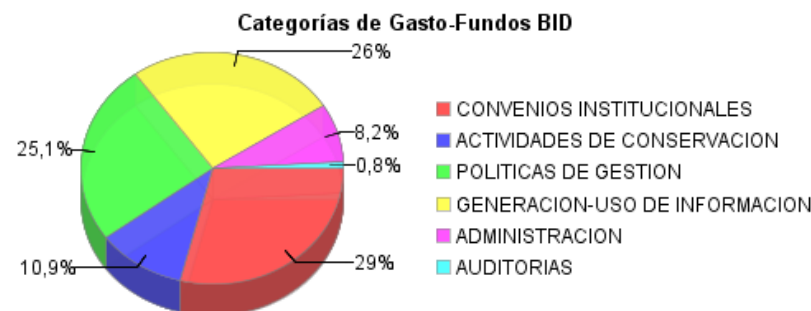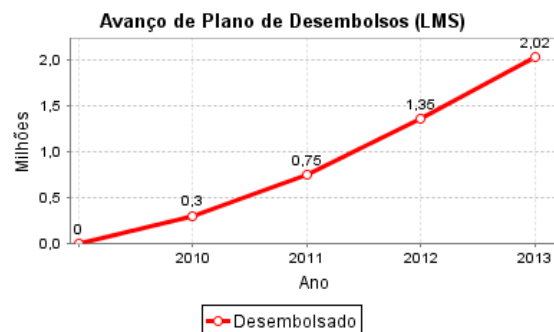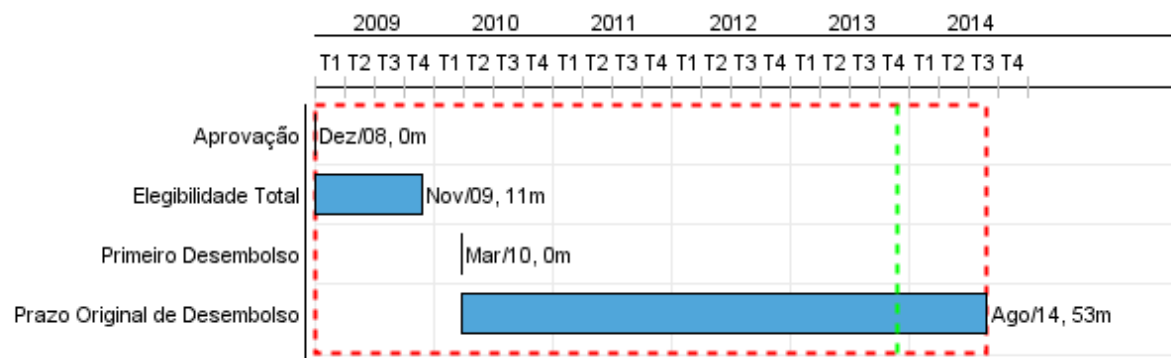

Progresso Acumulado até 2013

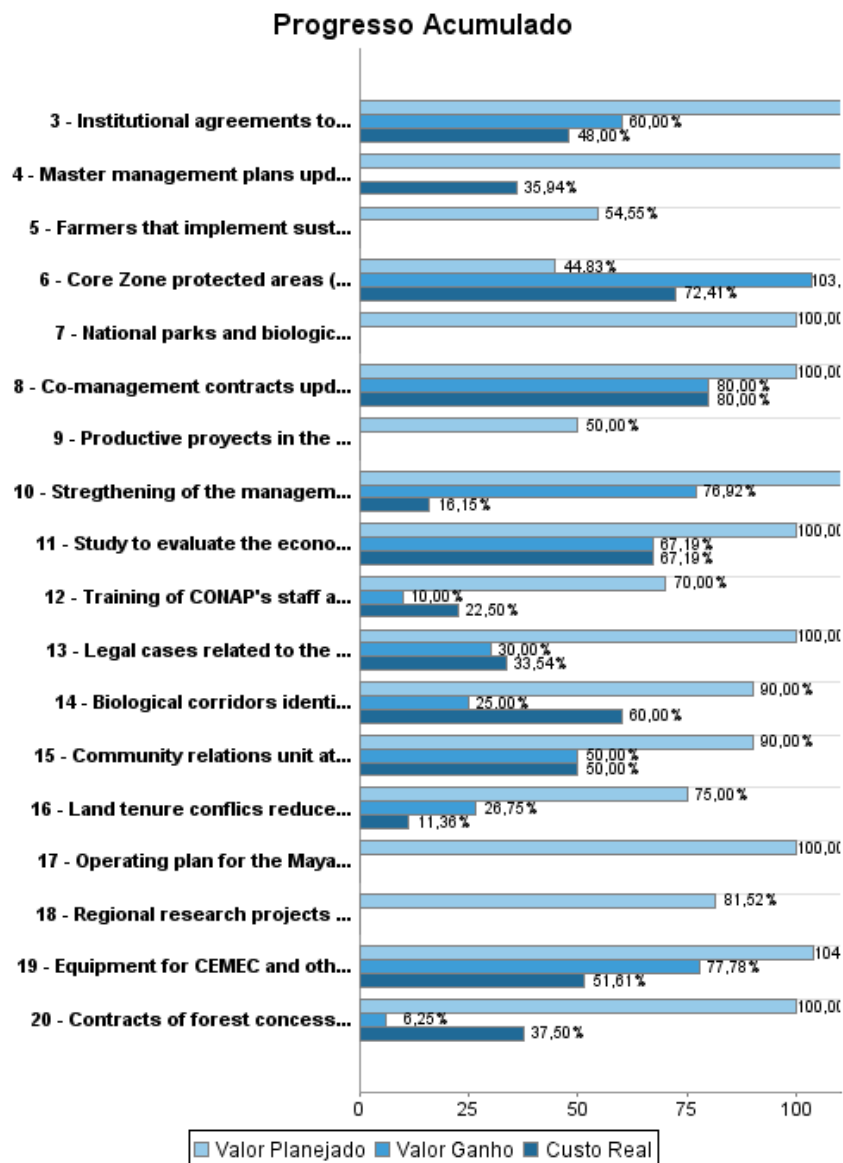

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO


GU-X1001 - GRT-Improvement of the Management Effectiveness in the MBR
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 18/09/2013

Progresso Acumulado

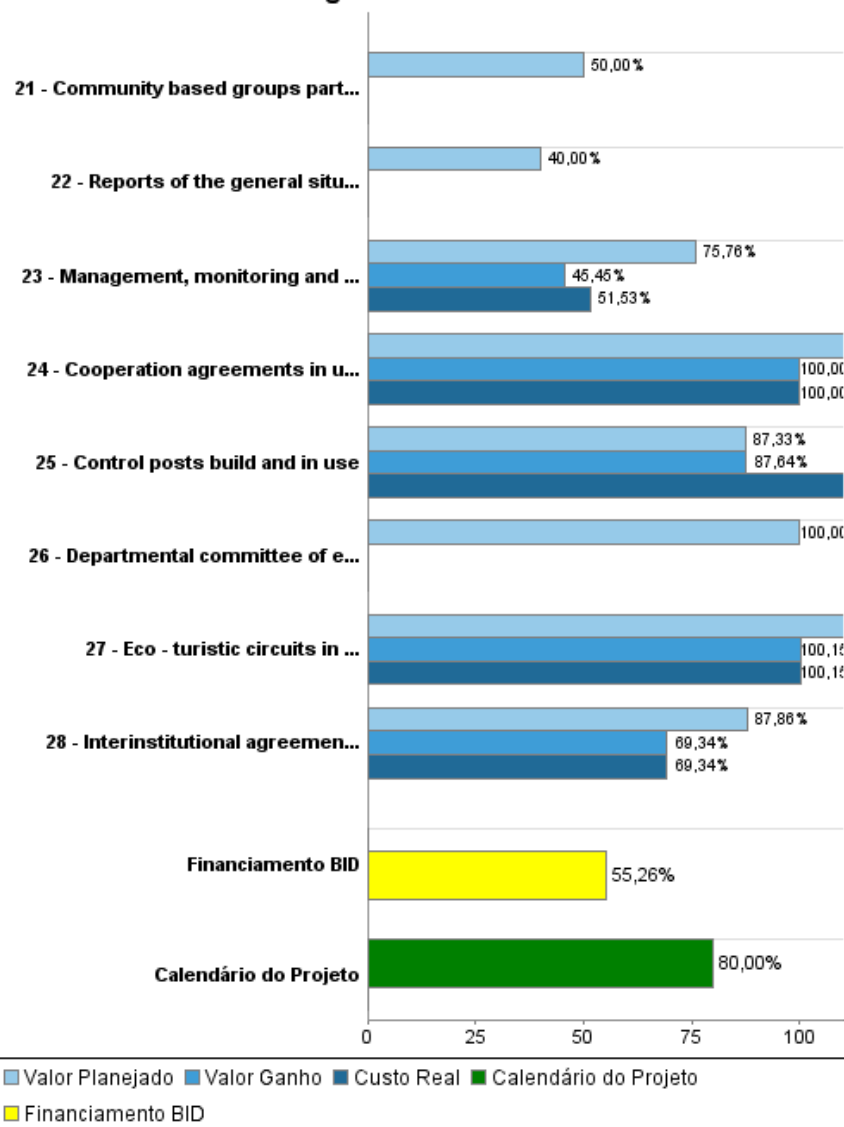

Resultados

Resultado:	Number of fires (heat points) in the Multiple Use Zone (MUZ) and Core Zone (CZ) of the MBR (Mayan Biosphere Reserve) decreases
Suposições:	Fires (heat points) are the result of productive activities not compatible with use restrictions that the protected area imposes.
Observações:	Fires (heat points) are correlated with relative humidity of the dry season

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Fires (heat points)	Number	2.110,00	2008	P A	1.266,00

Resultado:	Sales of forest concessions increases
Suposições:	Prices are within the average price for the period 2008 - 2010
Observações:	Includes timber and non - timber products

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Sales of forest concessions in the MBR (Mayan Biosphere Reserve)	Quetzales	10.000.000,00	2009	P A	11.000.000,00

Resultado:	Protected areas of the Core Zone (CZ) of the Mayan Biosphere Reserve (MBR) registered to the CONAP
Suposições:	The legal framework of protected areas is not modified
Observações:	There is co-financing from loan 2149/BL-GU and support from the Cadastre Information Registry (RIC by its acronym in Spanish)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Protected areas registered to the CONAP	Porcentaje		2009	P A	2,53

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de los convenios institucionales y de la capacidad para la gestión eficaz de la RBM									
Institutional agreements to support the management of natural resources in the Mayan Biosphere Reserve (MBR)	Agreement	5,00			12,00	13.000,00			25.000,00
Contracts of forest concessions reviewed	Contract	4,00			7,00	20.000,00			40.000,00
Biological corridors identified	Biological corridor	1,00			4,00	8.000,00			20.000,00
Co-management contracts updated for the Core Zone of the Mayan Biosphere Reserve (MBR)	Contract	1,00			1,00	1.000,00			5.000,00
Cooperation agreements in use to implement operating plans in the special use zones	Agreement	1,00			4,00	12.000,00			12.000,00
Community relations unit at CONAP working	Unit working	1,00			1,00	25.000,00			50.000,00
Master management plans updated or drafted for core zones of the MBR	Master plan	2,00			6,00	180.000,00	118.000,00		370.000,00
Control posts build and in use	Control post	1,00			1,00	74.000,00	225.000,00		600.000,00
Departmental committee of environmental education reestablished	Committee	1,00			1,00	10.000,00			20.000,00
Households participating in activities of environmental sensitization	Households	100,00			100,00	20.000,00			20.000,00
Incentivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la RBM									
Productive projects in the Multiple Use Zone (MUZ) implemented	Projects	1,00			5,00	100.000,00			200.000,00
Managers of community forest concessions trained	People	4,00			16,00	20.000,00			40.000,00
Eco - turistic circuits in the Core Zone with infrastructure	Circuit	1,00			1,00	90.000,00			90.000,00
Community based groups participate in turistic circuits development	Groups	1,00			2,00	20.000,00			40.000,00
Farmers that implement sustainable agricultural practices in the Multiple Use Zone of the Mayan Biosphere Reserve	Farmers	60,00			120,00	25.000,00			55.000,00
Formulación e implementación de políticas, normas y otros instrumentos para la gestión de la RBM									
Land tenure conflicts reduced in the MBR	Conflict	120,00			150,00	50.000,00			100.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

GU-X1001 - GRT-Improvement of the Management Effectiveness in the MBR
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 18/09/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Core Zone protected areas (CZ) and forest concessions with demarcation and benchmarks in the field	Protected area	3,00			5,00	35.000,00			145.000,00
Strengthening of the management of the National Park Sierra Lacandon (PNSL, by its Spanish acronym)	Study	1,00			1,00	165.000,00			260.000,00
National parks and biological corridors registered with the General Registry of Property	Protected area	2,00			4,00	25.000,00			50.000,00
Legal cases related to the Mayan Biosphere Reserve (MBR) solved	Legal case	2,00			4,00	70.000,00	6.000,00		100.000,00
Study to evaluate the economic value of environmental services finished	Study	1,00			1,00	7.000,00			32.000,00
Operating plan for the Mayan Biosphere Reserve (MBR) drafted	Operating plan	1,00			1,00	86.000,00			166.000,00
Generación y uso de información para el manejo adaptativo de la RBM									
Interinstitutional agreement for information exchange signed	Agreement	1,00			1,00	15.000,00			81.000,00
Reports of the general situation of the Mayan Biosphere Reserve (MBR) published	Publication	3,00			5,00	30.000,00			75.000,00
Regional research projects of adaptive management finished (includes thesis)	Study	2,00			5,00	100.000,00			184.000,00
Equipment for CEMEC and other research centers purchased	Research center with equipment	1,00			2,00	118.000,00			450.000,00
Training of CONAP's staff and other agencies employeeed	People	50,00			100,00	50.000,00			100.000,00
Administración									
Management, monitoring and evaluation	Global	1,00			1,00	100.000,00	35.019,00		330.000,00
TOTAL						1.469.000,00	384.019,00		3.660.000,00
