

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1154	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/10/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/11/18
<b>Last Update</b>	03/23/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/11/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for the Institutional Strengthening of the Office of the Comptroller Gen	<b>Loan Number</b>	3593/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	RM-FIN - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	ARISI, DIEGO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COLOMBIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1154	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	14,005,181.69	46.68%	15,994,818.31
<b>Aggregated</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>14,005,181.69</b>	<b>46.68%</b>	<b>15,994,818.31</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

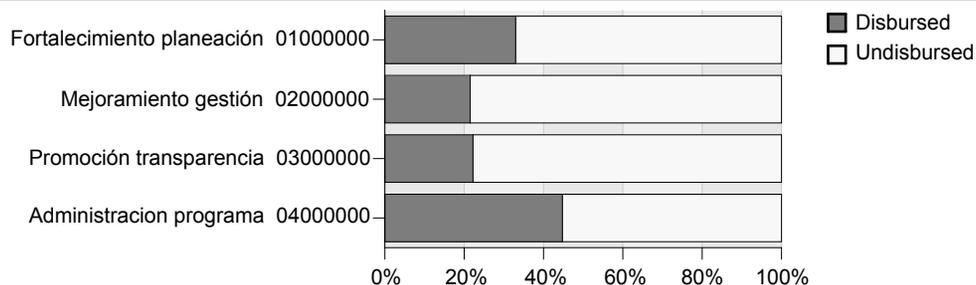

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mayor efectividad del control fiscal

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Recomendaciones de acciones de control implementadas por entidades públicas		2014	P							
				P(a)							
				A							

#### Details

**Means of verification:** Reportes unidades de control de la CGR

**Observations:** La evaluación del porcentaje de recomendaciones implementadas se realiza en el transcurso de los dos años a partir del momento en que dichas recomendaciones fueron realizadas. Línea de base: total de las recomendaciones realizadas en el 2014 por las Auditoría de Control Micro a las entidades públicas. Formula: # recomendaciones formuladas en k-2(2014).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Mejora de la calidad de las acciones de control

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
0.0	Resultados de la Auditoría Financiera	Puntaje	1.00	2015	P	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Documento SAI- PMF

**Observations:** Los resultados se evalúan en 4 dimensiones: (i) alcance de la auditoría financiera; (ii) presentación de los resultados; (iii) publicación y diseminación de sus resultados; y (iv) seguimiento de la CGR a la implementación de las observaciones y recomendaciones. Puntuación 1: (i) al menos 25% de los estados financieros recibidos son auditados; (ii) para al menos el 20% de las auditorías financieras, la opinión y/o el informe de auditoría son formalmente entregados a la autoridad correspondiente; (iii) para al menos el 50% de los informes y/u opiniones de auditoría en que el EFS tiene el derecho y la obligación de publicar, el informe y/u opinión se pone a disposición del público; y (iv) al menos uno de los siguientes criterios de seguimiento está establecido: (a) las EFS tienen su propio sistema de seguimiento interno; (b) los procedimientos de seguimiento de las EFS permiten a la entidad auditada el otorgar información sobre las medidas correctivas tomadas; (c) las EFS entregan sus inf

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
0.1	Resultados de la Auditoría de Cumplimiento	Puntaje	2.00	2015	P	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Documento SAI-PMF

**Observations:** Los resultados se evalúan en 4 dimensiones: (i) alcance de la auditoría de cumplimiento; (ii) presentación de los resultados; (iii) publicación y diseminación de sus resultados; y (iv) seguimiento de la CGR a la implementación de las observaciones y recomendaciones. Puntuación 2: indicador (i) al menos 40% de las entidades auditadas dentro del mandato de auditoría de la EFS fueron objeto de una auditoría de cumplimiento en el año bajo revisión; el (ii) para al menos el 40% de las auditorías de cumplimiento, la opinión y/o el informe de auditoría son formalmente entregados a la autoridad correspondiente, dentro del plazo legal establecido; el (iii) para al menos el 75% de los informes y/u opiniones de auditoría en que la EFS tiene el derecho y la obligación de publicar, el informe y/u opinión se pone a disposición del público a través de los medios apropiados dentro de los 60 días posteriores al momento en que se le permite publicar a la EFS; y el (iv) al menos dos de los siguientes cri

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Incremento de la eficiencia de las acciones de control

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
1.0	Productividad de la CGR	Indice	100.00	2014	P	0.00	100.00	100.00	96.20	92.40	88.90	88.90
					P(a)							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Productividad de la CGR	Indice	100.00	2014	A							
-----	-------------------------	--------	--------	------	---	--	--	--	--	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** Sistema SIIGEP

**Observations:** El índice es la relación entre el costo de una auditoría sin proyecto y el costo de una auditoría con proyecto. Se utilizará como proxy el presupuesto de funcionamiento dividido por la cantidad de auditorías anuales. En este caso tenemos una mejora de productividad mayor que 11 puntos porcentuales, o sea con el proyecto una auditoría cuesta 11,1% menos que sin programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
1.1	Cobertura de las acciones de auditoría de control micro a las entidades públicas	Porcentaje	37.70	2014	P	0.00	37.70	37.70	40.00	44.00	48.00	48.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** SICA

**Observations:** Número de entidades auditadas / N° de entidades susceptibles de ser auditadas. Nota: La baja eficiencia de las acciones de control limita la posibilidad de auditar a un mayor número de entidades. Se ha tomado a la cobertura como un proxy de eficiencia bajo el entendimiento de que se espera que cuando aumente la eficiencia también aumente la cobertura.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
1.2	Cobertura de las acciones de auditoría de control micro a las entidades públicas del sector de infraestructura	Porcentaje	20.60	2014	P	0.00	20.60	20.60	23.00	26.00	30.00	30.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** SICA

**Observations:** Número de entidades auditadas del sector infraestructura/ N° de entidades susceptibles de ser auditadas del sector infraestructura. Nota: La baja eficiencia de las acciones de control limita la posibilidad de auditar a un mayor número de entidades. Se ha tomado a la cobertura como un proxy de eficiencia bajo el entendimiento de que se espera que cuando aumente la eficiencia también aumente la cobertura.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Mayor transparencia y participación ciudadana

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.0	Respuesta a las denuncias, peticiones o quejas ciudadanas	Porcentaje	45.00	2014	P	0.00	45.00	45.00	65.00	85.00	100.00	100.00
					P(a)							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Respuesta a las denuncias, peticiones o quejas ciudadanas	Porcentaje	45.00	2014	A							
-----	---	------------	-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** Sistema SIPAR

**Observations:** Número de denuncias peticiones o quejas ciudadanas resueltas dentro los plazos establecidos por la norma/ número de denuncias peticiones o quejas ciudadanas totales. En este caso "resueltas" puede significar desde que simplemente se informe al ciudadano que su denuncia fue recibida hasta que se decida realizar una acción de control basada en dicha denuncia. El sistema actual no hace la diferenciación.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.1	Visitas mensuales a la página web de la CGR	Número	673,392.00	2014	P	0.00	673,392.00	707,062.00	742,415.00	779,535.00	818,512.00	818,512.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Google Analytics

**Observations:** En el 2014 se registraron 8.080.709, con un promedio mensual de 673,392. Se estima un incremento porcentual de un 5% anual en el número de visitas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.2	Problemas en la página Web de la CGR	Número	55.00	2015	P	0.00	55.00	50.00	40.00	25.00	10.00	10.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Tawdis aplica-da a la página WEB de la CGR

**Observations:** Herramienta Tawdis. Se analizan los sitios web a partir de criterios de accesibilidad y usabilidad. Para mayor información, ver Análisis técnico sobre el portal web de la CGR 2015. En términos comparativos, en marzo de 2015, esta misma herramienta en Brasil aplicada al portal web del órgano de control externo, registró 5 problemas y en Chile 2 problemas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.3	Advertencias en la página Web de la CGR	Número	216.00	2015	P	0.00	216.00	150.00	100.00	50.00	20.00	20.00
					P(a)							
					A							

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Herramienta Tawdis apli-cada a la página WEB de la CGR

**Observations:** Brasil en esta misma fecha registró 4 advertencias y Chile 2 en las páginas de sus contralorías.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de control

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1 Sistema Estratégico de Vigilancia y Control Fiscal de Mediano Plazo Implementado	Sistema	P	0	1	400,000	400,000
		P(a)	0	1	0	340,000
		A	0	0	0	0
1.2 Procesos misionales (4) de la CGR fortalecidos (1. Control fiscal micro, 2. Responsabilidad fiscal y gestión coactiva, 3. Control fiscal macro y 4. Enlaces clientes y partes interesadas - participación y servicio al ciudadano)	Diagnóstico y Propuesta de Aju	P	0	1	1,400,000	3,200,000
		P(a)	0	1	1,218,000	3,217,163
		A	0	0	1,286,633.77	1,608,766.22
1.3 Modelo de Gobierno de TICS de la CGR definido	Documento con el modelo	P	1	1	0	400,000
		P(a)	1	1	0	387,037
		A	1	1	312,552.93	387,036.93
1.4 Estrategia de Gestión del Cambio y del conocimiento diseñada e implementada	Documento y estrategia de gest	P	1	3	400,000	1,200,000
		P(a)	1	3	266,667	1,200,000
		A	1	1	463,081.59	685,943.07
1.5 Observatorio de Control y Vigilancia del Gasto Público implementado	Sistema	P	0	3	500,000	1,000,000
		P(a)	0	3	435,000	890,000
		A	0	0	165,793.54	165,793.54
1.6 Modelo básico de control fiscal micro con normativa internacional NIA e ISSAI fortalecido	Documento Diagnóstico y Propue	P	1	3	966,666	1,700,000
		P(a)	1	3	660,850	1,960,000
		A	1	1	778,447.47	1,267,851.82
1.7 Modelo de operación para el Control Fiscal Macro diagnosticado y fortalecido	Documento Diagnóstico y Propue	P	1	1	0	150,000
		P(a)	0	1	0	155,800
		A	0	1	0	155,799.5
1.8 Sistema de Control de Calidad de Auditorías diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	250,000	250,000
		P(a)	0	1	300,000	200,000
		A	0	0	0	0
1.9 Programas financiados por proveedores externos de apoyo financiero evaluados y con resultados presentados	Documento (Plan de Fortalecimi	P	0	1	0	200,000
		P(a)	0	1	0	200,000
		A	0	0	0	0
1.10 Desarrollo e implementación del sistema de monitoreo de las recomendaciones hechas a las entidades auditadas diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	250,000
		P(a)	0	1	0	200,000
		A	0	0	0	0

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 2 Mejoramiento de la gestión de información**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	Sistemas de Información de la CGR de soporte a procesos misionales integrados	Sistema	P	0	3	277,285	4,740,000
			P(a)	0	3	283,333	5,211,000
			A	0	0	356,783.99	1,633,054.43
2.2	Estrategia de políticas y controles para mejorar la calidad de la información y la gestión documental diseñada e implementada	Documento (Estrategias y Polit	P	0	4	350,000	2,650,000
			P(a)	0	4	0	1,533,496
			A	0	0	156,741.88	156,741.88
2.3	Modelo de inteligencia de negocios y herramientas de análisis predictivo diseñadas e implementadas	Modelo	P	0	1	1,284,000	2,350,000
			P(a)	0	1	1,052,013	2,704,033.85
			A	0	0	1,031,194.11	1,308,634.57
2.4	Tablero de control diseñado e implementado	Tablero de control	P	0	1	100,000	300,000
			P(a)	0	1	50,000	65,966.15
			A	0	0	65,966.15	65,966.15
2.5	Sistema de soporte para el control en línea diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	600,000
			P(a)	0	1	0	588,504
			A	0	0	0	0
2.6	Modelo de gestión de incidentes de la CGR diseñado e implementado	Modelo	P	0	2	0	460,000
			P(a)	0	2	0	1,015,000
			A	1	1	593,556.94	781,980.06
2.7	Plan de recuperación de desastres - DRP definido e implementado	Plan	P	1	2	1,000,000	2,500,000
			P(a)	1	2	0	2,183,000
			A	1	1	473,651.23	473,651.23
2.8	Infraestructura Tecnológica Instalada	Infraestructura Tecnológica	P	0	1	133,333	900,000
			P(a)	0	1	0	1,190,000
			A	0	0	47,212.73	740,172.64
2.9	Cursos de capacitación en los sistemas de información integrados, impartidos	Cursos	P	0	2	100,000	200,000
			P(a)	0	2	0	209,000
			A	0	0	45,878.96	56,731.02

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 3 Promoción de la transparencia y la participación ciudadana**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
3.1 Portal WEB de la CGR rediseñado e implementado	Portal	P	0	1	900,000	1,840,000
		P(a)	0	1	0	1,647,000
		A	0	0	16,602.66	245,011.27
3.2 Diagnóstico del proceso de gestión de denuncias ciudadanas	Documento (Diagnóstico)	P	1	2	350,000	800,000
		P(a)	1	2	450,000	790,000
		A	1	1	73,114.45	132,179.36
3.3 Estrategia de promoción y fomento del control fiscal participativo fortalecida	Documento (Estrategia)	P	1	3	333,333	760,000
		P(a)	1	3	133,333	730,000
		A	1	1	154,517.99	353,628.54
3.4 Estrategia de comunicaciones de la CGR revisada e implementada	Documento (Estrategia)	P	1	2	300,000	500,000
		P(a)	0	2	366,667	714,000
		A	0	1	372,577.35	573,107.79
3.5 Encuestas de percepción a sujetos de control y ciudadanía para mejorar las prácticas operativas e imagen institucional de la CGR aplicadas	Encuestas	P	2	4	0	600,000
		P(a)	0	4	0	604,000
		A	0	2	0	276,703.97
3.6 Estrategia de datos abiertos según los criterios definidos por MINTIC diseñada e implementada	Sistema	P	0	2	0	1,000,000
		P(a)	0	2	0	1,015,000
		A	0	0	0	0

**Other Cost**

Coordinación y asistencia técnica	P			290,000	750,000
	P(a)			308,038	840,000
	A			312,186.94	497,824.7
Auditorías	P			48,250	200,000
	P(a)			42,767	150,000
	A			38,387.18	38,387.18
Evaluaciones	P			0	100,000
	P(a)			0	60,000
	A			0	0

**Total Cost**

Total Cost	P			9,382,867	30,000,000
	P(a)			5,566,668	30,000,000
	A			6,744,881.86	11,604,965.87

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Desarrollo e implementación del sistema de monitoreo de las recomendaciones hechas a las entidades auditadas diseñado e implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/13/2018	03/22/2018
Output	Programas financiados por proveedores externos de apoyo financiero evaluados y con resultados presentados	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/13/2018	03/22/2018
Output	Sistema de Control de Calidad de Auditorías diseñado e implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/13/2018	03/22/2018
Output	Estrategia de políticas y controles para mejorar la calidad de la información y la gestión documental diseñada e implementada	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Modelo básico de control fiscal micro con normativa internacional NIA e ISSAI fortalecido	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Modelo de Gobierno de TICS de la CGR definido	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Modelo de operación para el Control Fiscal Macro diagnosticado y fortalecido	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Observatorio de Control y Vigilancia del Gasto Público implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Procesos misionales (4) de la CGR fortalecidos (1. Control fiscal micro, 2. Responsabilidad fiscal y gestión coactiva, 3. Control fiscal macro y 4. Enlaces clientes y partes interesadas - participación y servicio al ciudadano)	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Sistema Estratégico de Vigilancia y Control Fiscal de Mediano Plazo Implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Sistemas de Información de la CGR de soporte a procesos misionales integrados	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Cursos de capacitación en los sistemas de información integrados, impartidos	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Encuestas de percepción a sujetos de control y ciudadanía para mejorar las prácticas operativas e imagen institucional de la CGR aplicadas	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Estrategia de comunicaciones de la CGR revisada e implementada	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Estrategia de datos abiertos según los criterios definidos por MINTIC diseñada e implementada	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Estrategia de promoción y fomento del control fiscal participativo fortalecida	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Infraestructura Tecnológica Instalada	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Modelo de gestión de incidentes de la CGR diseñado e implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Modelo de inteligencia de negocios y herramientas de análisis predictivo diseñadas e implementadas	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Plan de recuperación de desastres - DRP definido e implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Portal WEB de la CGR rediseñado e implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Sistema de soporte para el control en línea diseñado e implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
Output	Tablero de control diseñado e implementado	Modify Output	Se ajusta el valor de la proyección de la meta financiera según la información reportada por el ejecutor.	03/21/2018	03/22/2018
