

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1064	Chief of Operations Validation Date	04/10/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/24/17
Last Update	04/10/17	Country Representative Validation Date	04/25/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Productive Development Program	Loan Number	2595/OC-UR, 2595/OC-UR-1
Executing Agency	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA	Sector/Subsector	AG-DEV - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Team Leader	HINTZE,LUIS HERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1064	28,400,000	28,400,000	4,900,000	0	33,300,000	28,400,000	20,323,359.04	71.56%	8,076,640.96
Aggregated	28,400,000	28,400,000	4,900,000	0	33,300,000	28,400,000	20,323,359.04	71.56%	8,076,640.96

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

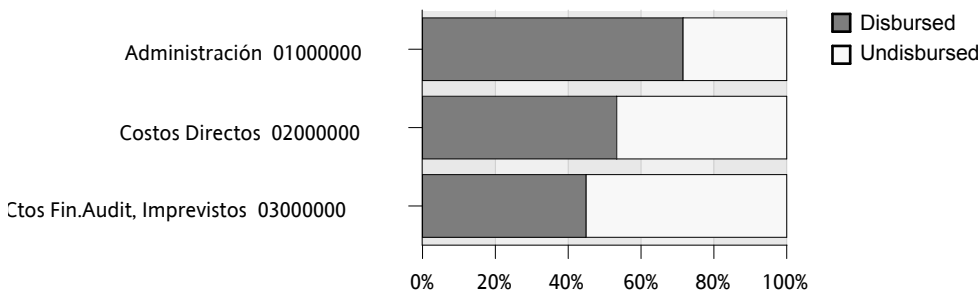

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de los ingresos agropecuarios promedio por hectárea de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	porcentaje	0.0	2012	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	

Details

Means of verification: Fuente: punto de partida ingreso por productor familiar anual U\$S 3.300 (Fuente WB 2010)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incremento de productividad de rubros representativos en planes de gestión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	%	0.0	2012	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	
Details						
Means of verification: Medio de verificación: encuestas de hogares agropecuarios del Programa.						
Observations: Indicadores de productividad: Ganadería:xxxks de carne equivalente por Há; Lechería:xxxLts por Há por año; Horticultura: xxx Ks producto por há						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: Capacidad de Gestión y Planeación de recursos mejorada

Observation: Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.1	Número de proyectos de inversión gestionados por mesas de desarrollo rural del ámbito del Programa	Número	0.0	2011	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	
Details						
Means of verification: Libro de acta de Mesas de Desarrollo Rural						
Observations: Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Apoyos productivos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Planes de gestión con tecnologías	Planes de gestión	P	30	400	5,159,700	26,460,366
			P(a)	60	642	6,000,000	20,530,224
			A	75	602	1,673,471	10,300,914
1.2	Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Proyectos	P	15	30	320,000	1,600,000
			P(a)	0	69	600,000	2,800,000
			A	34	68	438,981	1,276,037

Component Nbr. 2 Componente II. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Plan de capacitación para DGDR y otras organizaciones rurales completado	Planes de capacitación	P		1	122,696	1,226,960
			P(a)		1	20,000	185,455
			A		1	37,283.1	145,455
2.2	Sistema de interconexión de Mesas de Desarrollo Rural instalado	Sistema	P		1	208,226	832,904
			P(a)	1	1	50,000	600,000
			A	0	0	0	0
2.3	Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Planes de Fortalecimiento Institucional	P	5	40	116,542	1,090,559
			P(a)		244	300,000	6,954,171
			A	27	184	986,085.54	3,994,171
2.4	Seguimiento y Evaluación	Sistema de Seguimiento y Ev.	P		1	220,000	770,000
			P(a)		1	60,000	650,150
			A		1	102,680.36	490,150

Other Cost

	Administración del Programa	P			245,000	1,090,000
		P(a)			145,000	1,460,000
		A			142,979	913,866
	Auditorías y Evaluación Intermedia	P			50,000	230,000
		P(a)			30,000	120,000
		A			19,676.55	53,928

Total Cost

	Total Cost	P			6,442,164	33,300,789
		P(a)			7,205,000	33,300,000
		A			3,401,156.55	17,174,521

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Plan de capacitación para DGDR y otras organizaciones rurales completado	Modify Output	El ajuste responde a la re planificación presentada por el Ejecutor	03/09/2017	03/06/2017
Output	Planes de gestión con tecnologías	Modify Output	El ajuste responde a la re planificación presentada por el Ejecutor	03/09/2017	03/06/2017
Output	Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Modify Output	El ajuste responde a la re planificación presentada por el Ejecutor	03/09/2017	03/06/2017
Output	Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Modify Output	Ante la buena respuesta a las convocatorias para proyectos de investigación, y considerando que estos proyectos tienen beneficios potenciales que pueden ser difundidos más allá de la ejecución y beneficiarios directos del programa, el Ejecutor, en acuerdo con el Banco, decidió realizar un llamado adicional a este tipo de proyectos, por lo que se amplió la meta y los recursos destinados a ella.	03/09/2017	03/06/2017
Output	Seguimiento y Evaluación	Modify Output	El ajuste responde a la re planificación presentada por el Ejecutor	03/09/2017	03/06/2017
Output	Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Modify Output	El ajuste responde a la re planificación presentada por el Ejecutor	03/09/2017	03/06/2017
Output	Planes de gestión con tecnologías	Modify Output	El número de planes de gestión depende de la demanda de los grupos de productores ante las convocatorias realizadas por el Programa. Al haberse realizado la gran mayoría de convocatorias previstas, se tiene un mejor estimado del número de planes que se podrá alcanzar al final de la operación. La meta al final del programa sigue estando muy por encima de la meta original.	03/09/2017	03/06/2017
Output	Sistema de interconexión de Mesas de Desarrollo Rural instalado	Modify Output	El ajuste responde a la re planificación presentada por el Ejecutor	03/09/2017	03/06/2017
Output	Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Modify Output	El ajuste responde a la re planificación presentada por el Ejecutor	03/09/2017	03/06/2017
