

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1097	Chief of Operations Validation Date	03/31/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/25/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	04/26/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Protection and Recovery of Cultural Heritage Assets program	Loan Number	2678/OC-EC
Executing Agency	Ministerio Coordinador de Patrimonio	Sector/Subsector	DU-HER - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	LOPEZ-LAMIA,ALEJANDRO J.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1097	37,840,000	18,360,837.84	2,160,000	0	40,000,000	18,360,837.84	18,360,837.84	100.00%	0
Aggregated	37,840,000	18,360,837.84	2,160,000	0	40,000,000	18,360,837.84	18,360,837.84	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

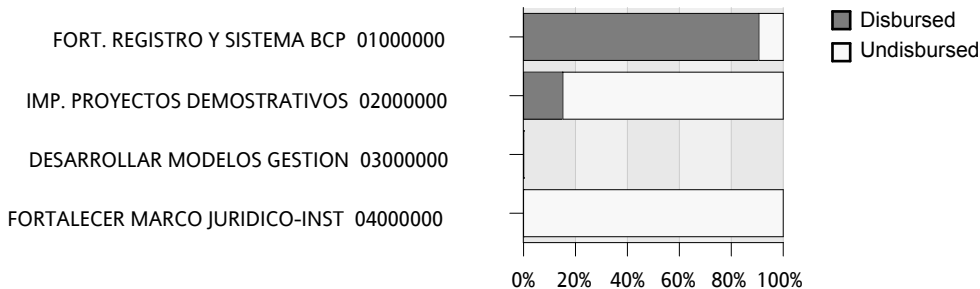

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Impulsar el desarrollo de las economías locales mediante la revitalización social, cultural y económica de los BCP y posicionar el País como referente de conocimiento en la gestión patrimonial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2018
1.1	Matriz de producción y contribución económica a las localidades intervenidas	Moneda	0.0	2012	P	1.00	1.00
					P(a)	1.00	1.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de Evaluación de Impacto

Observations: Requiere el levantamiento de una línea de base. Existen datos duros disponibles (CENSO económico). Meta al final de programa por definir.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2018
1.2	Análisis de incorporación y uso de los BCP (Bienes Culturales Patrimoniales).	Porcentaje	0.0	2012	P	1.00	1.00
					P(a)	1.00	1.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de Evaluación de Impacto.

Observations: Requiere el levantamiento de una línea de base. Existen datos duros en el sistema (ABACO). Pendiente definición de meta y unidad de medida.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2018
1.3	Posicionamiento del Ecuador en relación al gestión del conocimiento y gestión patrimonial	Ubicación en listado	0.0	2012	P		1.00
					P(a)		1.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de Evaluación de Impacto.

Observations: Se requiere la definición de los grupos de interés y el levantamiento de la línea de base. Meta a ser medida un año después de finalizado el proyecto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2018
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	Publicaciones indexadas especializadas a nivel internacional	Publicaciones	0.0	2011	P		2.00
					P(a)		2.00
					A		
Details							
Means of verification: Copias de publicaciones en archivos del Programa.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Conocimiento sobre BCP incrementado y sistematizado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Porcentaje de BCP registrados en el SNBCP.	Porcentaje	2.7	2011	P			4.00				10.00
					P(a)				4.00			10.00
					A							

Details

Means of verification: Reportes del SNBCP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.2	Consultas realizadas al SNBCP al año.	Consultas	90000.0	2011	P	100,000.00	140,000.00	180,000.00	220,000.00	270,000.00		270,000.00
					P(a)	100,000.00	140,000.00		150,000.00	270,000.00		270,000.00
					A							

Details

Means of verification: Reportes del SNBCP

Observations: Este indicador se utilizará como proxy para estimar la utilización efectiva del sistema por funcionarios públicos y público en general. En la actualidad, se ha estimado un promedio de 90 mil consultas anuales, las cuales se utilizará como línea de base. L

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Valorización de los BCP de los proyectos demostrativos y las intervenciones emergentes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.1	Inversiones conexas realizadas en Zaruma, Santa Elena y Pastaza-Puyo.	US\$	0.0	2010	P			1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00
					P(a)				1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00
					A							

Details

Means of verification: MCP. Municipios de Zaruma, Santa Elena y Puyo

Observations: Antes de realizar cada proyecto demostrativo, se levantará una línea de base de con la totalidad de los BCP en el área de intervención a través del SNBCP. Ésta línea de base servirá para comparar si debido a las intervenciones realizadas se registran nuev

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year							
2.2	% de mujeres que participaron en actividades vinculadas a la rehabilitación de bienes culturales	Porcentaje	0.0	2011	P						25.00
					P(a)				25.00		25.00
					A						
Details											
Means of verification: Informes de evaluación y de impacto											
Observations: Indicador incorporado a pedido de FMM											
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity				No			

Outcome Nbr. 3: Modelos de gestión incorporados en los lineamientos de política del sector

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
3.1	Modelos de gestión diseñados en base a mejores prácticas y aprobados	Modelos	0.0	2011	P					2.00		2.00
					P(a)					2.00		2.00
					A							
Details												
Means of verification: Resolución de aprobación del Ministerio de Cultura y Patrimonio												
Observations: Estos modelos serán desarrollados por el programa en base al aprendizaje obtenido en los proyectos demostrativos y en las intervenciones emergentes, así como del PEPC. Dichos modelos deberán parametrizar los potenciales costos-beneficios de los proyectos,												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				

Outcome Nbr. 4: Capacidad del MCP para ejercer sus funciones de manera efectiva aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.1	Proyecto de Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP actualizada y presentada a la Presidencia de la República para ser remitida a la Asamblea Nacional.	Proyecto de Ley	0.0	2011	P			1.00				1.00
					P(a)				1.00		1.00	
					A							
Details												
Means of verification: Oficio de presentación del Proyecto d Ley a la Presidencia de la República.												
Observations: Existe una iniciativa legal que debe ser actualizada y estructurada en un proyecto de Ley. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional es tomada como proxy dado que la misma depende, en gran medida, del grado de éxito que el MCP tenga en la elaboració												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.2	Reglamento de coordinación inter-institucional sobre el patrimonio cultural aprobado	Reglamento	0.0	2011	P					1.00		1.00
					P(a)					1.00		1.00
					A							

Details

Means of verification: Resolución del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Observations: Su aprobación por parte del Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural es tomada como proxy dado que la misma depende, en gran medida, del grado de éxito que el MCyP tenga en la preparación y promoción del reglamento.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 C1. FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS BCP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	P1. Registros de BCP, ingresados y validados en el Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales	BCP	P	70,000	219,000	1,767,990	9,620,000
			P(a)	3,000	102,000	62,294.59	636,571.37
			A	3,000	15,000	20,294.28	597,270
1.2	P2. Software desarrollado y adquirido.	Software	P		5		540,840
			P(a)		3		150,000
			A	1	1		0
1.3	P3. Equipos para geo-referenciación y contingencia adquiridos	Equipos	P		2		426,000
			P(a)		2		330,000
			A		1	20,112	50,112
1.4	P4. Atlas de los BCP y mapa patrimonial del Ecuador, desarrollado	Atlas	P		1		100,000
			P(a)	1	1		0
			A	1	1	20,112	20,112
1.5	P5. Capacitación de profesionales para tareas de registro y sistematización de los BPC, implementada.	Personas	P	90	450	60,000	300,000
			P(a)	131	131		54,000
			A	131	131	14,872	14,872

Component Nbr. 2 C2. IMPLEMENTACION PROYECTOS DEMOSTRATIVOS E INTERVENCIONES EMERGENTES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	P6. Estudios de definición de políticas de gestión por ámbito de BCP, realizados	Estudios	P		5		200,000
			P(a)		5		743,607.02
			A		0		36,850
2.2	P7. Estudios de sostenibilidad para el sistema integral de BCP en las intervenciones demostrativas	Estudios	P		3		1,000,000
			P(a)	1	2	47,330.36	568,292.36
			A	1	2	30,109.42	551,071.42
2.3	P8. Proyectos Demostrativos de BCP ejecutados.	Proyectos	P	6	25	3,210,000	17,520,000
			P(a)	1	1	401,527.49	1,520,855.5
			A	0	0	288,762.36	1,312,820.12
2.4	P9. Proyectos Emergentes de BCP Ejecutados.	Proyectos	P		5		4,953,160
			P(a)	7	15	5,732,426.46	10,289,633.88
			A	4	4	1,630,373.11	3,151,194.84

Component Nbr. 3 C3. DESARROLLO DE MODELOS DE GESTION SUSTENTABLES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	P10. Modelos de gestión diseñados y validados por el MCP.	Modelos	P	2	4	150,000	300,000
			P(a)		5		0
			A		0		0
3.2	P11. Entidades capacitadas en aspectos técnicos institucionales (Plan de transferencia realizado).	Entidades	P		15		500,000
			P(a)		7		533,273.46
			A		0		0
3.3	P12. Plan Estratégico de comunicación elaborado e implementado.	Plan	P	1	1	550,000	600,000
			P(a)		1		50,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 C4. FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL DE LOS BCP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1	P13. Propuesta de actualizacion de la Ley sobre tráfico ilícito, acciones legales y repatriación de BCP, elaborada	Propuesta	P	1	1	25,000	50,000
			P(a)		0		0
			A	1	1	40,224	40,224
4.2	P14. Mejoras al Sistema Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales - SNBCP implementado	Sistema	P	10	10	350,000	350,000
			P(a)	1	1	152,727.27	223,200
			A	1	1		0
4.3	P15. Unidad de gestión del conocimiento en el Ministerio de Coordinacion del Patrimonio - MCP establecida	Unidad de Gestion	P		1		300,000
			P(a)		0		40,000
			A		0		0
4.4	P16. Intercambios para buenas practicas de los BCP con instituciones internacionales afines realizados	Intercambios	P		5		350,000
			P(a)		2		15,000
			A		2		4,773.3

Other Cost

	Administracion del programa	P			586,000	2,590,000
		P(a)			800,216.6	2,350,807.82
		A			542,053.74	1,814,043.97
	Auditorias Financieras	P			40,000	200,000
		P(a)			15,307	76,547.14
		A			0	45,150
	Evaluacion Intermedia y Final	P				100,000
		P(a)				40,000
		A				0
	Fiscalización	P				0
		P(a)			42,276	88,942.59
		A			33,179.11	79,845.79

Total Cost

	Total Cost	P			6,738,990	40,000,000
		P(a)			7,254,105.77	17,710,731.14
		A			2,640,092.02	7,718,339.44

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
