

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1130	Chief of Operations Validation Date	04/19/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/20/17
Last Update	04/10/17	Country Representative Validation Date	04/23/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Lending Program for Productive Development in the Province of San Juan	Loan Number	2763/OC-AR, 2763/OC-AR-1, 2763/OC-AR-2
Executing Agency	Agencia San Juan De Desarrollo de Inversiones	Sector/Subsector	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	DEMICHÉLIS,JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE SAN JUAN		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1130	60,000,000	60,000,000	20,000,000	0	80,000,000	60,000,000	30,250,724.74	50.42%	29,749,275.26
Aggregated	60,000,000	60,000,000	20,000,000	0	80,000,000	60,000,000	30,250,724.74	50.42%	29,749,275.26

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

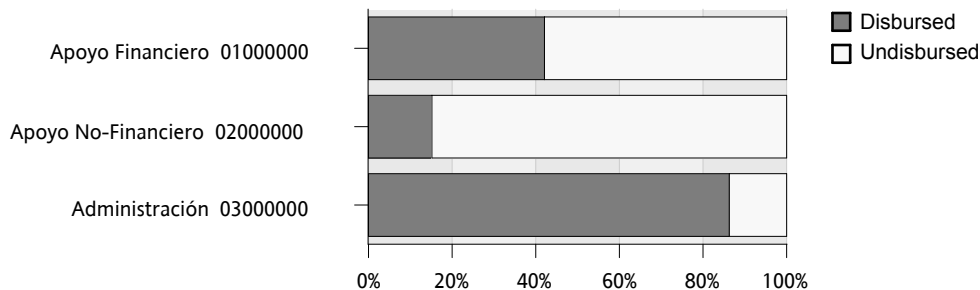

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir a sostener el crecimiento económico de la Provincia

Observation: Se propone como meta un valor menor al de línea de base, dado que la diferencia de 5 puntos en línea de base corresponde a una coyuntura óptima del momento actual. El objetivo del indicador de impacto es validar que el crecimiento de la provincia se mante

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.0	Diferencia en el cambio porcentual del PGB de San Juan y el del PIB nacional	Puntos Porcentuales	5.0	2014	P	
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incremento de la productividad de las PYMES del sector privado productivo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	Diferencia en el cambio porcentual de las ventas entre las MiPymes financiadas por el programa y el grupo de control. [(V1 ^t - V0 ^t) / V0 ^t] - [(V1 ^c - V0 ^c) / V0 ^c]	Porcentaje	0.0	2012	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

Details

Means of verification: Fuente de información: ASJDI en base a encuesta (ver plan de monitoreo y evaluación).

Observations: La medición se basa en el supuesto de que los grupos de tratamiento y control son similares o iguales en términos de nivel de ventas al inicio de la intervención.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.2	Diferencia en la variación del valor de las exportaciones entre las MiPymes financiadas por el programa y el grupo de control. [(E1 ^t - E0 ^t) / E0 ^t] - [(E1 ^c - E0 ^c) / E0 ^c]	Porcentaje	0.0	2012	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

Details

Means of verification: Fuente de información: ASJDI en base a encuesta (ver plan de monitoreo y evaluación).

Observations: La medición se basa en el supuesto de que los grupos de tratamiento y control son similares o iguales en términos de nivel de exportaciones al inicio de la intervención

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.3	Diferencia en la tasa de supervivencia de las MiPymes financiadas por el programa y la del grupo de control. [(S1 ^t - S0 ^t) / S0 ^t] - [(S1 ^c - S0 ^c) / S0 ^c]	Porcentaje	0.0	2012	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

Details

Means of verification: Fuente de información: ASJDI en base a encuesta (ver plan de monitoreo y evaluación).

Observations: El número de empresas tratadas y no tratadas es el mismo en el momento cero.

La medición se basa en el supuesto de que los grupos de tratamiento y control son similares o iguales en términos de nivel de supervivencia al inicio de la intervención.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.4	Diferencia en el cambio porcentual de la	Porcentaje	0.0	2012	P		10.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	productividad del trabajo entre las MiPymes financiadas por el programa y las del grupo de control. [(Wp1^t - Wp0^t) / Wp0^t] - [(Wp1^c - Wp0^c) / Wp0^c]	Porcentaje	0.0	2012	P(a)		10.00
					A		
Details							
Means of verification: Fuente de información: ASJDI en base a encuesta (ver plan de monitoreo y evaluación)							
Observations: La medición se basa en el supuesto de que los grupos de tratamiento y control son similares o iguales en términos de productividad del trabajo al inicio de la intervención.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: APOYO FINANCIERO AL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO PRODUCTIVO

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Créditos otorgados a empresas participantes del Programa	Número de créditos	P	100	450	14,190,000	61,000,000
			P(a)	120	674	11,200,000	52,000,000
			A	181	514	13,150,404	34,973,555

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2: APOYO NO FINANCIERO AL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO PRODUCTIVO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Planes de mejora competitiva validados	Número de PMCs	P		6	258,000	757,000
			P(a)		6	52,455	559,684
			A		6	7,511	45,826
2.2	Planes de Mejora Competitiva del San Juan I actualizados y validados	Número de PMCs	P		11	336,000	828,000
			P(a)		13		375,000
			A		13	9,919	35,270
2.3	Proyectos estructuradores ejecutados	Número de proyectos	P	6	21	3,543,000	10,678,000
			P(a)	4	21	800,000	10,075,000
			A	3	5	426,085	1,449,690
2.4	Empresas que recibieron asistencia técnica (PMCEs)	Micro / small / medium enterprises (#)	P	95	365	600,000	2,896,000
			P(a)	85	303	120,000	2,815,868
			A	75	173	155,296	278,654
2.5	Banco de proyectos de inversión creado y en funcionamiento	Banco de proyectos	P		1	69,000	347,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Eventos donde se promueven inversiones en la Provincia	Número de eventos	P	8	30	131,733	494,000
			P(a)		22		0
			A		21		0
2.7	Atracción de Inversiones - Estrategia de atracción de inversiones Diseñada	Estrategia Diseñada	P		0		0
			P(a)		1	104,180	841,000
			A		0	9,954	9,954
2.8	Gestion del Componente II	Componente 2	P		0		0
			P(a)		0	231,533	1,333,448
			A		0	206,009	684,133
2.9	Cantidad de Incentivos otorgados p/utilizar Línea de Crédito	Número de incentivos	P		0		0
			P(a)	10	15	87,234	2,816,000
			A	5	5	41,068	41,068
2.10	Nuevas herramientas diseñadas	Número de herramientas diseñadas	P		0		0
			P(a)	2	3	3,846,184	3,414,535
			A	1	1	10,132	10,132
2.11	Documentos de Negocios Elaborados	Número de Documentos de Negocios	P		0		0
			P(a)	8	21	157,103	578,000
			A	13	13	96,584	96,584
2.12	Gestión Financiera del Riesgo Diseñada	Gestion Diseñada	P		0		0
			P(a)		1	10,500	1,130,465
			A		0	0	0
2.13	Gestión de Componente I	Componente 1	P		0		0
			P(a)		0	313,822	1,061,000
			A		0	266,782	266,782

Other Cost

	ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION	P			697,000	3,000,000
		P(a)			1,149,745	3,000,000
		A			499,348	2,062,121

Total Cost

	Total Cost	P			19,824,733	80,000,000
		P(a)			18,072,756	80,000,000
		A			14,879,092	39,953,769

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
