

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1243	Chief of Operations Validation Date	10/21/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	DEVELOPMENT PROGRAM FOR METROPOLITAN AREAS OUTSIDE THE CAPITAL II	Loan Number	3780/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES
Team Leader	SOULIER FAURE, MARTIN NICOLAS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1243	80,000,000	80,000,000	20,000,000	0	100,000,000	80,000,000	2,982,794	3.73%	77,017,206
Aggregated	80,000,000	80,000,000	20,000,000	0	100,000,000	80,000,000	2,982,794	3.73%	77,017,206

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

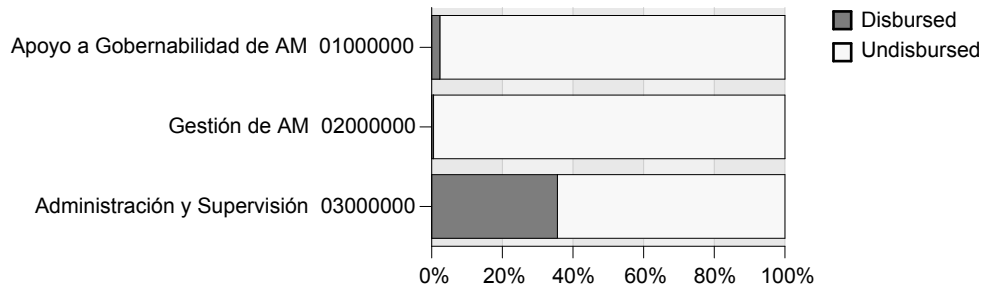

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Generar un entendimiento de los problemas que enfrentan las metrópolis y fomentar acuerdos de priorización de intervenciones que requieren coordinación entre autoridades municipales y provinciales de un área metropolitana

Observation: Las agendas capturan el acuerdo político y líneas prioritarias de trabajo coordinado entre las autoridades que componen las AM. Las 21 AM de Argentina tienen 135 municipios

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Proporción de intendentes en AM del país que suscriben una Agenda Metropolitana de prioridades de intervención en infraestructura y servicios públicos en el AM que involucra al municipio bajo su jurisdicción.	%	14.80	2016	P	50.40
					P(a)	50.40
					A	

Details

Means of verification: Aprobación y publicación de agendas metropolitanas de las AM verificado a través de informes semestral y evaluación.

Observations: Las agendas capturan el acuerdo político y líneas prioritarias de trabajo coordinado entre las autoridades que componen las AM. Las 21 AM de Argentina tienen 135 municipios. El valor de línea de base muestra que, hasta el año 2016, 20 intendentes de los 135 municipios habían suscripto una Agenda Metropolitana.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Proporción de municipios en AM del país que envían personal a participar de las distintas instancias de reunión y capacitación del Programa.	%	14.80	2016	P	62.20
					P(a)	62.20
					A	

Details

Means of verification: Informes semestrales y evaluación en base a asistencia a capacitación y reuniones

Observations: Captura la proporción de municipios que participaron de las actividades del Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.2	Visitas anuales al nuevo Portal web del programa DAMI sobre temas de gestión metropolitana.	Nro de visitas anuales al portal	360.00	2018	P	1,000.00
					P(a)	1,000.00
					A	

Details

Means of verification: Registro a través de sistema analítico del portal web reportado en informe semestral.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Contribuir a la creación de las instituciones necesarias para la provisión de servicios e infraestructuras en áreas metropolitanas que incluyen dos o más jurisdicciones territoriales.

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2021	EOP 2021
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
1.0	Número total de entidades metropolitanas que proveen servicios e infraestructuras metropolitanas involucrando dos o más jurisdicciones	Entidades metropolitanas	14.00	2016	P		17.00
					P(a)		17.00
					A		

Details

Means of verification: Actas de conformación de la entidad metropolitana.

Observations: Línea de base corresponde a entidades metropolitanas existentes en las AM de Argentina

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	Nuevos actos normativos subnacionales que formalizan la gestión metropolitana involucrando a dos o más jurisdicciones participantes del Programa.	nro de actos normativos	0.00	2016	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	

Details

Means of verification: Informe semestral en base a relevamientos de política del MDTyH y las unidades provinciales

Observations: Se define como acto normativo decretos, ordenanzas, leyes o de naturaleza similar

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Financiar inversiones en infraestructura urbana y equipos que apoyen la mejora de los servicios y la infraestructura pública en áreas metropolitanas que requieren de la concurrencia de dos o más jurisdicciones territoriales.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.0	Índice de uso promedio de las inversiones en infraestructura financiadas por el Programa.	Índice	100.00	2017	P	110.00
					P(a)	110.00
					A	

Details

Means of verification: Informes de uso de las infraestructuras financiadas por el Programa antes y después del programa.

Observations: El indicador tomará el promedio de los índices de uso para cada inversión en infraestructura financiada por el Programa. Se tomará como valor de línea de base el uso de la infraestructura financiada en su situación pre-Programa. Para el proyecto de semaforización inteligente del AM Mendoza se considerará el uso del transporte público en el tramo del carril Tomás Godoy Cruz de Guaymallén, donde se instalarán semáforos, que se beneficiará de mejor circulación. El proyecto de recuperación y refuncionalización del Arbolado Público Urbano del AM de Mendoza no se incluirá en este indicador

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2021	EOP 2021
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
3.2	Índice de estado de salud del Arbolado Público Urbano en el Área metropolitana de Mendoza.	Indice	100.00	2017	P		130.00
					P(a)		130.00
					A		
Details							
Means of verification: Sitio online del estado de arbolado. Actas de la Mesa del arbolado.							
Observations: Cálculo de la información de base de acuerdo a promedio simple de atributo de estado de ejemplar relevado en censo de arbolado, siendo: 4=bueno; 3= enfermo; 2=decrepito; y 1=muerto.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la Gobernabilidad de Áreas Metropolitanas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Diagnósticos de identificación de problemas metropolitanos realizados.	Documen tos de diagnóstico	P	0	4	50,000	289,000
			P(a)	0	4	50,000	289,000
			A	0	2	0	39,000
1.2	Talleres sobre temas metropolitanos para funcionarios técnicos y actores de la sociedad civil realizados.	talleres	P	1	10	33,000	400,000
			P(a)	1	10	33,000	400,000
			A	0	7	0	67,000
1.3	Seminarios internacionales sobre temas metropolitanos realizados.	seminarios	P		1		84,000
			P(a)		1		84,000
			A		1		84,000
1.4	Actualizaciones al portal WEB del programa DAMI sobre temas metropolitanos realizadas.	portal	P	1	1	0	50,000
			P(a)	1	1	0	50,000
			A	1	1	0	0

Component Nbr. 2 Gestión de Áreas Metropolitanas - Fortalecimiento Institucional de las AM

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Proyectos de desarrollo institucional formulados.	proyectos	P	2	7	50,000	418,000
			P(a)	2	7	50,000	418,000
			A	0	0	5,000	73,000
2.2	Lineamientos estratégicos metropolitanos integrales formulados.	estudios	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0
2.3	Planes metropolitanos sectoriales formulados.	planes	P	0	19	50,000	950,000
			P(a)	0	19	50,000	950,000
			A	0	0	0	360,000
2.4	Estudios de preinversión para inversiones metropolitanas no financiadas con DAMI-II.	estudios	P	0	3	100,000	1,800,000
			P(a)	0	3	100,000	1,800,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Gestión de Áreas Metropolitanas - Inversiones en áreas metropolitanas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	AM Mendoza – Centro de Gestión de semaforización	Centro en funcionamiento	P	0	1	900,000	2,250,000
			P(a)	0	1	900,000	2,250,000
			A	0	0	0	0
3.2	AM Mendoza: Ciclovías en el área metropolitana de Mendoza construidas	kilómetro	P	0	81	0	5,740,000
			P(a)	0	81	0	5,740,000
			A	0	0	0	0
3.3	AM Mendoza: Censo arbolado finalizado y en línea	Plataforma accesible	P	0	1	94,500	1,000,000
			P(a)	0	1	94,500	1,000,000
			A	0	0	0	0
3.4	AM Rosario: Refuncionalización Predio Paganini	Centro Paganini reformado	P	0	1	700,000	5,500,000
			P(a)	0	1	700,000	5,500,000
			A	0	0	79,000	79,000
3.5	AMBA: Centros de Atención Primaria de la Salud refaccionados y equipados	nro CAPs refaccionados	P	15	50	5,000,000	12,000,000
			P(a)	15	50	5,000,000	12,000,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración y gestión	P			750,000	3,875,000
		P(a)			750,000	3,875,000
		A			145,000	1,191,000

Total Cost

	Total Cost	P			8,467,500	40,446,000
		P(a)			8,467,500	35,446,000
		A			229,000	1,893,000

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
