


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1289	Chief of Operations Validation Date	04/17/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/18/22
Last Update	03/24/22	Country Representative Validation Date	04/19/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	The Acre Sustainable Development Program (PDSA-II)	Loan Number	2928/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO	Sector/Subsector	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-FOREST RESOURCES MANAGEMENT
Team Leader	DAMIANI MARTI, OCTAVIO JORGE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DE ACRE		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O desempenho parcialmente insatisfatório se justifica pois não se logrou desenvolver o Plano de Regularização Fundiária da Gleba Afluente e o Plano de Manejo da Floresta Estadual do Jurupari, devido a não conclusão da doação das áreas da Unidade de Conservação. O não desenvolvimento dos planos afetará a regularização de 149 lotes identificados, impactando a situação de regularidade de moradia e subsistência das famílias, algumas em situação de vulnerabilidade. Considerando o prazo de encerramento do Programa previsto para novembro de 2021, será necessário que o Executor desenvolva e inicie a implementação de um Plano de Ação corretivo para viabilizar a conclusão das atividades, mesmo após o encerramento do prazo regular do Programa.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1289	72,000,000	72,000,000	27,112,711	0	99,112,711	72,000,000	66,977,739.6	93.02%	5,022,260.4
Aggregated	72,000,000	72,000,000	27,112,711	0	99,112,711	72,000,000	66,977,739.6	93.02%	5,022,260.4
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

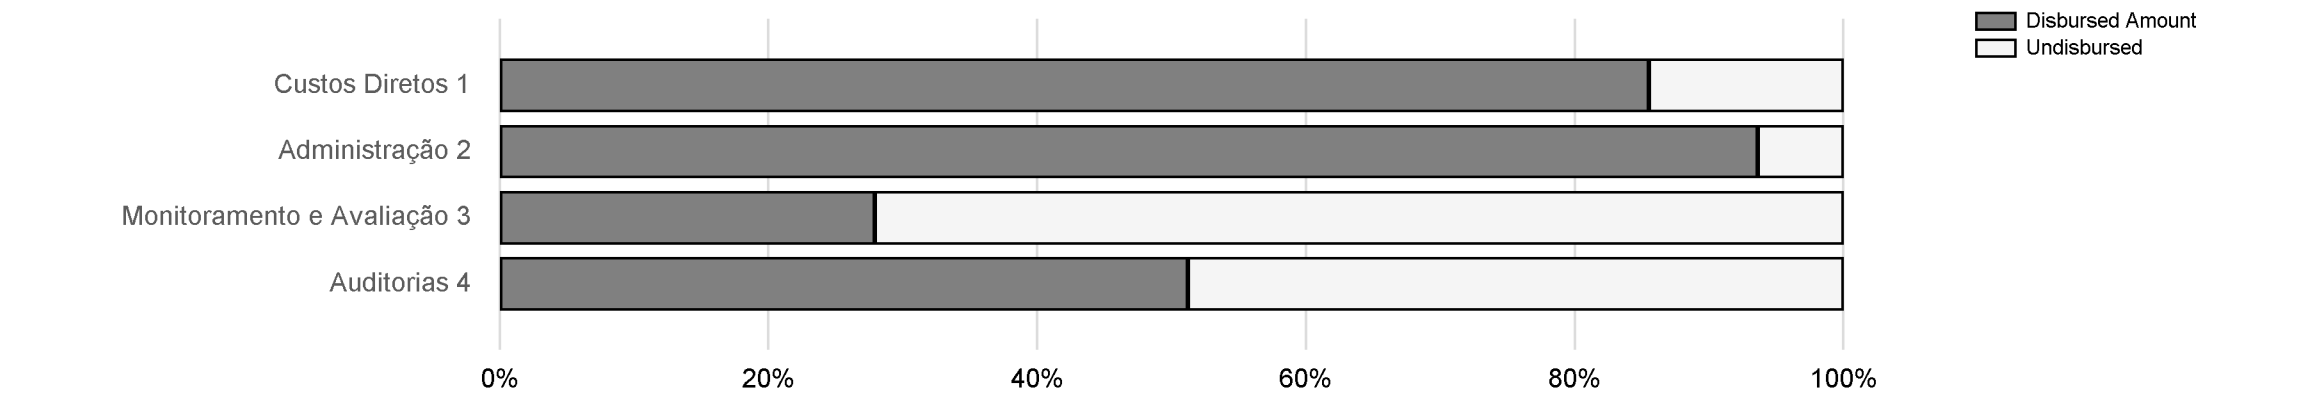

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Aumentar a contribuição do setor florestal para o crescimento econômico;							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
1.1	A diferença marginal no produto regional bruto a partir do cenário de referência (sem o programa) em comparação com os cenários alternativos (com o programa)	milhoes de reais	182	2012	2013	P	6
						A	-
Details							

Means of Verification: Um micro modelo para análise de impacto sector florestal;

Observations: Fonte: Um conjunto de estudos (ano 1 e ano 5) para atualizar a Matriz Social (SAM), que deve ter, pelo menos, os seguintes componentes: (i) setor florestal, (ii) atividades, (iii) renda familiar household e (iv) governo. Para uma descrição completa da met

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

General Development Objectives Nbr. 2: Melhorar o bem estar das comunidades tradicionais e pequenos produtores agrícolas;

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
2.1	Indicador: A diferença entre a renda familiar dos beneficiários e não beneficiários, medida em percentagem;	%	0	2012	2013	P	12
						A	28
Details							

Means of Verification: Pesquisas para o controle e famílias atendidos no ano 1 e 5 do projeto.

Observations: Fonte: No Estado do Acre a média da renda familiar rural é de R\$ 10.755 (IBGE, 2006) dos quais R\$ 6.000 a R\$ 7.000 são provenientes da agricultura e produção florestal;

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

General Development Objectives Nbr. 3: Manter o desmatamento sob controle

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
3.1	Taxa de desmatamento (%)	%	0.17	2012	2013	P	.17
						A	.27
Details							

Means of Verification: Avaliação anual do uso da terra modificada feita pela FUNTAC e INPE. A metodologia para a avaliação do uso da terra está disponível aqui INPE (2006);

Observations: 1) O Estado do Acre reduziu a taxa de desmatamento anual nos últimos 10 anos a partir de 0,50% a 0,17%, (2) A linha de base é o valor médio de quatro anos de medições desmatamento, 0,17%; (3) Espera-se ter + / - 10% na linha de base - intervalo de confian

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultados 1: Expansão e consolidação de áreas protegidas e florestais comunitárias para uso sustentável

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
1.1	R1.1 - Hectares de Florestas Públicas Estaduais prontos para serem leiloados para o setor privado (garantia de longo prazo para o suprimento de madeira);	Mil Ha	0	2012	P	-	-	-	240
					A	-	-	-	238.61

Details

Means of Verification: Controle gerencial UGP e "Anúncio das áreas de concessão florestal" (Edital) e "Convite para Manifestação de Interesse publicado no D.O.E

Observations: (1) Pronto para = produção em plena conformidade com a Lei Federal 11.284/2006, (2) O setor da construção é o principal consumidor para a demanda por produtos florestais.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
1.2	R1.2 - Receitas das Concessões Florestais oriunda das Florestas Públicas Estaduais do Estado do Acre (R\$ milhões);	R\$ milhões	0	2012	P	-	-	-	405
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Controle gerencial UGP e "Contrato de Concessão Florestal" publicado no D.O.E.;

Observations: (1) O Estado do Acre é um investidor pequeno na indústria madeireira nativa na Amazônia. O Acre tem 25 empresas madeireiras e produz US\$ 100 milhões em produtos florestais por ano, (2) A Amazônia brasileira possui cerca de 2.500 empresas madeireiras e pro

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
1.3	R1.3 - Hectares de manejo florestal dos pequenos agricultores de Comunidades Tradicionais com PMFS e POAs aprovados e liberados para a produção florestal sustentável.	Ha	25000	2012	P	-	-	-	205,000
					A	-	-	-	76,875.63

Details

Means of Verification: Relatório do SEIAM/IMAC

Observations: (1) Situação das Florestas aprovadas para = produção em conformidade com a Lei Federal 4.771/1965 e Resolução CONAMA 406

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
1.4	R1.4 - Número de contratos entre empresas florestais e organizações de pequenos agricultores e comunidades tradicionais para o manejo florestal sustentável (curto e médio prazo de garantia de suprimento de madeira);	Contratos	10	2012	P	-	-	-	90
					A	-	-	-	2

Details

Means of Verification: Controle Gerencial UGP e Contratos de venda de madeira firmados entre empresas florestais e organizações de produtores.

Observations: Atividades <= salário rural médio diário de trabalho não qualificado, ~ R\$15 por dia, não são susceptíveis de ser atraente para os pequenos agricultores. O retorno estimado para a venda da madeira, por pequenos produtores é de R\$45 por pessoa-dia. O compo

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultados 2: Promoção de Cadeias de Valor Florestais e Agroflorestais Competitivas e Sustentáveis

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
2.1	R2.1 - Número de novas empresas a optar por adquirir produtos florestais e agroflorestais de produtores localizados no Estado do Acre.	Empresas	0	2012	P	-	-	-	5
					A	-	-	-	5

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoramento do Programa

Observations: Ao decidir a partir do qual local para produtos agroflorestais adquirem, a empresa considera: (1) adequação agro-ecológico da região considerada; (2) os custos de transação associados com a região considerada, e (3) localização de armazéns e instalações d

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
2.2	R2.2 - Pequenos agricultores e comunidades tradicionais que aderem às cadeias de valor sustentáveis agroflorestais.	# of farmers	0	2012	P	-	-	-	7,363
					A	-	-	-	3,747

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoramento do Programa (número de planos de negócios contratados)

Observations: Hernandez and Reardon (2012) and Carletto et al. (2010) apresenta evidências empíricas sobre os determinantes e impactos da participação dos agricultores nas cadeias de valor.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
2.3	R2.3 - Hectares referente ao número de contratos assinados entre os proprietários de médio e grande porte no FIP.	Ha	0	2012	P	-	-	-	15,000
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoramento do Programa.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Specific Development Objectives Nbr. 3: Resultados 3: Gestão Pública Florestal e Agroflorestal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
3.1	R3.1 - Hectares de florestas estaduais gerenciados por SEDENS de acordo com os Planos de Manejo Florestal Sustentável-PMFS e contratos de concessões florestais.	Ha	23000	2012	P	-	-	-	420,000
					A	-	-	-	678,000

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoramento do Programa; e (ii) Relatórios de sistemas de informação e gestão integrada do SEIAM.

Observations: Proposta: 240mil ha das concessões + 180mil ha dos PMFC = 420mil ha/3 = 140mil/ha/ano

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
3.2	R3.2 - Quantidade de propriedades rurais que tem recebido anualmente a Licença Ambiental Rural (LAR) em conformidade com o Código Florestal.	Licença	195	2012	P	-	-	-	85
					A	-	-	-	53,720

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoramento do Programa: SEIAM- IMAC informar sobre o monitoramento do tempo necessário para aprovar as licenças ambientais

Observations: Em conformidade com: Lei Estadual n º 2156/2009 o processo de licenciamento inteiro para qualquer atividade apuradas para a implementação deve ser inferior a 120 dias ou 180 dias (com EIA completo). Linha de base com base nos dados de 2010.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	2021	EOP 2021
3.3	R3.3 - Número de instituições governamentais capazes de monitorar e reportar o desempenho contra metas de desempenho previamente acordados;	Government agencies (#)	0	2012	P	-	-	-	1
					A	-	-	-	9

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoramento do Programa										
Observations: Os Órgãos do Estado do Acre que serão fortalecidos são: SEDENS, SEMA, IMAC, ITERACRE, e SEAPROF. Os relatórios de desempenho incluem a medição da capacidade de planejamento; metas, resultados operacionais, as metas, o compartilhamento de informações e ava										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Expansão e consolidação de áreas protegidas e florestais comunitárias para uso sustentável

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
1.01	P1: Superfície de novas florestas estaduais (Floresta Estadual do Jurupari)	Hectares	P	-	-	-	-
			P (a)	141,568.28	141,568.28	1,045,675.03	5,921,765.49
			A	155,120.06	155,120.06	1,236,122.39	6,112,212.85
1.02	P2: Florestas Estadual expandidas,consolidadas, e prontas para a produção sustentável.	Hectares	P	-	240,000	-	7,345,000
			P (a)	238,610.19	238,610.19	405,716.16	1,191,670.56
			A	238,610.19	238,610.19	101,647.59	887,601.99
1.03	P3: 5.000 hectares de POAs consolidados na Floresta Estadual Antimary	Hectares	P	-	5,000	-	-
			P (a)	-	5,074.63	208,792.05	2,350,518.02
			A	-	5,074.63	463,226.12	2,604,952.09
1.04	P4: 1 - Capacitação e Treinamento para Produtores, técnicos e empresas Desenvolvido	Beneficiaries (#)	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1,668	241,565.74	2,152,199.92
			A	-	1,668	1,315,555.38	3,226,189.56
1.05	P4: 2 - Em parceria com a Embrapa - 5 Pesquisas Desenvolvidas (4 com a SEMA e 1 com a SEAPROF)	pesquisa	P	-	-	-	-
			P (a)	9	32	834,414.07	1,773,771.4
			A	31	54	-	939,357.33
1.06	P5: Produtores com Planos de Manejo aprovados para acessar os mercados de produtos florestais sustentáveis	# of farmers	P	-	1,000	-	8,367,000
			P (a)	142	1,375	1,095,611.72	8,151,317.02
			A	-	1,233	328,922.07	7,384,627.37
1.07	P6: Organizações comunitárias em torno da produção florestal sustentável fortalecidas.	# of enterprises	P	-	50	-	3,724,000
			P (a)	16	50	165,911.18	2,243,324.45
			A	7	41	613,127.91	2,690,541.18
1.08	P7: Infraestrutura de transporte para o Manejo das Florestas Comunitárias melhorada	km	P	-	140	-	7,374,000
			P (a)	17	296	2,451,301.62	8,989,652.25
			A	100.55	379.55	1,915,509.13	8,453,859.76

Component Nbr. 2 Componente 2. Promoção de Cadeias de Valor Florestais e Agroflorestais Competitivas e Sustentáveis

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
2.01	P8: Interesse dos mercados e investidores em potencial das cadeias produtivas florestais e agro florestal no Estado do Acre aumentado.	Contratos	P	-	5	-	2,780,000
			P (a)	1	3	182,169.73	3,234,767.05
			A	3	5	-	3,052,597.32
2.02	P9: Assistência técnica para a adoção de novas tecnologias, de técnicas de gestão, e de participação em cadeias produtivas sustentáveis para as comunidades tradicionais e pequenos produtores	# of MSMEs	P	-	7,363	-	42,450,000
			P (a)	500	8,830	4,085,259.04	41,285,016.89
			A	1,594	9,924	5,665,202.33	42,864,960.18

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimento da Gestão Pública Florestal e Agroflorestal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
3.01	P11: Consultorias estratégicas como ferramenta de gestão na SEDENS, SEMA, IMAC, SEAPROF, e ITERACRE desenvolvidos e executados.	Planos	P	-	5	-	250,000
			P (a)	1	10	-	-
			A	1	10	-	-
3.02	P12: Estruturas de apoio dos serviços públicos na floresta sustentável, na gestão ambiental, e extensão rural descentralizadas.	Government agencies (#)	P	-	4	-	2,742,000
			P (a)	5	19	933,548.14	3,051,226.21
			A	-	14	1,280,694.74	3,398,372.81
3.03	P13: Sistemas de gestão de informações ambientais e florestais desenvolvidos e executados.	Sistemas	P	-	2	-	3,660,000
			P (a)	-	2	122,322.58	122,322.58
			A	2	4	-	-
3.04	P14: Legislação Estadual Florestal adequada.	Lei	P	-	1	-	28,000
			P (a)	1	2	-	-
			A	-	1	-	-
3.05	P15: Instituições do Estado (organização, procedimentos operacionais, e processos) modernizadas	Government agencies (#)	P	-	5	-	11,725,000
			P (a)	6	15	7,774,205.18	12,325,874.54
			A	4	13	229,091.62	4,780,760.98

Component Nbr. 4 Componente 4. Administração do PDSA II

				FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP
4.00			P	-
			P (a)	-
			A	-

Other Cost				
	Outros Custos: Adminitração, Monitoramento e Auditorias	P		9,048,000
		P (a)	75,200	7,087,169.38
		A	1,797,606.9	8,809,576.28
Total Cost				
	Total Cost	P		119,850,000
		P (a)	19,621,692.24	100,267,636.76
		A	14,946,706.18	95,592,650.7

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	P1: Superfície de novas florestas estaduais (Floresta Estadual do Jurupari)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P11: Consultorias estratégicas como ferramenta de gestão na SEDENS, SEMA, IMAC, SEAPROF, e ITERACRE desenvolvidos e executados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P12: Estruturas de apoio dos serviços públicos na floresta sustentável, na gestão ambiental, e extensão rural descentralizadas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P15: Instituições do Estado (organização, procedimentos operacionais, e processos) modernizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P2: Florestas Estadual expandidas,consolidadas, e prontas para a produção sustentável.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
	P3: 5.000 hectares de POAs consolidados na Floresta Estadual Antimary	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P4: 1 - Capacitação e Treinamento para Produtores, técnicos e empresas Desenvolvido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Physical Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P4: 2 - Em parceria com a Embrapa - 5 Pesquisas Desenvolvidas (4 com a SEMA e 1 com a SEAPROF)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P5: Produtores com Planos de Manejo aprovados para acessar os mercados de produtos florestais sustentáveis	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P6: Organizações comunitárias em torno da produção florestal sustentável fortalecidas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
	P7: Infraestrutura de transporte para o Manejo das Florestas Comunitárias melhorada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P8: Interesse dos mercados e investidores em potencial das cadeias produtivas florestais e agro florestal no Estado do Acre aumentado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022
	P9: Assistência técnica para a adoção de novas tecnologias, de técnicas de gestão, e de participação em cadeias produtivas sustentáveis para as comunidades tradicionais e pequenos produtores	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/16/2022
			Modify Financial Historical Actual	HIGORG	3/16/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
11	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	11.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	13.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
