


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1272	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Strengthen the Management Capacity of Buenos Aires Province	Loan Number	4435/OC-AR
Executing Agency	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-SUBNATIONAL AND LOCAL GOVERNMENTS
Team Leader	GARCIA MEJIA, MAURICIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1272	20,000,000	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	20,000,000	4,500,000	22.50%	15,500,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	20,000,000	4,500,000	22.50%	15,500,000

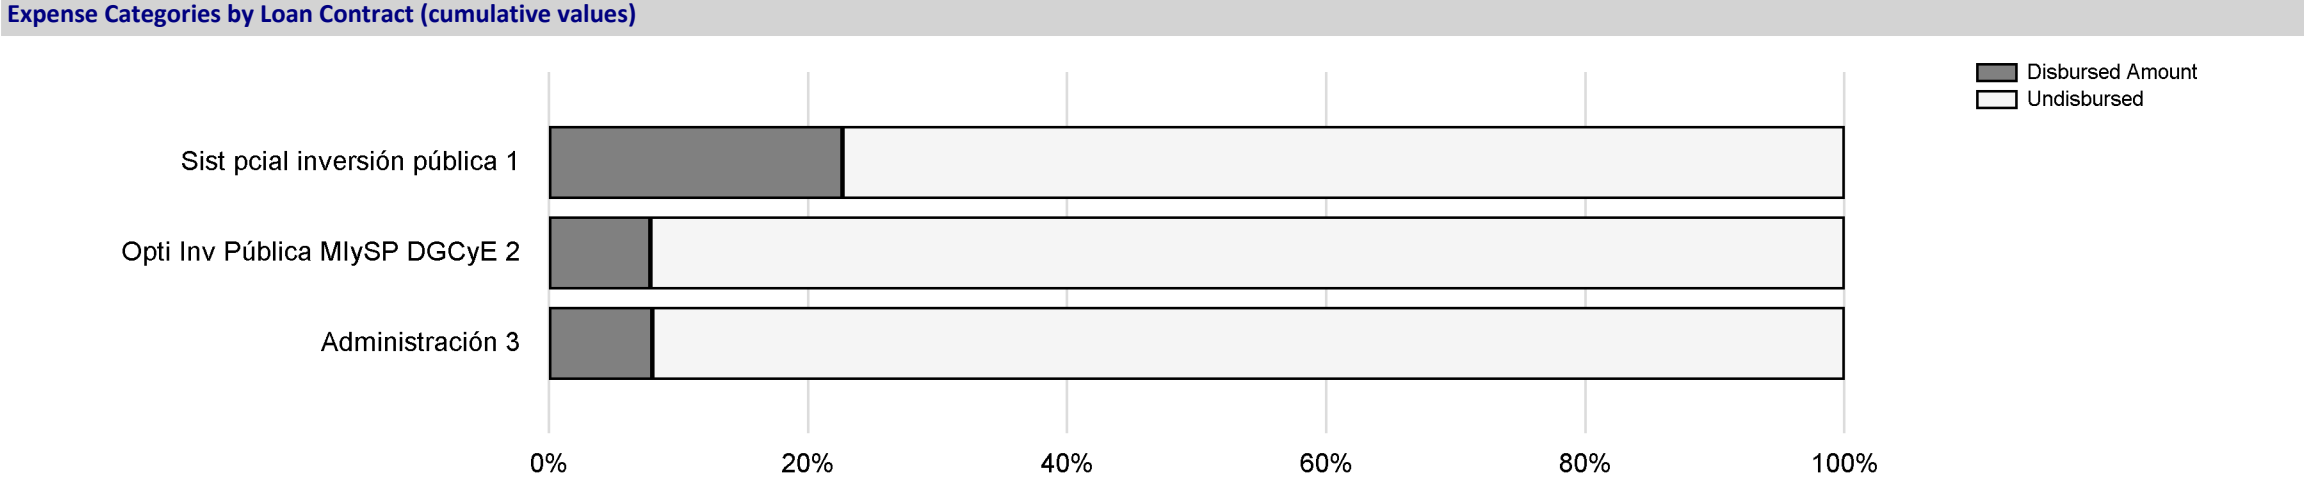

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX														
Specific Development Objectives														
Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejora de la capacidad del ME de la PBA para la formulación, programación y evaluación de los PIP.														
Observation:														
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.0	Incremento de la ejecución presupuestal del gasto de capital en la Provincia de Buenos Alres.				Porcentaje anual	79.85	2018	P	-	-	82	-	84	84
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Informe trimestral de presupuesto publicado. Reporte de ejecución Presupuestaria (Contaduría de la Provincia).														
Observations: Se considerará como numerador la ejecución presupuestaria devengada y como denominador el presupuesto aprobado inicialmente														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.1	Incremento de la inversión pública con financiamiento privado de la Provincia de Buenos Aires				millones de US\$	0	2018	P	-	-	-	-	100	100
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Documento de Proyecto de IP bajo PPP, iguales o superiores a US\$ 100														
Observations: Se considerará el monto comprometido en proyectos de PPP licitados y adjudicados. Considera la partida de Inversión Real Dircta (IRD), que incluye nuevas obras de infraestructura y la compra de bienes de capital destinado a aumentar o reponer el patrimonio de bienes de capital del Estado. Fuente de referencia: The Non-Financial Benefits of PPPs -European PPP Expertise Centre (EPEC) & Performance of PFI Construction 2003/2009- UK National Audit Office (NAO).														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.2	Ejecución presupuestaria sobre crédito vigente en municipios de la provincia de Buenos Aires con sistema RAFAM implementado				Porcentaje	66	2018	P	-	-	66	-	72	72
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Informe publicado por parte de la DPCMyPD														
Observations: El indicador refiere a la relación entre el gasto de capital ejecutado y el gasto de capital presupuestado (vigente al cierre del ejercicio), considerando el promedio simple de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires que poseen el sistema informático RAFAM implementado.														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.3	Disminución de la demora en la disposición de información presupuestaria y financiera municipal consolidada a nivel provincial				Días	120	2018	P	-	-	105	-	60	60
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Informe publicado por parte de la DPCMyPD														
Observations: El indicador refiere al tiempo de procesamiento para consolidar el reporte de estado de situación a nivel presupuestario y financiero de los municipios de la provincia de Buenos Aires (basado en los Cuadros de Ahorro Inversión Financiera –CAIFs), realizado a través de la utilización de los sistemas RAFAM y SIMco. El cálculo se realiza considerando como punto de partida la fecha del 31/03 que es cuando de acuerdo a la normativa vigente vence el período de presentación de las rendiciones de cuentas anuales de los poderes ejecutivos a los poderes legislativos municipales.														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Disminución de la demora en la elaboración del Informe Técnico y de Evaluación de Endeudamiento Municipal	Días	30	2018	P	-	-	-	-	15	15
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe publicado por parte de la DPCMyPD

Observations: El indicador refiere al tiempo de respuesta promedio para la elaboración del Informe Técnico y de Evaluación de Endeudamiento Provincial que realiza la DPCMyPD según lo establecido por la Ley Provincial 12.462, para dictaminar acerca de la capacidad de endeudamiento de los municipios que lo solicitan.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incremento de la ejecución presupuestaria de gasto capital en el MlySP

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Incremento de la ejecución presupuestal del gasto de capital del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MlySP)	Porcentaje	73	2018	P	74	75	76	77	78	78
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes de ejecución presupuestaria del MlySP Contaduría de la Provincia.

Observations: Como numerador se considera la ejecución presupuestaria devengada y como denominador, el presupuesto modificado por año fiscal.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del sistema provincial de inversión pública

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Sistema provincial de inversión pública implementado e integrado a los demás sistemas de información financieros y de gestión	Número de softwares	P	-	1	148,378	990,000
			P (a)	-	1	12,103	250,000
			A	-	-	7,714	109,769
1.02	Proyectos formulados y evaluados bajo nuevas metodologías	número de proyectos	P	1	1	271,920	1,492,000
			P (a)	-	-	-	27,440
			A	-	-	-	27,440
1.03	Agencia de promoción de inversiones de la Provincia de BA brindando servicios	Número de documentos	P	-	3	-	500,001
			P (a)	1	6	38,254	300,000
			A	-	4	18,845	203,796
1.04	Documentos con evaluaciones de la ejecución programática realizada	Número de softwares	P	4	12	566,500	744,501
			P (a)	4	12	87,224	200,000
			A	-	4	-	-
1.05	Programa de género implementado	Número de documentos	P	-	-	-	-
			P (a)	1	3	18,839	160,000
			A	-	1	7,042	39,035
1.06	Proyectos del plan de Modernización y transformación digital de la Provincia implementados.	Número de documentos	P	-	-	-	-
			P (a)	1	3	2,510,152	2,789,060
			A	-	1	12,686	32,869
1.07	Softwares de administración financiera municipal y provincial desarrollados e implementados	Número de softwares	P	1	2	2,269,052	6,773,500
			P (a)	1	2	846,408	6,773,500
			A	-	1	392,479	1,721,850

Component Nbr. 2 Optimización de la ejecución de la inversión pública en el MlySP y la DGEC

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Documentos con estudios que identifiquen brecha de infraestructura	Número de documentos	P	3	3	2,375,000	2,668,750
			P (a)	3	3	235,561	1,921,873
			A	-	-	22,364	52,387
2.02	Software con sistema de Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el MlySP con información financiera implementado	Número de softwares	P	1	1	859,330	2,636,147
			P (a)	-	1	211,037	590,343
			A	-	1	-	369,182
2.03	Nuevo marco normativo para optimizar los procesos de infraestructura implementado	Número de compendios normativos	P	1	3	18,750	62,500
			P (a)	1	3	132,063	393,414
			A	-	-	8,807	74,612
2.04	Datacenter con solución de Back Up Integral en funcionamiento	Número de datacenter	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	-	1,603,767
			A	-	-	-	-
2.05	Programas de fortalecimiento de equipos de gestión para la ejecución de obras en el MlySP implementado	Número de programas	P	-	2	1,084,695	4,125,000
			P (a)	-	1	79,824	438,462
			A	-	-	75,033	119,976
2.06	Estudios de factibilidad económica y técnica para proyectos	Estudios aprobados	P	1	3	420,000	840,000
			P (a)	12	50	1,393,792	8,027,634
			A	16	38	186,034	373,123
2.07	Plan de Acción del Programa para la Equidad de Genero del MIYSP diseñado	Documento con Plan de Acción	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	35,247	130,395
			A	-	-	19,601	37,085
2.08	Plan de Acción del Programa para la Equidad de Genero del MIYSP implementado	% de Avance del Plan de Acción	P	-	-	-	-
			P (a)	30	100	-	364,285
			A	-	-	-	-
2.09	Municipios con capacidades para ejecución, monitoreo y control de obras mejoradas	Número de municipios	P	95	135	1,593,159	3,417,600
			P (a)	40	135	43,681	272,714
			A	-	-	24,862	118,272

Other Cost				
	Fortalecimiento DPOMyB	P	82,222	216,000
		P (a)	69,471	216,000
		A	29,250	87,855
	Fortalecimiento MlySP	P	143,760	288,000
		P (a)	91,714	261,800
		A	0	0
	Auditoría y Evaluación	P	58,653	100,001
		P (a)	64,653	133,313
		A	7,206	57,208
	Imprevistos	P	146,000	146,000
		P (a)	73,000	146,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	10,037,419	25,000,000

	Total Cost	P (a)	5,943,023	25,000,000
		A	811,923	3,424,459

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Estudios de factibilidad económica y técnica para proyectos	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	9/29/2022
			Modify Physical Historical Actual	GLAFFAYE	9/29/2022
	Plan de Acción del Programa para la Equidad de Genero del MIYSP diseñado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	9/22/2022
	Programas de fortalecimiento de equipos de gestión para la ejecución de obras en el MIySP implementado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	9/27/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING	
Lesson Learned - Categories	
