

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1201	Chief of Operations Validation Date	10/10/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Rural Development and Productivity Project	Loan Number	4936/BL-HO
Executing Agency	INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS INVESTH	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-INTEGRATED REGIONAL/LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Team Leader	SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	HO-L1211
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1201	21,100,000	21,100,000	0	13,400,000	34,500,000	21,100,000	4,402,000	20.86%	16,698,000
HO-L1211	33,900,000	33,900,000	0	21,600,000	55,500,000	33,900,000	855,523	2.52%	33,044,477
Aggregated	55,000,000	55,000,000	0	35,000,000	90,000,000	55,000,000	5,257,523	9.56%	49,742,477

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

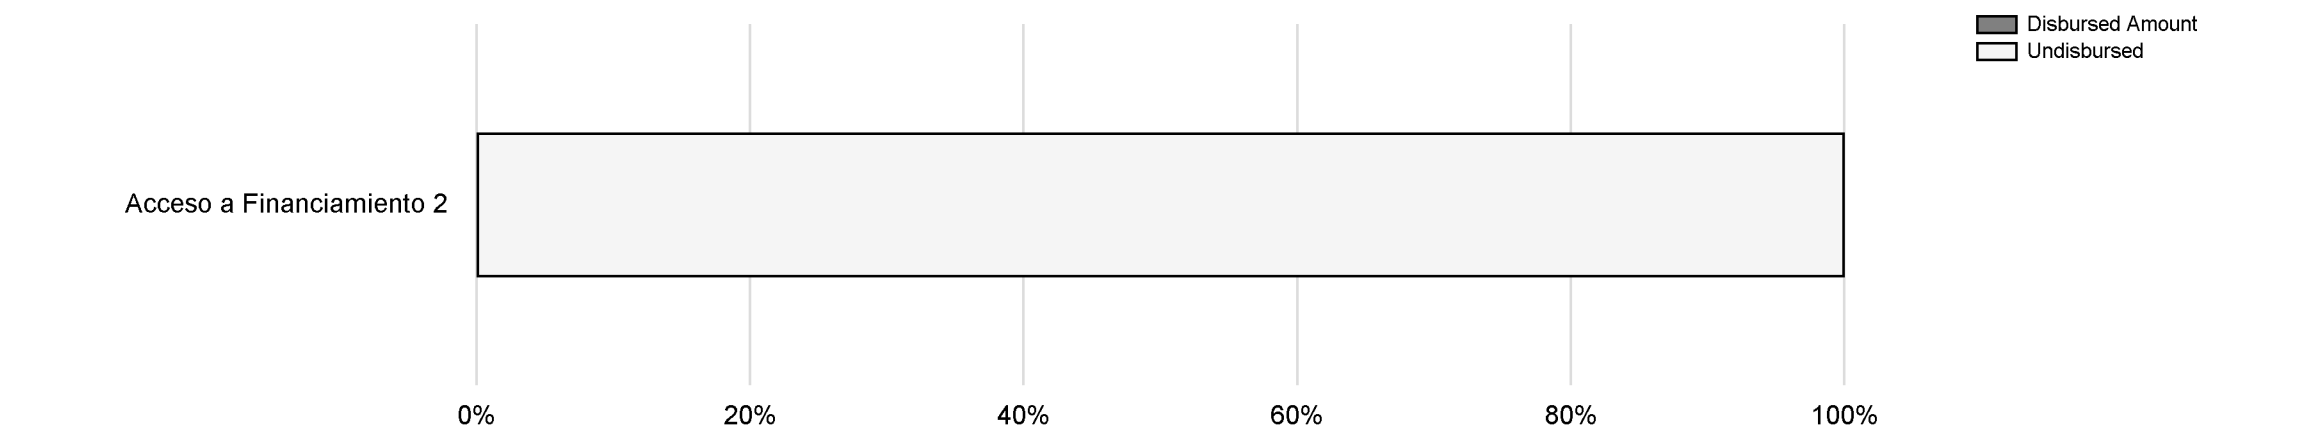

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Reducción de la Pobreza gracias al Apoyo del Proyecto

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Número de hogares rurales que hayan superado la línea de pobreza durante la vida de la intervención.	Hogares rurales	0	2020	2025	P	15,000
						A	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 1: Adopción y Acceso a Tecnologías											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Número de hectáreas con tecnologías CI gracias a la intervención.	Hectáreas	0	2020	P	-	1,128	2,148	2,364	-	5,640
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.											
Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecucion Semestrales, segun clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Prestamo.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Número de beneficiarios con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	Productores agropecuarios	0	2020	P	-	400	1,200	2,400	-	4,000
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.											
Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Número de hectáreas bajo planes de manejo de microcuenca gracias a la intervención.	Hectáreas	0	2020	P	-	10,000	15,000	-	-	25,000
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.											
Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.4	Número de beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios gracias al apoyo del proyecto.	Productores agropecuarios	0	2020	P	-	1,000	3,000	1,000	-	5,000
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.											
Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecimiento del Acceso a Mercados de Mujeres y Jóvenes

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Número de MiPyME beneficiarias lideradas por mujeres con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	MiPyME lideradas por mujeres	0	2020	P	-	3	3	2	-	8
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	Número de emprendimientos liderados por jóvenes con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	Emprendi-mientos liderados por jóvenes	0	2020	P	-	3	3	2	2	10
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incremento de la Inversión Productiva

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Plazos promedios en el CSH concedidos con el fideicomiso del proyecto.	Meses	12	2020	P	12	18	24	36	36	36
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Banco Central de Honduras e información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.1	Monto total de la cartera del fideicomiso para productores	US\$ miles	0	2021	P	-	-	15,000	15,000	4,500	34,500
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejora del Ingreso Agropecuario y Reducción de la Situación de Pobreza

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	Rendimiento del cultivo de café antes y después de la intervención.	Kg/Ha		2020	P	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.										
Observations: Se espera un incremento de los rendimientos de la producción agropecuaria como consecuencia de la combinación de AT y financiamiento. La LB y metas utilizadas para el ejercicio ACB se determinaron en base a la experiencia de la intervención USAID-Acceso. El alzamiento de la LB para esta intervención arrojará el dato actualizado de LB para todos los indicadores de resultados de rendimiento.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.1	Rendimiento del cultivo de grano básico antes y después de la intervención.	Kg/Ha		2021	P	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST Honduras.										
Observations: Se utiliza el rendimiento del cultivo de maíz como proxy.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.2	Rendimiento del cultivo de hortalizas antes y después de la intervención.	Kg/Ha		2021	P	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Se utiliza el rendimiento del cultivo de maíz como proxy.										
Observations: Se utiliza el rendimiento del cultivo de zanahoria como proxy. El ACB toma como 0 la LB puesto que, en media, la finca típica no incorpora actualmente cultivo de hortalizas.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.3	Rendimiento del cultivo de cacao antes y después de la intervención.	Kg/Ha		2021	P	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.										
Observations: El ACB toma como 0 la LB puesto que, en media, la finca típica no incorpora actualmente cultivo de cacao.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.4	Rendimiento de la explotación de ganadería lechera antes y después de la intervención.	Litros/Animal		2021	P	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-
Details										

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.5	Número de beneficiarios por debajo del umbral de pobreza.			Hogares Rurales		2021	P	-	-	-	-	-	-
							A	-	-	-	-	-	-
Details													

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: Según datos de Banco Mundial (2018), un 61,9% de la población hondureña vive por debajo del umbral de pobreza, a lo que CEPALSTAT (2018) añade la mayor incidencia en el entorno rural, que supera el 65%. Atendiendo a la experiencia del proyecto USAID-Acceso en el CHS, el 90% de la población beneficiaria de la AT en la zona de intervención se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Teniendo en cuenta que los beneficiarios del Componente 2 serán sujetos de crédito, se ha decidido optar por una LB conservadora, reflejando una reducción de 15.000 beneficiarios por debajo de la línea de pobreza al fin de la intervención. La LB será actualizada en base a los insumos derivados de la consultoría para el levantamiento de línea de base enmarcada bajo esta intervención.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento del Desarrollo Productivo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Número de productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI con financiamiento iniciado con el apoyo de la intervención.	Productores Agropecuarios	P	4,000	10,000	3,200,000	20,000,000
			P (a)	-	10,000	-	20,000,000
			A	-	-	-	-
1.02	Número de productores agropecuarios atendidos con AT en producción y mercado.	Productores Agropecuarios	P	4,000	10,000	3,900,000	13,500,000
			P (a)	-	10,000	-	13,500,000
			A	-	-	-	-
1.03	Número de productores agropecuarios que reciben acompañamiento de asistencia técnica para la gestión de su crédito.	Productores Agropecuarios	P	1,500	15,000	1,625,000	6,750,000
			P (a)	-	15,000	-	6,750,000
			A	-	-	-	-
1.04	Número de hogares rurales atendidos con AT en nutrición.	Hogares Rurales	P	3,000	6,000	550,000	2,250,000
			P (a)	-	6,000	-	2,250,000
			A	-	-	-	-
1.05	Número de planes de manejo de microcuenca aprobados con implementación iniciada con apoyo del proyecto.	Planes	P	10	25	160,000	1,200,000
			P (a)	-	25	-	1,336,600
			A	-	-	-	-
1.06	Número de mancomunidades dotadas con equipos para la provisión de AT con presencia local.	Mancomunidades	P	2	10	-	400,000
			P (a)	-	10	-	263,400
			A	-	-	-	-
1.07	Número de convenios firmados con mancomunidades para la prestación de servicios relacionados al manejo de microcuencas.	convenios	P	2	10	92,000	400,000
			P (a)	-	10	-	400,000
			A	-	-	-	-
1.08	Número de proyectos de las TIC desarrollados y en proceso de implementación.	Proyectos	P	1	5	280,000	670,000
			P (a)	-	5	-	670,000
			A	-	-	-	-
1.09	Número de programas de capacitación y promoción de uso de las TIC desarrollado y en proceso de implementación.	programas	P	1	1	90,000	300,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	-	-	-
1.10	Número de convenios firmados para la provisión de asistencia especializada.	convenios	P	1	3	-	300,000
			P (a)	-	3	-	300,000
			A	-	-	-	-
1.11	Número de proyectos de generación y/o adaptación de tecnología CI desarrollados.	Proyectos	P	-	5	-	230,000
			P (a)	-	5	-	230,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Acceso a Financiamiento

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Monto de créditos otorgados con apoyo del proyecto.	Millones US\$	P	4	29.5	3,691,186	29,500,000
			P (a)	-	29.5	-	29,500,000
			A	-	-	-	2,202,327.01
2.02	Monto de garantías otorgadas con recursos del proyecto.	Millones US\$	P	1	5	605,803.84	5,000,000
			P (a)	-	5	-	5,000,000
			A	-	-	-	1,936,411.54

Component Nbr. 3 Componente 3: Sistema de monitoreo y evaluación

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo para el CSH mediante tecnología de georreferenciación y big data.	Sistema en implemen- tación	P	-	1	735,452.59	2,800,000.01
			P (a)	-	1	-	2,800,000
			A	-	-	-	-
3.02	Estudio de economía del comportamiento realizado.	Estudio final aprobado por el equipo de proyecto	P	-	1	40,000	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Gestión del Programa	P	725,966.54	3,150,000
		P (a)	406,158.1	3,378,426.59
		A	132,462.56	398,935.16
	Gastos operativos	P	168,263.83	1,101,000
		P (a)	209,757.46	1,139,973.41
		A	102,376.73	120,263.67
	Auditorías	P	32,000	160,000
		P (a)	32,000	160,000
		A	0	0
	Evaluación Intermedia y Final	P	0	60,000
		P (a)	0	60,000
		A	0	0
	Costo Indirecto Operativo	P	448,224.54	2,028,999.99
		P (a)	223,457.04	1,761,600
		A	10,152	27,402
Total Cost				
	Total Cost	P	16,343,897.34	90,000,000
		P (a)	871,372.6	90,000,000
		A	244,991.29	4,685,339.38

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Political Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Political Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Political Environment
	Response Actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
