

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1101	Chief of Operations Validation Date	03/30/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/12/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	05/10/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Preinvestment for Development	Loan Number	3534/BL-BO
Executing Agency	VICEMINISTERIO DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	Sector/Subsector	RM-FIN - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Team Leader	BALLON LOPEZ,SERGIO ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Estado Plurinacional de Bolivia		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1101	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	1,798,278	5.99%	28,201,722
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	1,798,278	5.99%	28,201,722

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

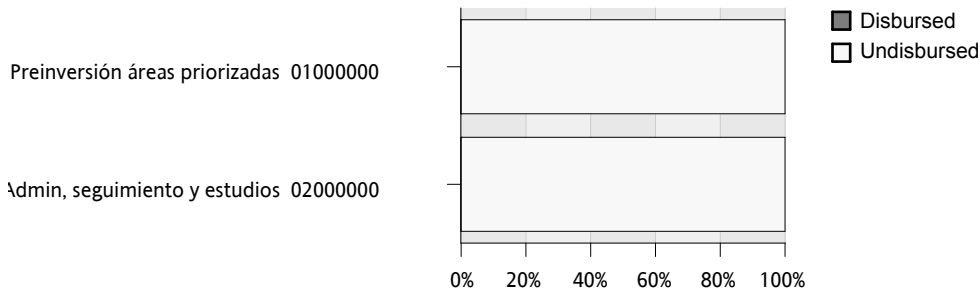

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Incremento de la inversión pública con estudios de calidad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	EOP 2020
0.0	Monto de las inversiones que surjan como resultado de los estudios de preinversión financiados por el programa	Millones US\$	0.0	2016	P		2,500.00	
					P(a)		2,500.00	
					A			

Details

Means of verification: Fuente: VIPFE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	EOP 2020
0.1	Reducción de la diferencia entre el costo total de la inversión ejecutada, y el presupuesto estimado por la preinversión, en los estudios ejecutados por el programa	%	23.0	2016	P		18.00	
					P(a)		18.00	
					A			

Details

Means of verification: Fuente: VIPFE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir a aumentar el número y calidad de los proyectos específicos de inversión, los cuales son sometidos al Banco y otros organismos internacionales, nacionales, públicos o privados, para procurar su financiamiento

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Número de proyectos de inversión cuyos estudios fueron financiados por el Programa, que han sido sometidos a gestión de financiamiento o que están en cartera de programación a la finalización del Programa	Proyecto	0.0	2016	P	15.00	15.00
					P(a)	15.00	15.00
					A		

Details

Means of verification: Fuente: VIPFE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Desarrollar una cartera de estudios de preinversión bajo la nueva norma de preinversión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.0	Porcentaje de estudios de preinversión de proyectos de inversión pública (PIP) estratégicos implementados bajo el nuevo reglamento de preinversión	%	0.0	2016	P	100.00	100.00
					P(a)	100.00	100.00
					A		

Details

Means of verification: Fuente: VIPFE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Estudios de Preinversión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Estudios de Preinversión que cumplen con estándares de calidad	Estudios	P		15		27,500,000
			P(a)		15		27,500,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente II Administración, seguimiento y estudios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Base de Datos para apoyar la elaboración de proyectos de infraestructura	Base de datos	P		1	200,000	200,000
			P(a)		1	200,000	200,000
			A		0	96,000	96,000
2.2	Manuales para incorporar la gestión de riesgos de desastres en la preinversión de los sectores de transporte y energía	Manual	P		1		200,000
			P(a)		1		200,000
			A		0		0

Other Cost

Administración	P			21,487.5	835,000
	P(a)			21,487.5	835,000
	A			0	0
Apoyo a entidades subejecutoras	P				970,000
	P(a)				970,000
	A				0
Auditorías	P				250,000
	P(a)				250,000
	A				0
Evaluación	P				45,000
	P(a)				45,000
	A				0

Total Cost

Total Cost	P			221,487.5	30,000,000
	P(a)			221,487.5	30,000,000
	A			96,000	96,000

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
