

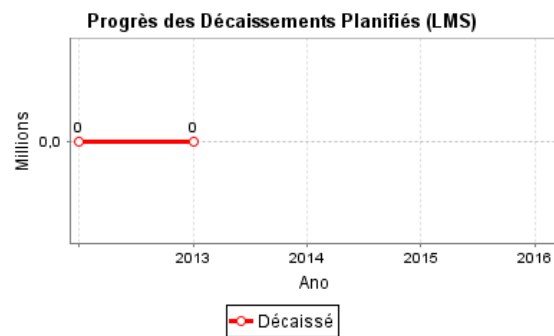


Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2787/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	40.000.000,00	Initial BID:	40.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	40.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	83,00
Opération(s) Connexe(s):	EC-T1238, RG-P1478	Solde:	40.000.000,00	Cofinancement/Pays:	8.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	48.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	150

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-mar-2013 Validé par le Représentant: 08-abr-2013

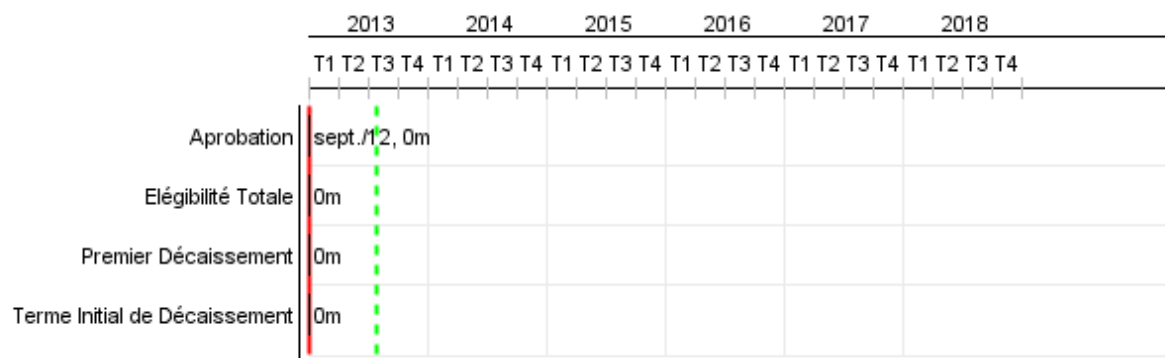

Progrès Cumulé à 2012




RAPPORT DE SUIVI

EC-L1107 - Program to Support Integrated Early Childhood Development
2012 2° período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 28/03/2013

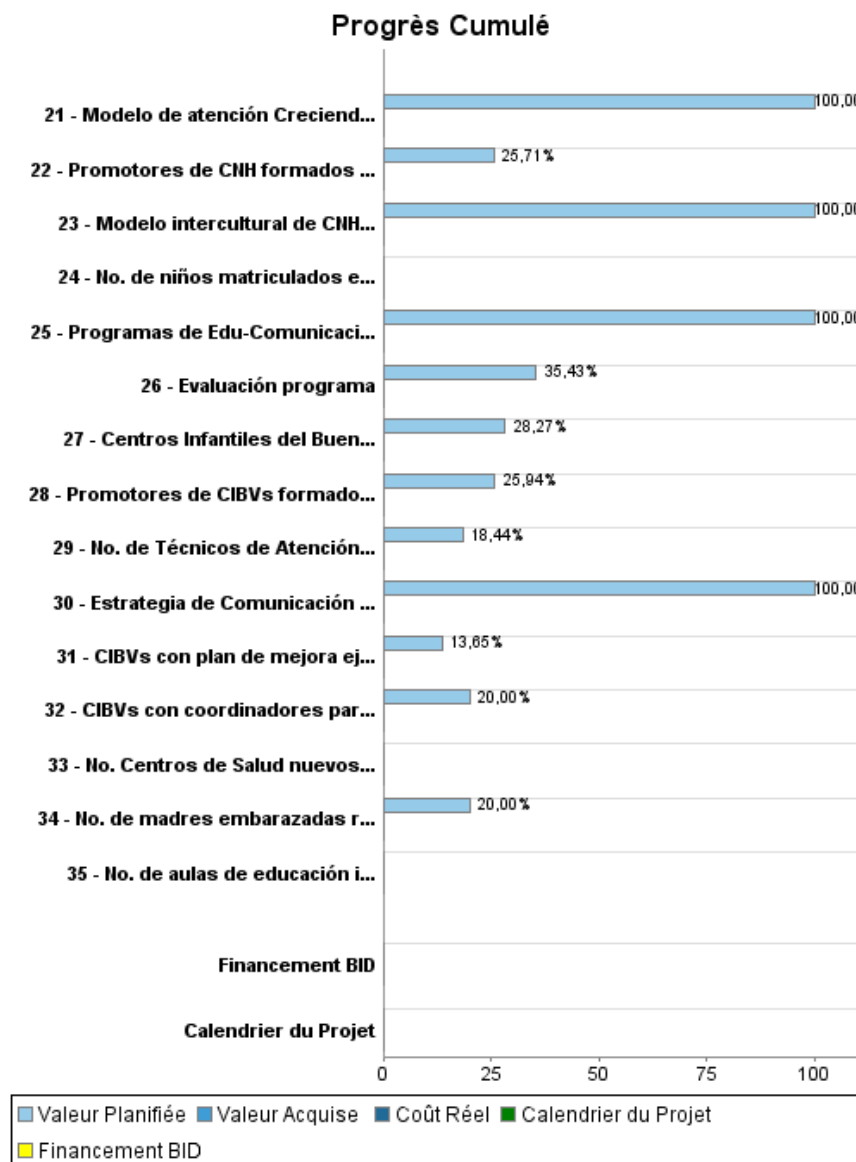

Résultats

Résultat: Niños con bajo peso al nacer reducidos.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Reducción en el porcentaje de niños con bajo peso al nacer.	porcentaje	9,00	2013	P A	8,55

Résultat: Atencion preventiva para niños menores de 59 meses ampliada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cobertura de niños menores de 59 meses con atenciones preventivas ampliada.	porcentaje	34,00	2013	P A	60,00

Résultat: Embarazadas realizando atención prenatales, aumentadas.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de embarazadas en parroquias priorizadas recibiendo controles prenatales según normas del MSP.	Porcentaje	61,00	2013	P A	80,00

Résultat: Partos institucionales aumentados.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Aumento en el porcentaje de partos institucionales en las mujeres embarazadas en las parroquias beneficiarias.	porcentaje	50,00	2013	P A	56,00

Résultat: Cobertura de niños menores de 36 meses años recibiendo estimulación temprana, ampliada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de niños menores de 36 meses años recibiendo estimulación temprana.	porcentaje	38,00	2013	P A	100,00

Résultat: Cobertura de niños menores de 36 meses recibiendo micronutrientes, ampliada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de niños menores de 36 meses recibiendo micronutrientes en las dosis adecuadas.	porcentaje	17,00	2013	P A	100,00

Résultat: CIBVs con promotoras con formación academica fortalecida.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de promotoras de CIBVs con formación de educación secundaria o más.	porcentaje	57,00	2013	P A	75,00

Résultat: Cobertura de niños menores de 36 meses en la modalidad CNH, ampliada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de niños menores de 36 meses que participan en el programa educacional de la modalidad CNH.	porcentaje	20,00	2013	P A	70,00

Résultat: Cobertura de niños hasta 36 meses en programas de estimulacion con adecuacion intercultural.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de niños hasta 36 meses que participan en el nuevo modelo intercultural.	porcentaje	5,00	2013	P A	40,00

Résultat: Cobertura de Educación Inicial, ampliada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de niños entre 3 y 4 años que asisten a Educación Inicial.	porcentaje	6,00	2013	P A	36,00

Résultat: Gestion comunitaria para el desarrollo infantil integrado, fortalecida.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de parroquias con Planes de Desarrollo Infantil Integrado Comunitario (PDIIC) formulados y aprobados.	porcentaje		2013	P A	100,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Salud Materno Infantil y Nutrición									
No. Centros de Salud nuevos construidos, equipados, y licenciados (Tipo A, B, C)	Centro de Salud				9,00				13.179.360,00
No. Puestos de Salud repotenciados y licenciados.	puesto				5,00				520.500,00
No. de médicos formados en Medicina Familiar Comunitaria.	Medico				41,00				1.004.500,00
No. de Técnicos de Atención Primaria en salud formados .	Tecnico				67,00				271.100,00
No. de personal de la Unidades Operativas capacitados en promoción del crecimiento y cuidado infantil	personal sanitario				506,00				157.400,00
No. de médicos rurales con inducción en interculturalidad DIT.	Medico				56,00				136.000,00
No. de madres embarazadas recibiendo Incentivos Económicos Desnutrición Cero.	Madre								1.613.600,00
No. de familias con niños menores de un año capacitadas en prácticas de crianza y nutrición utilizando materiales socioculturalmente adaptados.	familia				13.090,00				38.540,00
Personas que se benefician de un paquete básico de salud.	Individuals				404.000,00				
Servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT- hasta 36 meses)									
Nuevo modelo de atención y gestion Centro Infantil del Buen Vivir (CIBVs) aprobado	Modelo				1,00				55.000,00
Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBVs) construidos y certificados bajo nuevos estándares de calidad	Centros				34,00				10.215.000,00
CIBVs con plan de mejora ejecutado	Centro				91,00				1.835.000,00
Promotores de CIBVs formados como Técnicos en Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	Promotores				82,00				498.592,00
CIBVs con círculos de estudios implementados	Centro				125,00				1.524.642,00
CIBVs con coordinadores parvularios con inducción intercultural completada	Centros				125,00				35.908,00
Dosis de micronutrientes en polvo para niños menores de 5 años dados	Dosis				63.485,00				135.858,00
Modelo de atención Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) reforzado	Modelo				1,00				50.000,00
Promotores de CNH formados como Técnicos en DIT	Promotores				38,00				350.000,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Modelo intercultural de CNH aprobado	Modelo				1,00				50.000,00
Sistema de formación y capacitación virtual implementado	Sistema				1,00				950.000,00
Equipo de gestión MIES-INFA	N/A								300.000,00
Educación Inicial (EI - 3 y 4 años)									
No. de aulas de educación inicial nuevas según estándares	aula				176,00				9.000.000,00
No. de docentes de educación inicial capacitados en nuevo modelo de gestión y estándares de calidad de Educación Inicial.	Teachers				150,00				850.000,00
No. de visitas de supervisión y acompañamiento docente.	visita				900,00				100.000,00
No. de niños matriculados en centros de Educación Inicial.	Students				4.559,00				
Coordinación, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Desarrollo Infantil Integral (EDII)									
Normas, protocolos y Manual Operativo del Modelo de Gestión EDII aprobados	Documentos				3,00				85.000,00
Personal del nivel central y local capacitado en DIT y EDII.	Persona				1.000,00				50.000,00
Metodología para planificación comunitaria EDII aprobada y en implementación en parroquias priorizadas	Parroquias				12,00				250.000,00
Nuevas personas ceduladas	Personas				12.792,00				76.000,00
Estudios Etnográficos y de Rutas de Cuidado desarrollados y diseminados.	Estudios				4,00				305.000,00
Propuestas de formación e incentivos para ampliar la oferta y calidad de recurso humano para la EDII	Propuestas				2,00				175.000,00
Programas de Edu-Comunicación desarrollados	Programas				3,00				300.000,00
Estrategia de Comunicación Social EDII elaborada	Estrategia				1,00				200.000,00
Parroquias con oferta de RRHH EDII ampliada	Persona				1.000,00				1.000.000,00
Sistema de información gerencial y seguimiento de la EDII	Sistema				1,00				885.000,00
Evaluación programa	Informe				3,00				1.129.000,00
Administración y Auditoría	N/A								674.000,00
TOTAL									48.000.000,00
