
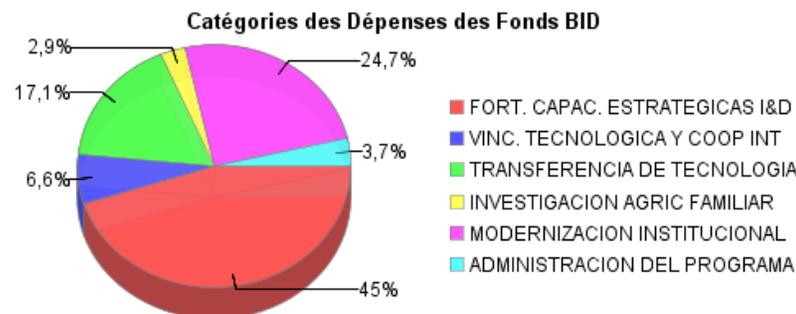


Rapport Résumé


| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | | Coût Total et Source de Financement | |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Agence d' Exécution (EA): | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | Montant Courant Approuvé: | 170.000.000,00 | Initial BID: | 170.000.000,00 |
| Secteur: | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH AND INNOVATION | Montant Décaissé à ce Jour: | 30.908.832,31 | Courant BID: | 170.000.000,00 |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 2412/OC-AR | % Décaissé: | 18,18 | Pari Passu: | 80,00 |
| Étape: | Approved | Solde: | 139.091.167,69 | Cofinancement/Pays: | 43.000.000,00 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | | | Estimation Initiale: | 213.000.000,00 |
| Opération(s) Connexe(s): | RG-T1469, AR-T1040, AR-T1046, RG-P1400 | | | Période d'Amortissement (mois): | 234 |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation | | | | |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: | B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 20-sep-2013 Validé par le Représentant: 25-oct-2013 |

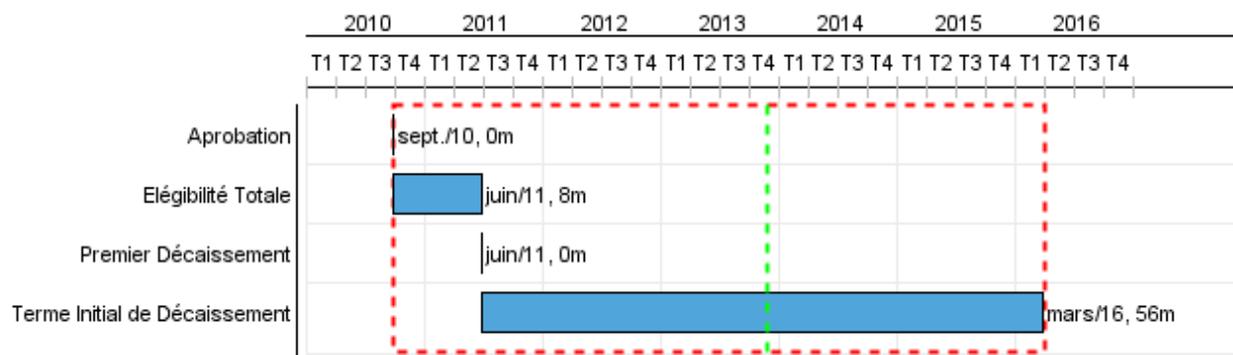

Progrès Cumulé à 2013


Progrès Cumulé

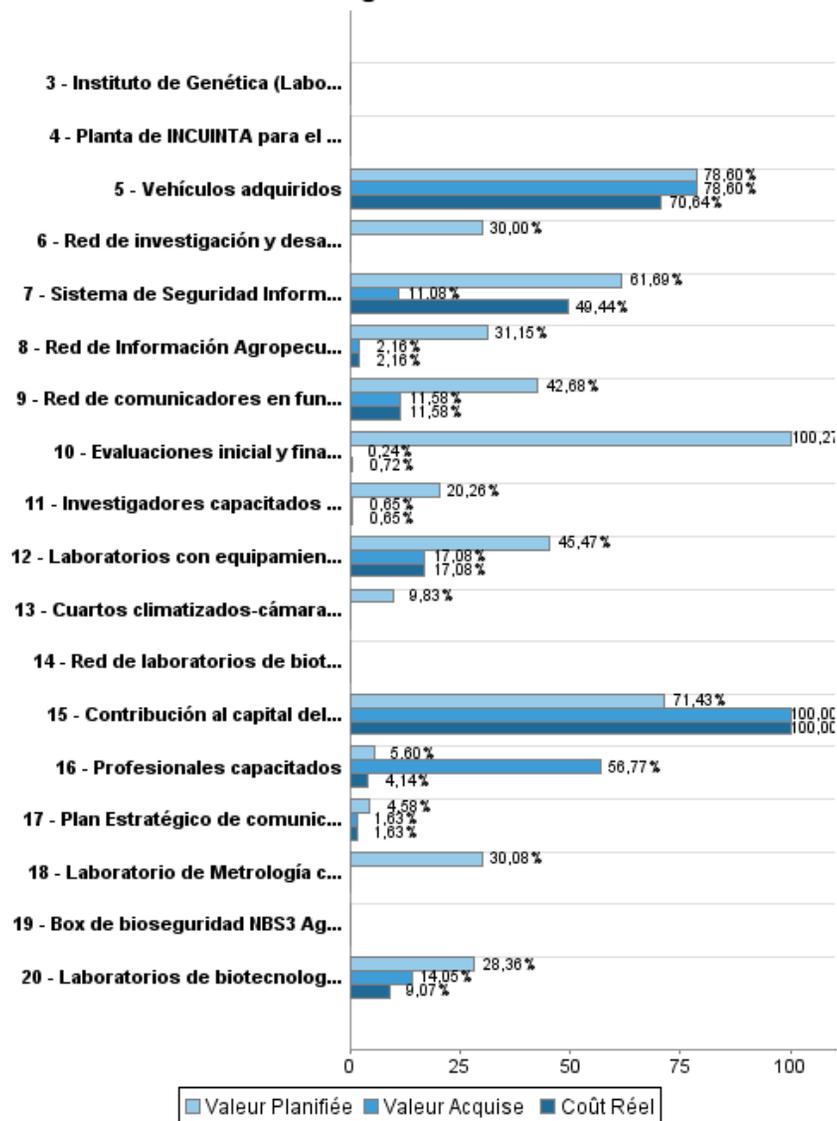


Progrès Cumulé



Progrès Cumulé

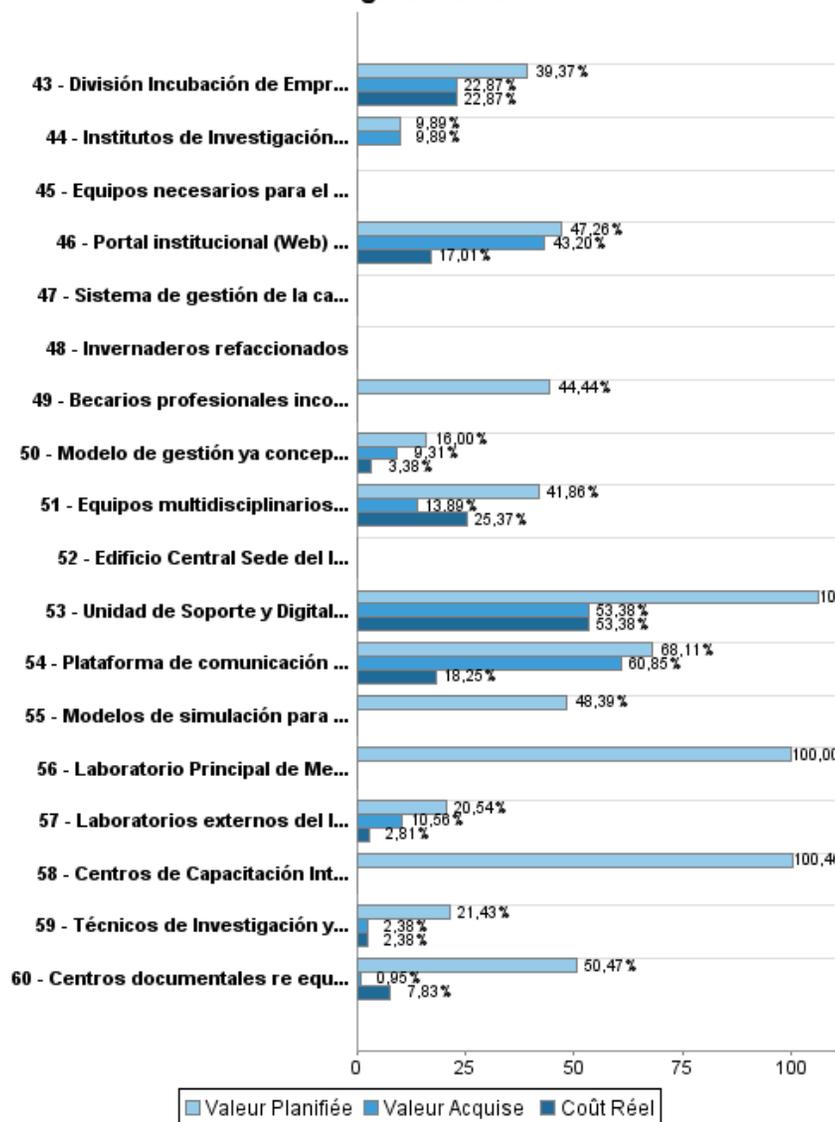

Progrès Cumulé

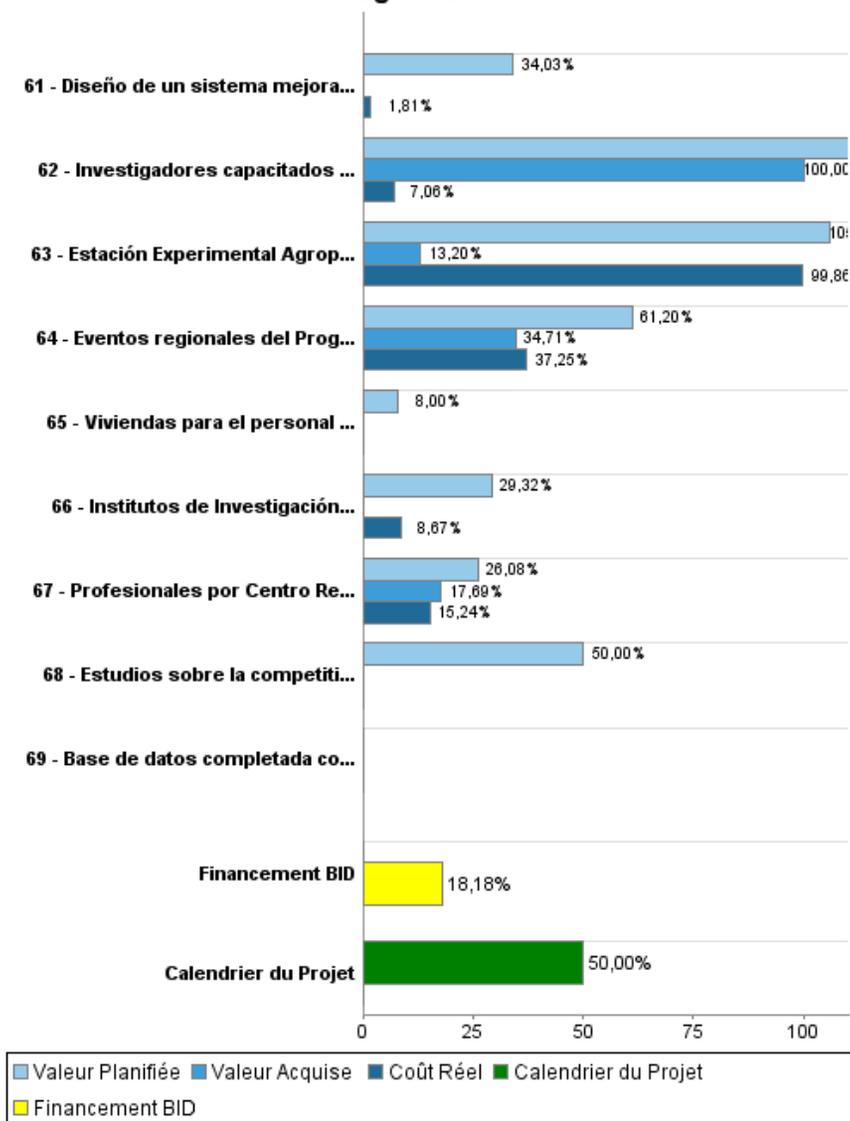

Résultats

| | |
|--------------------|---|
| Résultat: | Sistema de innovación agropecuario fortalecido. |
| Suposições: | Accion del INTA en generación y transferencia de nuevas tecnologías, productos y procesos y el incremento en la cobertura de los servicios de extensión y agricultura familiar. |

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------------|---------------|
| Agricultores de soja en el estrato de nivel tecnológico bajo | % | 21,00 | 2008 | P A | | | | | | 17,00 |
| Agricultores de maíz en el estrato de nivel tecnológico bajo | % | 31,00 | 2008 | P A | | | | | | 20,00 |
| Agricultores de trigo en el estrato de nivel tecnológico bajo | % | 25,00 | 2008 | P A | | | | | | 20,00 |
| Agricultores de girasol en el estrato de nivel tecnológico bajo | % | 21,00 | 2008 | P A | | | | | | 17,00 |
| Agricultores de algodón en el estrato de nivel tecnológico bajo | % | 72,00 | 2008 | P A | | | | | | 58,00 |
| Productores agropecuarios que acceden a mejores tecnologías promovidas por el INTA | Agricultores | | 2010 | P A | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Capacidad estratégica de Investigación y Desarrollo fortalecida. |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|--------|--------|---------------|
| Publicaciones en revistas indexadas incrementadas. | Publicaciones | 334,00 | 2010 | P A | | | | 434,00 | 468,00 | 468,00 |
| Citas en revistas indexadas incrementadas. | Publicaciones | 251,00 | 2010 | P A | | | | 326,00 | 351,00 | 351,00 |

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Producción científico-tecnológica del INTA mejorada. |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|----------|------|---------------|
| Trabajos científico-técnicos incrementados. | Trabajos | 2.542,00 | 2010 | P A | | | | 2.796,00 | | 2.923,00 |
| Desarrollo de tecnología, productos y procesos incrementados. | Desarrollo | 59,00 | 2010 | P A | | | | 65,00 | | 67,00 |

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Sistema de Metrología gestionado centralmente y ejecutado regionalmente para mantener equipos críticos bajo control, desarrollado. |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|------------|-----------------|---------------|---------------------|--|------|------|------|------|------|---------------|
|------------|-----------------|---------------|---------------------|--|------|------|------|------|------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|---|--|--|--------|--|--|--------|
| Equipos calibrados, verificados, mantenidos y/o validados. | Equipos | | 2010 | P | | | 250,00 | | | 500,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Laboratorios asistidos en calibración conforme a las Normas ISO. | Laboratorios | | 2010 | P | | | 70,00 | | | 150,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Laboratorios/servicios adicionales con certificación/acreditación | Laboratorios | 7,00 | 2010 | P | | | 10,00 | | | 12,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Producción científico-tecnológica de la Red de laboratorios de biotecnología mejorada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|-------|------|---------------|
| Eventos biotecnológicos disponibles. | Eventos | 7,00 | 2010 | P | | | | 15,00 | 5,00 | 20,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Papel del INTA como socio estratégico del sistema nacional de innovación agropecuario en Áreas prioritarias mejorado.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|------|------|---------------|
| Programas cooperativos fortalecidos o en ejecución | Programas | | 2010 | P | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Vinculación tecnológica y cooperación internacional mejorada

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|--------|--------|---------------|
| Publicaciones en revistas indexadas en coautoría con investigadores internacionales incrementadas. | Publicaciones | 119,00 | 2010 | P | | | | 155,00 | 167,00 | 167,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Patentes obtenidas en el marco de convenios de vinculación tecnológica | Patentes | | 2010 | P | | | | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Presencia y liderazgo de Argentina en problemas y oportunidades internacionales de investigación agropecuaria incrementada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|-------|-------|---------------|
| Proyectos de investigación a partir de convenios internacionales (LABINTEX) elaborados. | Proyectos | | 2010 | P | | | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: INCUINTA creada

Observações: Para el desarrollo y producción a escala piloto de instrumentos biotecnológicos y la creación de empresas de base agrobiotecnológica.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------|
| Convenios de desarrollo experimental suscriptos con empresas nacionales, instituciones públicas o privadas de investigación. | Convenios | | 2010 | P A | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 4,00 |

Résultat: Presencia y liderazgo de Argentina en problemas y oportunidades de investigación agropecuaria en el marco de FONTAGRO incrementada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Proyectos de investigación elaborados a partir de convenios internacionales (FONTAGRO) | Convenios | | 2010 | P A | 1,00 1,00 | 2,00 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 |
| Contribución al capital del FONTAGRO para la financiación de proyectos regionales de investigación realizada (USD 5 millones) | Contribución | | 2010 | P A | 1,00 1,00 | | | | | 1,00 |

Résultat: Transferencia de Tecnología y Extensión incrementada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|-------|---------------|
| Producción por hectárea incrementada. | % | | 2010 | P A | | | | | 20,00 | 20,00 |
| Productores agropecuarios que adoptan tecnologías promovidas por el INTA | % | | 2010 | P A | | | | | 50,00 | 50,00 |
| Productores integrados en asociaciones formales. | % | | 2010 | P A | | | | | 50,00 | 50,00 |

Résultat: Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (PAF) incrementada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|-------|------|-------|-------|---------------|
| Valor de la producción por hectárea de los PAF incrementado. | % | | 2010 | P A | | | | | 20,00 | 20,00 |
| Productores de Agricultura Familiar (PAF) utilizando tecnologías desarrolladas por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar(CIPAF). | % | | 2010 | P A | | | | | 50,00 | 50,00 |
| Prototipos terminados de maquinarias o equipos de agroindustria apropiados para la PAF desarrollados. | Prototipos | | 2010 | P A | | | | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| Alternativas de comercialización y financiamiento generadas específicamente para la PAF. | Alternativas | | 2010 | P A | | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 20,00 |
| Variedades autóctonas utilizadas por la PAF | Variedades | | 2010 | P | | 25,00 | | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|---|--|------|--|------|------|-------|
| conservadas en las regiones NEA y NOA en bancos germoplasma in situ y ex situ. | | | | A | | | | | | |
| Desarrollos tecnológicos para el uso de energía alternativas obtenidos. | Desarrollos | | 2010 | P | | 3,00 | | 7,00 | 8,00 | 15,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Capacidad de Gestión Institucional del INTA modernizada y fortalecida.

| | |
|--------------|--|
| Résultat: | Eficiencia económica y técnico-administrativa de la sede central del Organismo mejorada. |
| Observações: | Imagen institucional también mejorada. |

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|------|------------|---------------|
| Funciones directivas y de la alta gerencia concentradas en un solo edificio. | Funciones | | 2010 | P | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Ahorro anual de costos de alquiler de inmuebles | USD | | 2011 | P | | | | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Porcentaje de ahorro en gastos de energía eléctrica | % | | 2011 | P | | | | | 30,00 | 30,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Sistemas integrados de información y comunicación interna y externa incorporadas a la gestión de las Áreas de dirección y de las unidades operativas del INTA.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|------|------|---------------|
| Sistemas de gestión integrados. | Sistemas | 29,00 | 2010 | P | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
| | | | | A | | 1,00 | | | | |
| Ahorro de costos de comunicaciones y traslado por mejoras en la accesibilidad de la información. | Millones de USD | | 2011 | P | | | | 0,80 | 0,70 | 1,50 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Capacidades y gestión institucional en Planificación, Seguimiento y Evaluación (PSyE) fortalecidas para orientar la acción hacia resultados e impactos en el Sistema Nacional de Innovación (SNI).

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|------|------|---------------|
| Centros Regionales y de Investigación gestionando el sistema de PSyE descentralizado y utilizandolo para la toma de decisiones. | Centros | | 2010 | P | | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 19,00 |
| | | | | A | | | | | | |

Résultat: Capacidad del INTA en el análisis socio-económico de los temas vinculados al desarrollo y adopción de tecnología, ampliada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|-------|-------|---------------|
| Estudios socio-económicos publicados en revistas | % | | 2010 | P | | | | 20,00 | 20,00 | 40,00 |

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1064 - Strengthen the Agricultural Innovation System
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

indexadas incrementados.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | A | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Fortalecimiento de la Capacidad Estratégica de Investigación y Desarrollo | | | | | | | | | |
| Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (IFFIVE) de Córdoba construido y funcionando | Instituto | | | | 1,00 | | | | 1.680.000,00 |
| Estación Experimental Agropecuaria Juárez de Formosa construida y funcionando | Estación | 1,00 | | | 1,00 | 360.000,00 | 356.968,00 | | 2.095.000,00 |
| Obras menores de reacondicionamiento de Estaciones Experimentales y Centros de investigación realizadas. | Obras | 1,00 | | | 40,00 | 4.500.499,00 | 790.021,00 | | 24.076.000,00 |
| Laboratorios con equipamiento adquirido, entregado y funcionando. | Laboratorios | | | | 40,00 | 2.500.231,00 | 484.752,00 | | 16.345.000,00 |
| Estaciones Experimentales con Equipamiento de maquinaria agrícola adquirido, entregado y operando. | Estaciones | | | | 40,00 | 2.500.797,00 | 647.644,00 | | 9.780.000,00 |
| Auxiliares técnicos y profesionales capacitados en el uso y mantenimiento del equipo adquirido . | Auxiliares | | | | 100,00 | | | | 50.000,00 |
| Laboratorio Principal de Metrología (LPM) construido. | Laboratorio | | | | 1,00 | | | | 152.000,00 |
| Laboratorio de Metrología con Equipamiento adquirido, entregado y operando. | Laboratorio | | | | 1,00 | 60.000,00 | | | 532.000,00 |
| Eventos regionales del Programa de capacitación y entrenamiento básico y especializado realizados. | Eventos | 1,00 | | | 5,00 | 25.165,00 | 8.551,00 | | 95.000,00 |
| Laboratorios de biotecnología construidos. | Laboratorios | | | | 12,00 | | | | 3.148.000,00 |
| Instituto de Genética (Laboratorio de Biología Molecular del IGEAF) construido | Instituto | | | | 1,00 | | | | 1.284.000,00 |
| Box de bioseguridad NBS3 Ag construido | Box | | | | 1,00 | | | | 5.160.000,00 |
| Bioterio de experimentación construido | Bioterio | | | | 1,00 | | | | 2.400.000,00 |
| Bioterios refaccionados | Bioterios | | | | 2,00 | | | | 600.000,00 |
| Invernaderos construidos | Invernaderos | 2,00 | | | 11,00 | 200.000,00 | | | 1.132.000,00 |
| Invernaderos refaccionados | Invernaderos | | | | 2,00 | | | | 140.000,00 |
| Laboratorios de biotecnología equipados. | Laboratorios | 10,00 | 7,00 | | 29,00 | 800.818,00 | 135.865,00 | | 4.939.000,00 |
| Cuartos climatizados-cámaras de cría-incubadoras comprados. | Cuartos | | | | 30,00 | | | | 1.221.000,00 |
| Profesionales capacitados en el exterior. | Profesionales | | | | 25,00 | | | | 492.000,00 |
| Consultorías técnicas contratadas | Consultorías | | | | 20,00 | | | | 90.000,00 |
| Becarios profesionales incorporados. | Becarios | | | | 6,00 | | | | 108.000,00 |
| Cursos a profesionales, técnicos y personal de apoyo en uso de técnicas de biotecnologías brindados. | Cursos | | | | 20,00 | | | | 155.000,00 |

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Red de laboratorios de biotecnología con insumos y servicios especializados adquiridos. | Red | | | | 8,00 | | | | 2.477.000,00 |
| Plataformas Tecnológicas (PTs) organizadas y operando | Plataformas | 1,00 | | | 4,00 | 265.475,00 | | | 9.980.000,00 |
| Vinculación Tecnológica y Cooperación Internacional | | | | | | | | | |
| Laboratorios externos del INTA (LABINTEX) implementados. | Laboratorios | 1,00 | | | 3,00 | 800.904,00 | 121.654,00 | | 8.028.000,00 |
| Planta de INCUINTA para el desarrollo y producción a escala piloto de insumos biotecnológicos relacionados con salud animal, funcionando. | Planta | | | | 1,00 | | | | 1.297.600,00 |
| División Incubación de Empresas (INCUINTA) de base tecnológica Start Up de productos tecnológicos en salud animal a escala industrial montada | División | | | | 1,00 | 350.085,00 | 239.911,00 | | 2.032.200,00 |
| Profesionales de la Coordinación de Vinculación Tecnológica capacitados en bioprocesos, valorización de la propiedad intelectual y gestión de empresas de base tecnológica | Profesionales | 1,00 | | | 4,00 | 10.792,00 | | | 254.200,00 |
| Contribución al capital del FONTAGRO para la financiación de proyectos regionales de investigación realizada (USD 5 millones) | Contribución | | | | 1,00 | | | | 7.000.000,00 |
| Apoyo a la Transferencia de Tecnología y Extensión | | | | | | | | | |
| Unidades de extensión (UE) construidas | Unidades | 8,00 | 1,00 | | 50,00 | 7.000.476,00 | 2.079.132,00 | | 8.490.000,00 |
| Unidades de Extensión refaccionadas | Unidades | 30,00 | | | 108,00 | 1.000.000,00 | | | 9.375.000,00 |
| Centros de Capacitación Integral construidos | Centros | 1,00 | | | 10,00 | 550.000,00 | | | 1.095.000,00 |
| Viviendas para el personal construidas | Viviendas | 2,00 | | | 34,00 | 100.000,00 | | | 4.377.000,00 |
| Unidades de Extensión con Equipamiento adquirido, entregado y operando | Unidades | | | | 125,00 | 300.230,00 | | | 1.422.000,00 |
| Vehículos adquiridos | Vehículos | | | | 100,00 | | | | 4.962.000,00 |
| Modelo de gestión ya conceptualizado, implementado | Modelo | | | | 1,00 | 100.294,00 | 3.255,00 | | 1.450.000,00 |
| Profesionales capacitados | Profesionales | 30,00 | | | 4.654,00 | 200.143,00 | | | 5.360.000,00 |
| Apoyo a la Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (PAF) | | | | | | | | | |
| Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar construidos | Institutos | 1,00 | | | 3,00 | 900.193,00 | 293.061,00 | | 4.810.000,00 |

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAFs) equipados. | Institutos | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 170.000,00 | | | 1.719.600,00 |
| Laboratorio para el Desarrollo de Prototipos de Maquinarias Agrícolas y Equipamientos de AIR apropiados para la PAF (Nodo tecnológico), construidos | Laboratorio | | | | 1,00 | | | | 139.000,00 |
| Equipos necesarios para el desarrollo de las investigaciones del Nodo Tecnológico, adquiridos. | Equipos | | | | 1,00 | | | | 50.000,00 |
| Equipos multidisciplinarios capacitados en investigación acción participativa y comunicación popular, con abordaje interdisciplinario, conformados | Equipos | 1,00 | | | 5,00 | 100.679,00 | | | 360.000,00 |
| Técnicos de Investigación y de Programas de Desarrollo Rural capacitados en las tecnologías apropiadas | Técnicos | 200,00 | | | 800,00 | 80.000,00 | | | 420.000,00 |
| Proyectos de investigación y desarrollo formulados acerca de la problemática de la PAF, en ejecución por los actores de la red | Proyectos | 10,00 | | | 50,00 | 25.753,00 | | | 200.000,00 |
| Red de investigación y desarrollo tecnológico para la PAF, a través del CIPAF e IPAFs, conformada | Red | | | | 1,00 | | | | 50.000,00 |
| Modernización y Fortalecimiento Institucional del INTA | | | | | | | | | |
| Edificio Central Sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria construido | Edificio | | | | 1,00 | | | | 19.800.000,00 |
| Unidades con equipamiento e infraestructura para redes internas de información y conectividad instaladas. | Unidades | 10,00 | | | 26,00 | 2.600.358,00 | 409.529,00 | | 17.327.420,00 |
| Sistemas Integrados y procesos (Planificación, Administración, Recursos Humanos y Convenios Institucionales y Vinculación) desarrollados y en funcionamiento | Sistemas | 1,00 | | | 5,00 | 300.247,00 | 5.073,00 | | 1.150.000,00 |
| Unidad de Soporte y Digitalización implementada | Unidad | | | | 1,00 | 71.584,00 | | | 152.581,00 |
| Sistema de Seguridad Informática implementado | Sistema | | | | 1,00 | 361.000,00 | 6.773,00 | | 700.000,00 |
| Portal institucional (Web) y Respuesta Telefónica Integrada (RTI), actualizados | Portal | | | | 1,00 | 10.219,00 | | | 251.500,00 |
| Intranet implementada y en funcionamiento | Intranet | | | | 1,00 | 30.858,00 | 7.640,00 | | 849.355,00 |
| Red de Información Agropecuaria Nacional (RIAN) implementada y puesta en marcha | Red | | | | 1,00 | 550.783,00 | 33.892,00 | | 3.373.264,00 |

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Centros documentales re equipados y funcionando bajo sistemas de gestión documental en formato digital | Centros | 20,00 | | | 55,00 | 210.257,00 | 55.944,00 | | 812.881,00 |
| Plataforma de comunicación interna funcionando | Plataforma | | | | 1,00 | 500.000,00 | 357.714,00 | | 1.960.000,00 |
| Plan Estratégico de comunicación institucional implementado | Plan | | | | 1,00 | 150.952,00 | 21.641,00 | | 4.385.000,00 |
| Red de comunicadores en funcionamiento | Red | | | | 1,00 | 100.095,00 | 15.998,00 | | 500.000,00 |
| Diseño de un sistema mejorado de PSyE concluido | Diseño | 1,00 | | | 1,00 | 75.686,00 | | | 957.000,00 |
| Profesionales por Centro Regional/Centro de Investigación con formación conceptual, metodológica y operativa en PSyE y capacitados para la gestión en su ámbito | Profesionales | 27,00 | | | 57,00 | 100.863,00 | | | 1.202.000,00 |
| Evaluaciones de impacto (cadenas o tecnologías o proyectos o región) realizadas | Evaluaciones | | | | 10,00 | | | | 1.140.000,00 |
| Evaluaciones inicial y final de indicadores de producción y calidad de los servicios institucionales realizadas | Evaluaciones | 1,00 | | | 2,00 | 700.347,00 | | | 1.200.000,00 |
| Estudios realizados (de los principales mercados de productos exportables, de mercados bioenergéticos, de impacto de cambio climático, de derechos de propiedad, de competitividad, de uso de la tierra, de financiación de la producción) | Estudios | | | | 10,00 | | | | 204.000,00 |
| Investigadores capacitados en análisis de prospectiva y metodología de escenarios futuros de los mercado | Investigadores | 3,00 | | | 10,00 | 4.446,00 | | | 22.000,00 |
| Modelos de simulación para analizar la sustentabilidad económica y social de los principales sistemas de producción identificados | Modelos | | | | 2,00 | | | | 62.000,00 |
| Estudios sobre la competitividad de las cadenas agroalimentarias y su sustentabilidad en el mediano y largo plazo realizados | Estudios | | | | 3,00 | | | | 60.000,00 |
| Investigadores capacitados en economía de los recursos naturales, propiedad intelectual, normativas de calidad, análisis de sustentabilidad, estructura agraria. | Investigadores | 12,00 | | | 46,00 | 30.000,00 | | | 153.000,00 |

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Base de datos completada con información georeferenciada en sistemas de producción y cadenas de valor; incluyendo los perfiles económico, tecnológico, social y agroecológico iniciado | Base | | | | 1,00 | | | | 66.000,00 |
| Sistema de consulta, en base a interfase web, para el acceso a las bases de datos de Economía y Sociología, operativo | Sistema | | | | 1,00 | | | | 57.000,00 |
| Sistema de gestión de la calidad del Instituto de Economía y Sociología según norma IRAM ISO 9001:2000; para el seguimiento de la atención de las demandas recibidas, implementado | Sistema | | | | 1,00 | | | | 76.000,00 |
| Administración y Gastos Concurrentes | | | | | | | | | |
| Unidad de Gestión del Programa | N/A | | | | | 1.000.044,00 | 102.129,00 | | 2.352.000,00 |
| Auditorías | N/A | | | | | 300.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Imprevistos | N/A | | | | | | | | 4.164.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 30.000.273,00 | 6.177.147,00 | | 214.999.601,00 |
