



Operation Number: **UR-L1064**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/24/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/24/2015**
Division Chief validation date: **04/29/2015**
Country Representative validation date: **04/29/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Rural Productive Development Program	Loan Number:	2595/OC-UR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA		
Team Leader:	Hintze,Luis Hernando	Sector/Subsector:	SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1064	\$28,400,000.00	\$28,400,000.00	\$4,900,000.00	\$0.00	\$33,300,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1064	\$28,400,000.00	\$12,217,098.84	43.02%	\$16,182,901.16


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

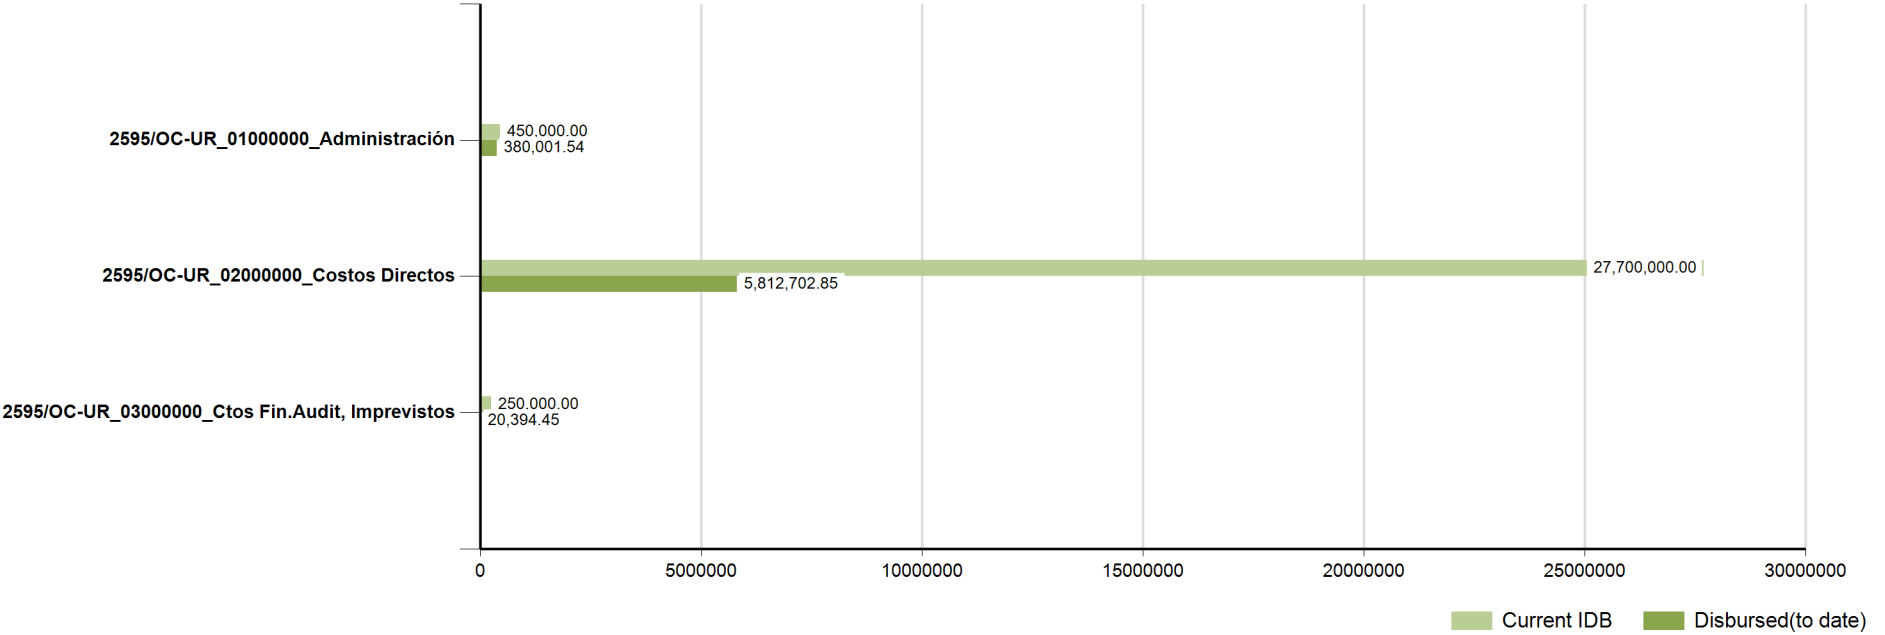

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Incremento de los ingresos agropecuarios promedio por hectárea de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios		porcentaje	0.00	2012	Fuente: punto de partida ingreso por productor familiar anual U\$S 3.300 (Fuente WB 2010)		P	15.00
							P(a)	15.00
							A	

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Incremento de productividad de rubros representativos en planes de gestión							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios		%	0.00	2012	Medio de verificación : encuestas de hogares agropecuarios del Programa.	Indicadores de productividad: Ganadería de carne equivalente por Há; Lechería: xxxLts por Há por año; Horticultura: xxxKs producto por há	P	15.00
							P(a)	15.00
							A	
Outcome:	2 Capacidad de Gestión y Planeación de recursos mejorada							
Observation:	Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa							

Observ	Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa
--------	--

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Número de proyectos de inversión gestionados por mesas de desarrollo rural del ámbito del Programa		Número	0.00	2011	Libro de acta de Mesas de Desarrollo Rural	Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa	P	6.00
							P(a)	6.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I. Apoyos productivos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Planes de gestión con tecnologías	Planes de gestión	P	150.00	400.00	P	7,938,000.00	26,460,366.00
		P(a)	150.00	572.00	P(a)	7,592,337.00	26,460,366.00
		A	227.00	372.00	A	739,973.00	4,866,493.00
Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Proyectos	P	5.00	30.00	P	500,000.00	1,600,000.00
		P(a)	5.00	34.00	P(a)	500,000.00	1,600,000.00
		A	5.00	5.00	A	756,460.00	756,460.00
Componente II. Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Plan de capacitación para DGDR y otras organizaciones rurales completado	Planes de capacitación	P		1.00	P	368,088.00	1,226,960.00
		P(a)		1.00	P(a)	368,088.00	337,381.00
		A		1.00	A	8,951.00	92,951.00
Sistema de interconexión de Mesas de Desarrollo Rural instalado	Sistema	P		1.00	P	208,226.00	832,904.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	200,000.00	104,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Planes de Fortalecimiento Institucional	P	15.00	40.00	P	387,967.00	1,090,559.00
		P(a)	115.00	157.00	P(a)	1,387,967.00	2,864,878.00
		A	147.00	157.00	A	1,638,690.00	1,964,878.00
Seguimiento y Evaluación	Sistema de Seguimiento y Ev.	P		1.00	P	100,000.00	770,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	100,000.00	614,164.00
		A		1.00	A	211,948.00	294,164.00
Administración del Programa							
Auditorías y Evaluación Intermedia							

Other Cost		2014	Cost
Administración del Programa	P	\$290,000.00	\$1,090,000.00
	P(a)	\$200,000.00	\$1,090,000.00
	A	\$118,596.00	\$635,381.00
Auditorías y Evaluación Intermedia	P	\$50,000.00	\$230,000.00
	P(a)	\$50,000.00	\$120,000.45
	A	\$10,394.45	\$20,394.45
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$9,842,281.00	\$33,300,789.00
	P(a)	\$10,398,392.00	\$25,303,520.45
	A	\$3,485,012.45	\$8,630,721.45

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
