
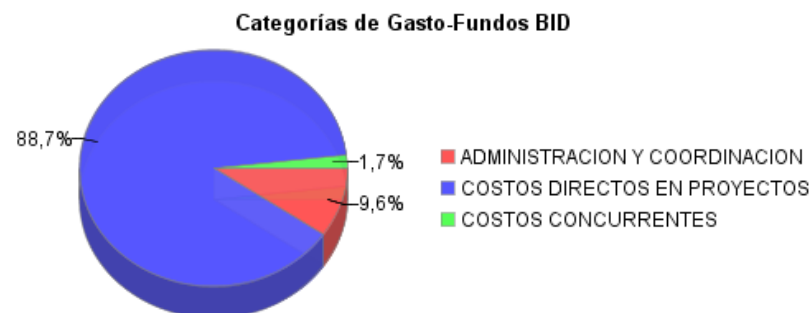
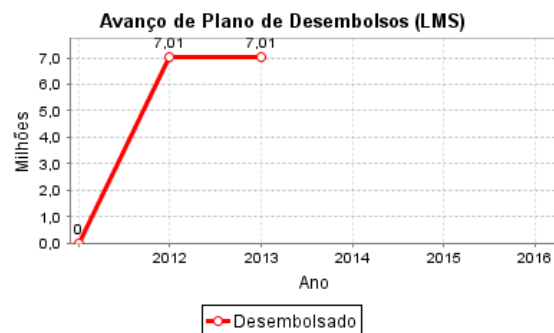



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2573/OC-AR	Atual: 230.000.000,00	Original BID: 230.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 7.012.280,73	Corrente BID: 230.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 3,05	Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: AR-T1090, RG-P1442	Saldo: 222.987.719,27	Cofinanciamento/País: 57.500.000,00
Subtipo de Operação: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		Original Estimado: 287.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 03-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 05-abr-2013

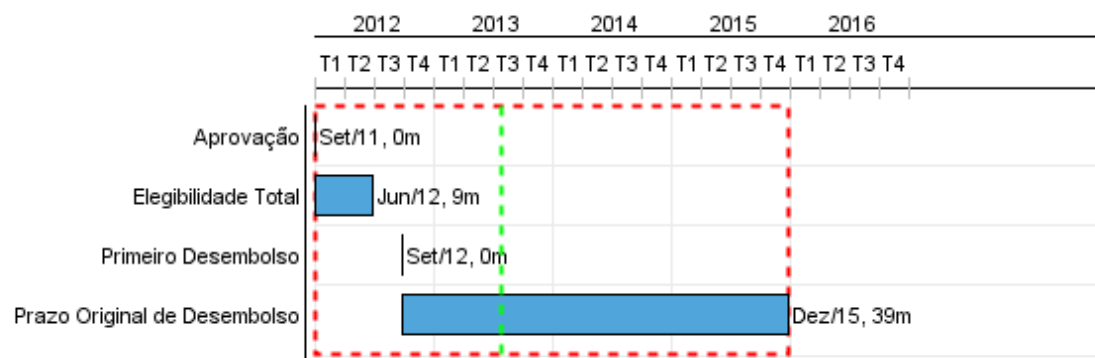

Progresso Acumulado até 2012

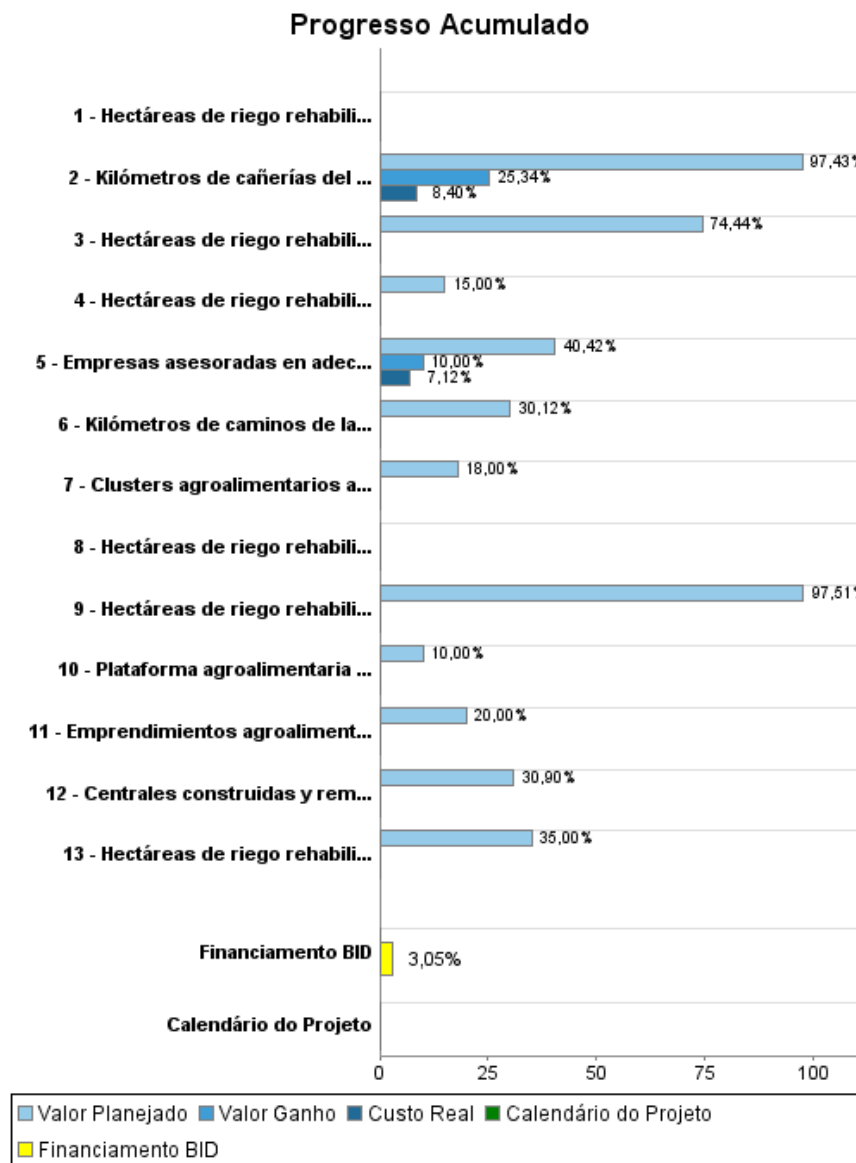

Resultados

Resultado:	Déficits de capacidades institucionales de entidades provinciales del Programa reducidos.
Suposições:	Diagnóstico inicial: Evaluación de la capacidad institucional de entidades provinciales del PROSAP. Repetición del estudio al final del Proyecto.
Observações:	Se utiliza Matriz de Entidad/Déficit. Las filas corresponden a las 52 entidades de las 18 provincias relevadas. Las columnas corresponden a cada uno de los déficit posibles seleccionados para el análisis de que se trate. Cuando una casilla, correspondiente a la intersección de la fila de una entidad con la columna de un déficit, se presenta en color oscuro (el escaque se halla ¿ocupado¿), significa que ese déficit se presenta en esa entidad.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Déficit relacionados con las reglas de juego.	%	15,00	2011	P					12,00	12,00
				A						
Déficits debido a relaciones interinstitucionales disfuncionales.	%	16,00	2011	P					14,00	14,00
				A						
Déficits vinculados con debilidades de los esquemas organizativos.	%	15,00	2011	P					9,00	9,00
				A						
Déficits ocasionados por la insuficiencia o inexistencia de recursos humanos y materiales.	%	43,00	2011	P					15,00	15,00
				A						
Déficits relativos a falencias en materia de conocimientos o destrezas del personal.	%	16,00	2011	P					9,00	9,00
				A						

Resultado: Entidades de enlace fortalecidas en sus capacidades técnicas y operativas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Entidades que completaron más del 90% de las actividades de sus planes de fortalecimiento.	Entidades		2011	P	3,00	3,00	6,00	6,00		18,00
				A						

Resultado: Rendimiento por hectarea incrementado. Mendoza - Red Terciaria de Riego.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Productividad Vid tintas A	Kg/Ha	10.000,00	2011	P				12.000,00		12.000,00
				A						
Productividad Vid Tintas B	Kg/ha	18.000,00	2011	P				20.000,00		20.000,00
				A						
Productividad Vid Blancas A	Kg/ha	11.000,00	2011	P				13.000,00		13.000,00
				A						
Productividad Vid Blancas B	Kg/ha	23.000,00	2011	P				26.000,00		26.000,00
				A						
Productividad Vid Común	Kg/ha	23.000,00	2011	P				26.000,00		26.000,00
				A						
Productividad Frutales de Carozo	Kg/ha	20.000,00	2011	P				25.000,00		25.000,00
				A						
Productividad Olivo	Kg/ha	8.000,00	2011	P				9.000,00		9.000,00
				A						

Productividad Zapallo	Kg/ha	5.000,00	2011	P					30.000,00		30.000,00
				A							
Productividad Melón-Sandía	Kg/ha	25.000,00	2011	P					32.000,00		32.000,00
				A							
Productividad Cebolla	Kg/ha	40.000,00	2011	P					50.000,00		50.000,00
				A							
Productividad Ajo	Kg/ha	10.000,00	2011	P					11.000,00		11.000,00
				A							
Productividad Tomate Industria	Kg/ha	60.000,00	2011	P					70.000,00		70.000,00
				A							

Resultado: Area con infraestructura de riego mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Eficiencia global del sistema mejorada.	%	35,00	2011	P				57,00		57,00
				A						

Resultado: Rendimiento por hectarea incrementado. San Juan - Canal del Norte.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Productividad Uva Mosto	Kg/ha	28.000,00	2011	P				29.279,00		29.279,00
				A						
Productividad Uva Mesa	Kg/ha	21.900,00	2011	P				22.900,00		22.900,00
				A						
Productividad Uva Fina Vinificar	Kg/ha	18.000,00	2011	P				18.822,00		18.822,00
				A						
Productividad Hortalizas Verano Melón	Kg/ha	16.000,00	2011	P				16.731,00		16.731,00
				A						
Productividad Hortalizas Verano Tomate	Kg/ha	59.000,00	2011	P				61.695,00		61.695,00
				A						
Productividad Hortalizas Invierno Ajo	Kg/ha	10.000,00	2011	P				10.457,00		10.457,00
				A						
Productividad Olivo para Aceite	Kg/ha	10.500,00	2011	P				10.980,00		10.980,00
				A						
Productividad Pasturas	Kg/ha	780,00	2011	P				816,00		816,00
				A						
Productividad Frutales Durazno	Kg/ha	20.000,00	2011	P				20.914,00		20.914,00
				A						

Resultado: Area con infraestructura de riego mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Hectareas afectadas de riego	Has		2011	P						25.177,00

				A						
Eficiencia global del sistema mejorada.	%	30,00	2011	P						58,00
				A						

Resultado:	Coste de operación vehicular reducido en Caminos zona VII C - Entre Ríos
Observações:	Ahorro en US\$

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Coste de operación vehicular de granos.	US\$/tn	16,78	2011	P			11,98			11,98
				A						
Coste de operación vehicular de ganadería.	US\$/tn	163,00	2011	P			93,00			93,00
				A						

Resultado:	Transito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado.
Observações:	Valores totales sobre vehículos livianos, camiones livianos y pesados.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos	Vehículos	217,00	2011	P	226,00	235,00	252,00	271,00	291,00	291,00
				A						
TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos	Vehículos	68,00	2011	P	71,00	74,00	79,00	85,00	91,00	91,00
				A						

Resultado:	Competitividad comercial de la cadena de carne ovina provincial incrementada. Río Negro.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Producción para la venta.	Animales		2011	P		10.000,00				20.000,00
				A						
Diferencia entre valor bruto de producción con y sin proyecto	Millones de US\$		2011	P				177,14		270,00
				A						

Resultado:	Productividad de la producción pecuaria provincial aumentada.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Destete en bovinos.	%	61,00	2011	P				63,00		63,00
				A						
Tasa de extracción de ovinos incrementada.	%	10,00	2011	P				11,00		11,00
				A						

Resultado:	Pérdidas por incendios evitadas.
Suposições:	Situación maroeconómica, jurídica y política de la provincia y del país se mantiene estable o mejora. No se presentan situaciones climáticas adversas extraordinarias de manera persistente.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Pérdidas por incendios promedio. Chubut.	Pesos/Año	13.026.373,00	2011	P		6.514.727,00				3.514.727,00
				A						
Pérdidas por incendios promedio. Río Negro.	Pesos/Año	39.182.333,00	2011	P		27.427.633,00				27.427.633,00
				A						

Resultado:	Tiempos reducidos
------------	-------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Chubut - Tiempo de llegada al incendio.	Minutos promedio	27,00	2011	P		16,00				16,00
				A						
Río Negro - Bariloche. Tiempo de respuesta.	Minutos promedio	30,00	2011	P		15,00				15,00
				A						
Río Negro - El Bolsón. Tiempo de respuesta.	Minutos promedio	30,00	2011	P		15,00				15,00
				A						
Chubut - Tiempo de detección de focos de incendio y despacho de medios.	Minutos promedio	18,00	2011	P		9,00				9,00
				A						

Resultado:	Rendimientos en las cadenas beneficiarias por Ha. mejorados.
Suposições:	Linea de base conformada con datos de planes de negocios de las convocatorias.
Observações:	Fuente: Informes sectoriales del INTA e Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Rendimiento de la Cadena Apícola.	kg/col/año	15,00	2011	P					18,00	18,00
				A						
Rendimiento de la Cadena Frutícola.	tn/ha	5,50	2011	P					6,32	6,32
				A						
Rendimiento de la Cadena Láctea.	L/ha/VT/año	2.500,00	2011	P					2.900,00	2.900,00
				A						
Rendimiento de la Cadena Ganadera.	kg carne/ha/año	70,00	2011	P					80,00	80,00
				A						
Rendimiento de la Cadena Vitivinícola.	tn/ha	6,00	2011	P					7,00	7,00
				A						

Resultado:	Inversiones realizadas
Observações:	Informe de Area de Gestión de Proyectos del Sector Privado. Informes Semestrales de Progreso.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Inversiones en mejorar la finca del productor realizadas	US\$		2011	P		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
				A						

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1120 - Provincial Agricultural Services Program - PROSAP III
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 02/04/2013

Inversiones en la consolidación de clusters agroalimentarios realizadas.	US\$		2011	P		1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00
				A						

Resultado:	Competitividad de zonas rurales en economías regionales mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Agricultores a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas	Agricultores		2012	P					17.000,00	17.000,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Administración del Programa									
Unidad Ejecutora Central	N/A					2.225.000,00	2.003.207,00		13.000.000,00
Fortalecimiento Institucional	N/A					466.667,00	790.980,00		4.000.000,00
Preparación de Proyectos	N/A					1.990.302,00	1.267.840,00		8.500.000,00
Infraestructura Hídrica									
Hectáreas de riego rehabilitadas en el Valle Bonaerense del Río Colorado - CORFO	Hectáreas				130.000,00				11.457.251,00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Rincón Catamarca.	Hectáreas				450,00				3.434.487,00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Andaluca Cerro Negro (2da etapa), Catamarca.	Hectáreas				1.146,00				6.724.094,00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Belén y Pomán, Catamarca.	Hectáreas				1.570,00				12.074.133,00
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza 5ta zona.	Hectáreas				28.650,00				36.061.368,00
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Secundaria, Canal del Norte, San Juan.	Héctareas				19.671,00				6.379.823,00
Infraestructura Transporte									
Kilómetros de caminos de las redes secundarias y terciarias mejorados de la Zona VII C de Entre Ríos.	Kms	4,94			49,37				40.027.617,00
Servicios Agropecuarios. Desarrollo Productivo Integral. Río Negro.									
Servicios Agropecuarios. Manejo de Recursos Naturales.									
Centrales construidas y remodeladas. Río Negro.	Centrales				3,00				5.272.330,00
Desarrollo y Competitividad. Aportes No Reembolsables y Clusters.									
Emprendimientos agroalimentarios insertados en clusters o cadenas de valor	Planes de Negocios				200,00				18.000.000,00
Clusters agroalimentarios asistidos y consolidados	Clusters				12,00				10.000.000,00
Costos Concurrentes.									
Auditorías	N/A						10.640,00		2.000.000,00
Seguimiento y evaluación.	N/A								2.000.000,00
Proyectos sin asignar									
Proyectos de Infraestructura a Asignar	N/A								48.536.775,00
Proyectos de Emergencia									
Proyectos de Emergencia	N/A								30.000.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1120 - Provincial Agricultural Services Program - PROSAP III
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 02/04/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Zonas Rurales con Acceso a Sistemas de Energía									
Kilómetros de cañerías del Gasoducto desarrollado en Areas Productivas de Entre Ríos instalados	Kilómetros de cañerías	1,55	3,10		31,00	697.861,00	462.504,00		5.507.025,00
Servicios Agropecuarios. Desarrollo Comercial.									
Empresas asesoradas en adecuación de productos y posicionamiento en mercados.	Empresas	30,00	30,00		300,00	1.183.430,00	842.031,00		11.834.300,00
Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola. Chubut.									
Plataforma agroalimentaria construida.	Plataforma				1,00				12.690.797,00
TOTAL						6.563.260,00	5.377.202,00		287.500.000,00
